Nr.		Vorgangsr	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1			**Planungsleistung GI A (005) - TU Schlachthofgelände und GI A (006) - Stzw Laeiszstraße**	**920 Tage**	**Mon 21.09.26**	**Fre 29.03.30**
2			**Grundlagenermittlung und Vorplanung (Lph 1+2)**	**65 Tage**	**Mon 21.09.26**	**Fre 18.12.26**
3			Startgespräch	0 Tage	Mon 21.09.26	Mon 21.09.26
4			Abschluss Lph 1 + 2	0 Tage	Fre 18.12.26	Fre 18.12.26
5			**Fertigstellung Entwurfsplanung (Lph3)**	**100 Tage**	**Mon 21.12.26**	**Fre 07.05.27**
6			Start Lph 3	0 Tage	Mon 21.12.26	Mon 21.12.26
7			Übergabe der Entwurfsplanung an den A	1 Tag	Fre 16.04.27	Fre 16.04.27
8			Prüfung Enwurfsplanung durch den AG und Rückmeldung an den AN	10 Tage	Mon 19.04.27	Fre 30.04.27
9			Einarbeitung AG-Anmerkungen und Übergabe der finalen Entwurfsplanung	5 Tage	Mon 03.05.27	Fre 07.05.27
10			TAB Antrag erstellen (durch AG)	25 Tage	Mon 10.05.27	Fre 11.06.27
11			Einreichen TAB Atrag	1 Tag	Mon 14.06.27	Mon 14.06.27
12			**Fertigstellung der Genehmigungs- und Ausführungsplanung (Lph 4 + 5)**	**180 Tage**	**Mon 10.05.27**	**Fre 14.01.28**
13			Übergabe der Genehmigungsstatik an den AG	1 Tag	Fre 18.06.27	Fre 18.06.27
14			Einreichen Genehmigungsstatik beim Prüfstatiker	0 Tage	Fre 18.06.27	Fre 18.06.27
15			Prüfung Genehmigungsstatik durch Prüfstatiker	40 Tage	Mon 21.06.27	Fre 13.08.27
16			Übergabe der Ausführungsplanung an den AG	1 Tag	Fre 03.12.27	Fre 03.12.27
17			Prüfung Ausführungsplanung durch den AG und Rückmeldung an den AN	15 Tage	Mon 06.12.27	Fre 24.12.27
18			Einarbeitung AG-Anmerkungen und Übergabe der finalen Genehmigungs- und Ausführungsplanung	15 Tage	Mon 27.12.27	Fre 14.01.28
19			Einreichen Ausführungsplanung beim Prüfstatiker	0 Tage	Mon 17.01.28	Mon 17.01.28
20			Prüfen Ausführungsplanung durch den Prüfstatiker	44 Tage	Die 18.01.28	Fre 17.03.28
21			**Fertigstellung der Ausschreibungsunterlagen für beide Bauwerke A (005) und A (006), Lph 6**	**100 Tage**	**Mon 17.01.28**	**Fre 02.06.28**
22			Übergabe Ausschreibungsunterlagen an AG	1 Tag	Mon 08.05.28	Mon 08.05.28
23			Prüfung der Ausschreibungsunterlagen durch den AG und Rückmeldung an den	16 Tage	Fre 05.05.28	Fre 26.05.28
24			Einarbeitung AG-Anmerkungen und Übergabe der finalen und vollständigen Ausschreibungsunterlagen	5 Tage	Mon 29.05.28	Fre 02.06.28
25			**Ausschreibung und Vergabe der Bauleistung**	**90 Tage**	**Mon 05.06.28**	**Fre 06.10.28**
26			Zusammenstellen aller LV-Unterlagen	15 Tage	Mon 05.06.28	Fre 23.06.28
27			EU Teilnahmewettbewerb + Auswertung	30 Tage	Mon 26.06.28	Fre 04.08.28
28			Ausschreibung + Verhandlungsgespräche	35 Tage	Mon 07.08.28	Fre 22.09.28
29			Beauftragung (Ende Einspruchsfrist)	10 Tage	Mon 25.09.28	Fre 06.10.28
30			**Bauphase**	**315 Tage**	**Mon 09.10.28**	**Fre 21.12.29**
31			Bauvorbereitung und Materialisierung	66 Tage	Mon 09.10.28	Mon 08.01.29
32			Start Betriebsunterbrechung,	0 Tage	Mon 08.01.29	Mon 08.01.29
33			Ausführung Fachdienste HOCHBAHN	20 Tage	Mon 08.01.29	Fre 02.02.29
34			Ausführung Ingenieurbau A (005) und A (006), paralleles Arbeiten	205 Tage	Mon 05.02.29	Fre 16.11.29
35			Ausführung Fachdienste	20 Tage	Mon 19.11.29	Fre 14.12.29
36			Ende Betriebsunterbrechung	0 Tage	Fre 14.12.29	Fre 14.12.29
37			**Zusammenstellung Dokumentation und erstellen der Revisionsunterlagen**	**75 Tage**	**Mon 17.12.29**	**Fre 29.03.30**
38			Fertigstellung aller Leistungen	0 Tage	Fre 29.03.30	Fre 29.03.30

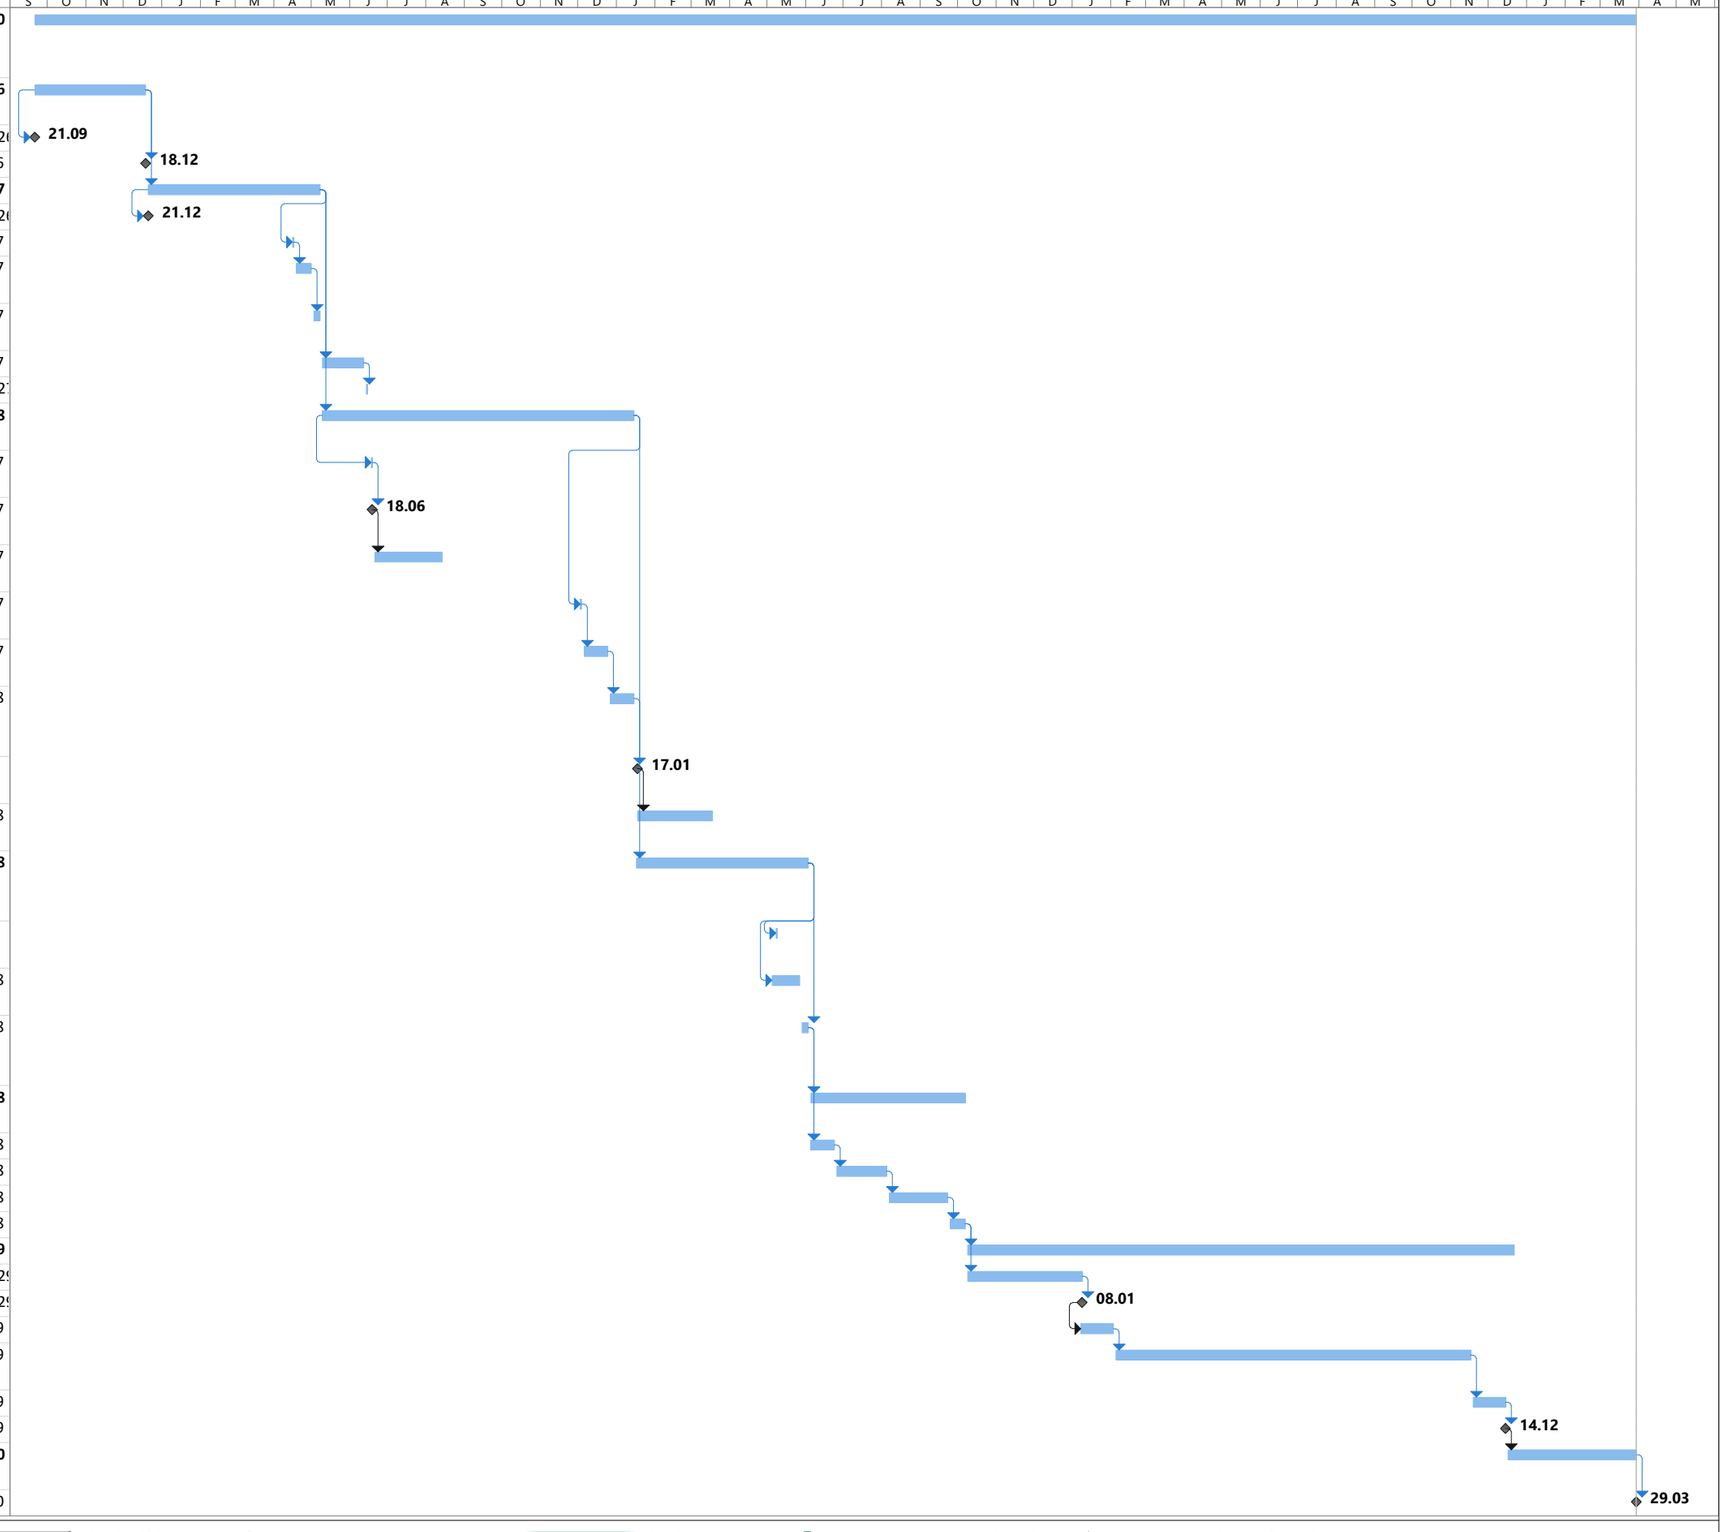

Projekt: 2026-05-13_Planungst
Datum: Fre 15.05.26

Vorgang
Sammelvorgang
Inaktiver Meilenstein
Nur Dauer
Nur Anfang
Externer Meilenstein
Manueller Fortschritt
Unterbrechung
Projektsammelvorgang
Inaktiver Sammelvorgang
Manueller Sammelrollup
Nur Ende
Stichtag
Meilenstein
Inaktiver Vorgang
Manueller Vorgang
Manueller Sammelvorgang
Externe Vorgänge
In Arbeit
