
Nr.		Vorgangsr	Vorgangsname	Ressourcennamen	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger
1			**Rohbau Betonarbeiten**		**165 Tage**	**Mo 17.08.26**	**Fr 02.04.27**	
10			**Holzbau und Gebäudehülle**		**130 Tage**	**Mo 25.01.27**	**Fr 23.07.27**	
11			Werkplanung/ Vorfertigung Holzbau	Holzbau	90 Tage	Mo 25.01.27	Fr 28.05.27	9
12			Werkplanung/ Vorfertigung Fenster und Türen	Fenster und Türen	90 Tage	Mo 01.03.27	Mo 05.07.27	21AE;29AE;3
13			Werkplanung/ Vorfertigung Stahlbau	Stahlbau	60 Tage	Mo 01.03.27	Mo 24.05.27	18AE
14			Beginn Montage Holzbau/ Gebäudehülle - Vorfertigung und Montagebeginn überschneiden sich.	Holzbau	0 Tage	Mo 26.04.27	Mo 26.04.27	7;11EA-25 Tage
15			Abdichtung Bodenplatte unter Wänden, an Aufkantungen	Holzbau	5 Tage	Mo 26.04.27	Fr 30.04.27	14AA
16			Stellen Wände EG Anbau	Holzbau	15 Tage	Mo 26.04.27	Fr 14.05.27	14AA
17			Gerüststellung EG	Gerüstbau	10 Tage	Mo 10.05.27	Fr 21.05.27	16EA-5 Tage
18			Konsolen Fluchtbalkon	Stahlbau	5 Tage	Mo 24.05.27	Fr 28.05.27	16;17
19			Decken über EG Anbau inkl. Beton	Holzbau	10 Tage	Mo 17.05.27	Fr 28.05.27	16
20			Notunterstützung Deckenfelder bis 7 Tage nach Beton, Ausschalarbeiten. Die Notunterstützung Balken bleibt 28 Tage stehen.	Holzbau	10 Tage	Mo 31.05.27	Fr 11.06.27	19
21			Fenstermontage und Fassadentüren nach Betonarbeiten Decke	Fenster und Türen	30 Tage	Mo 14.06.27	Fr 23.07.27	20
22			Attika Terrasse	Holzbau	5 Tage	Mo 31.05.27	Fr 04.06.27	19
23			Notabdichtung über EG (Terrasse) - Durchbrüche schließen, mit Fertigstellung Attika vollflächige Abdichtung	Dachabdichtung	10 Tage	Mo 31.05.27	Fr 11.06.27	19
24			**Beginn Ausbau**		**75 Tage**	**Mo 17.05.27**	**Fr 27.08.27**	
25			Notabdichtung Anbau, Baubeginn Ausbaugewerke Anbau	Holzbau	0 Tage	Fr 11.06.27	Fr 11.06.27	20;23
26			Wände EG Hauptteil	Holzbau	15 Tage	Mo 17.05.27	Fr 04.06.27	16
27			Decken EG Hauptteil inkl. Beton	Holzbau	10 Tage	Mo 07.06.27	Fr 18.06.27	26;19
28			Notunterstützung Deckenfelder bis 7 Tage nach Beton, Ausschalarbeiten. Die Notunterstützung Balken bleibt 28 Tage stehen.	Holzbau	10 Tage	Mo 21.06.27	Fr 02.07.27	27
29			Fenstermontage und Fassadentüren nach Betonarbeiten Decke	Fenster und Türen	40 Tage	Mo 05.07.27	Fr 27.08.27	28;34
30			Wände OG	Holzbau	15 Tage	Mo 21.06.27	Fr 09.07.27	27
31			Baubeginn Ausbau Hauptteil EG		0 Tage	Fr 02.07.27	Fr 02.07.27	28;34
32			Gerüststellung OG	Gerüstbau	10 Tage	Mo 07.06.27	Fr 18.06.27	26
33			Decke über OG inkl. Beton	Holzbau	15 Tage	Mo 12.07.27	Fr 30.07.27	30;32
34			Notunterstützung Deckenfelder bis 7 Tage nach Beton, Ausschalarbeiten. Die Notunterstützung Balken bleibt 28 Tage stehen.	Holzbau	10 Tage	Mo 21.06.27	Fr 02.07.27	27
35			Fenstermontage und Fassadentüren nach Betonarbeiten Decke	Fenster und Türen	40 Tage	Mo 05.07.27	Fr 27.08.27	34
36			Attika OG	Holzbau	10 Tage	Mo 02.08.27	Fr 13.08.27	33
37			Notabdichtung über OG	Dachabdichtung	10 Tage	Mo 16.08.27	Fr 27.08.27	36
38			Wetterdichter Bau gesamt	Holzbau	0 Tage	Fr 27.08.27	Fr 27.08.27	37
39			**Fassadenarbeiten/ Dacharbeiten**		**225 Tage**	**Mo 14.06.27**	**Fr 21.04.28**	
40			Fluchtweg Terrasse	Stahlbau	15 Tage	Mo 30.08.27	Fr 17.09.27	38;25
41			Füße Technikdach, Einbauteile Dach	Lüftung	5 Tage	Mo 30.08.27	Fr 03.09.27	38;25
42			Gerüststellung Balkone und Vordächer	Gerüstbau	5 Tage	Mo 30.08.27	Fr 03.09.27	38;25
43			Vordach über Fluchtbalkon Achse G	Stahlbau	15 Tage	Mo 20.09.27	Fr 08.10.27	40;42
44			Umbau Gerüst für Balkone	Gerüstbau	5 Tage	Mo 11.10.27	Fr 15.10.27	43
45			Balkon und Treppe Achse G	Stahlbau	15 Tage	Mo 18.10.27	Fr 05.11.27	43;44
46			Einbauteile Stadtmöbel Terrasse	Stadtmöbel	5 Tage	Mo 14.06.27	Fr 18.06.27	23
47			Dachabdichtung Terrasse über EG	Dachabdichtung	30 Tage	Mo 21.06.27	Fr 30.07.27	23;46
48			Dachabdichtung Decke über OG	Dachabdichtung	30 Tage	Mo 06.09.27	Fr 15.10.27	47;37;41
49			Montage Fallrohre und Speier im Zuge der Dachabdichtung	Dachabdichtung	70 Tage	Mo 12.07.27	Fr 15.10.27	48EE
50			Holzfassade	Holzbau	60 Tage	Mo 16.08.27	Fr 05.11.27	36
51			Blechfassade	Metallfassade	60 Tage	Mo 16.08.27	Fr 05.11.27	36
52			Holzfassade, Restarbeiten nach Fallrohren, Balkonen, Dachabdichtung	Holzbau	10 Tage	Mo 08.11.27	Fr 19.11.27	47;49;45
53			Blechfassade, Restarbeiten nach Fallrohren, Balkonen, Dachabdichtung	Metallfassade	10 Tage	Mo 08.11.27	Fr 19.11.27	47;49;45
54			Rost Technikdach, Technik Dach	Lüftung	20 Tage	Mo 18.10.27	Fr 12.11.27	48
55			UK PV	Dachabdichtung	30 Tage	Mo 18.10.27	Fr 26.11.27	48
56			Leckortung, Substrat, Bekiesung Dach über OG	Dachabdichtung	20 Tage	Mo 29.11.27	Fr 24.12.27	55
57			PV-Anlage	Elektro	30 Tage	Mo 29.11.27	Fr 07.01.28	55
58			Rückbau Fassadengerüste	Gerüstbau	10 Tage	Mo 10.01.28	Fr 21.01.28	52;53;55;56;
59			Baufreiheit Außenanlagen	Außenanlagen	0 Tage	Fr 21.01.28	Fr 21.01.28	58
60			Austausch Bautüren Fassade gegen planmäßige Türen	Fenster und Türen	10 Tage	Mo 10.04.28	Fr 21.04.28	82AA
61			**Innenausbau**		**265 Tage**	**Mo 14.06.27**	**Fr 16.06.28**	

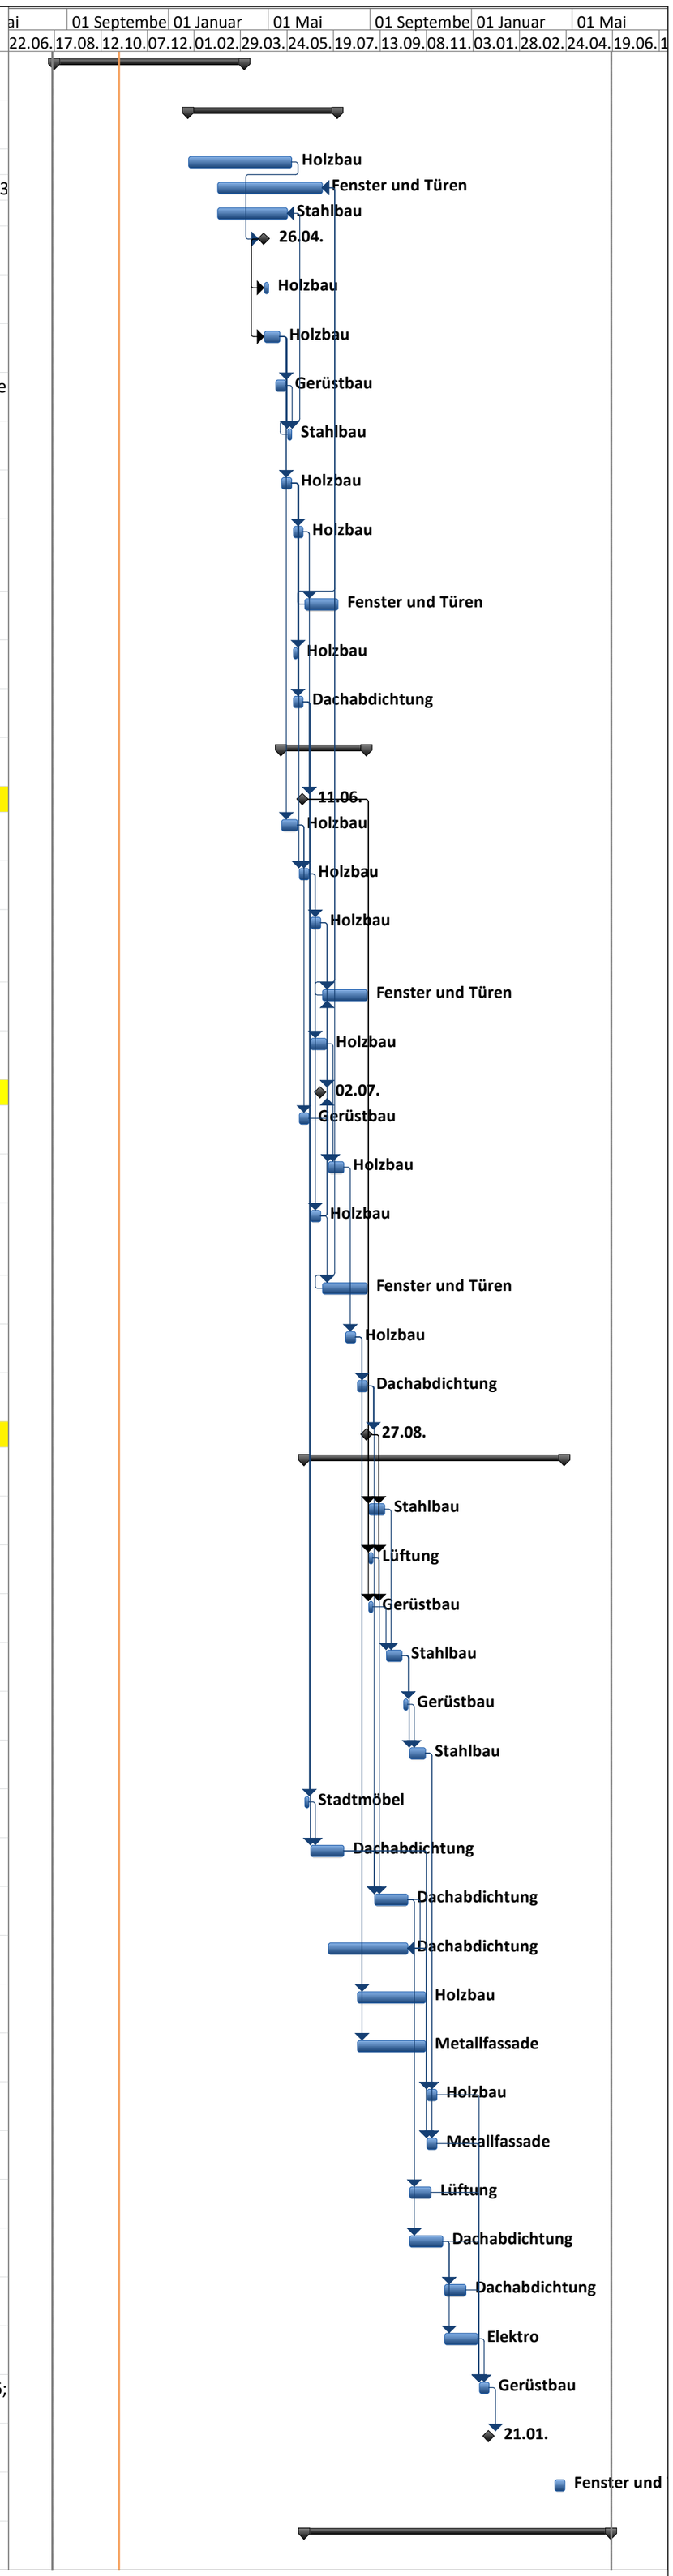

Projekt: BAP_PFS_20261103_Anl
Datum: Di 03.11.26

Vorgang	Externe Vorgänge	Manueller Vorgang	Nur Ende
Unterbrechung	Externer Meilenstein	Nur Dauer	Stichtag
Meilenstein	Inaktiver Vorgang	Manueller Sammelrollup	In Arbeit
Sammelvorgang	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelvorgang	
Projektsammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Nur Anfang	
