Campus Schützenpark Kiel
Neubau Werkhalle

[redacted]
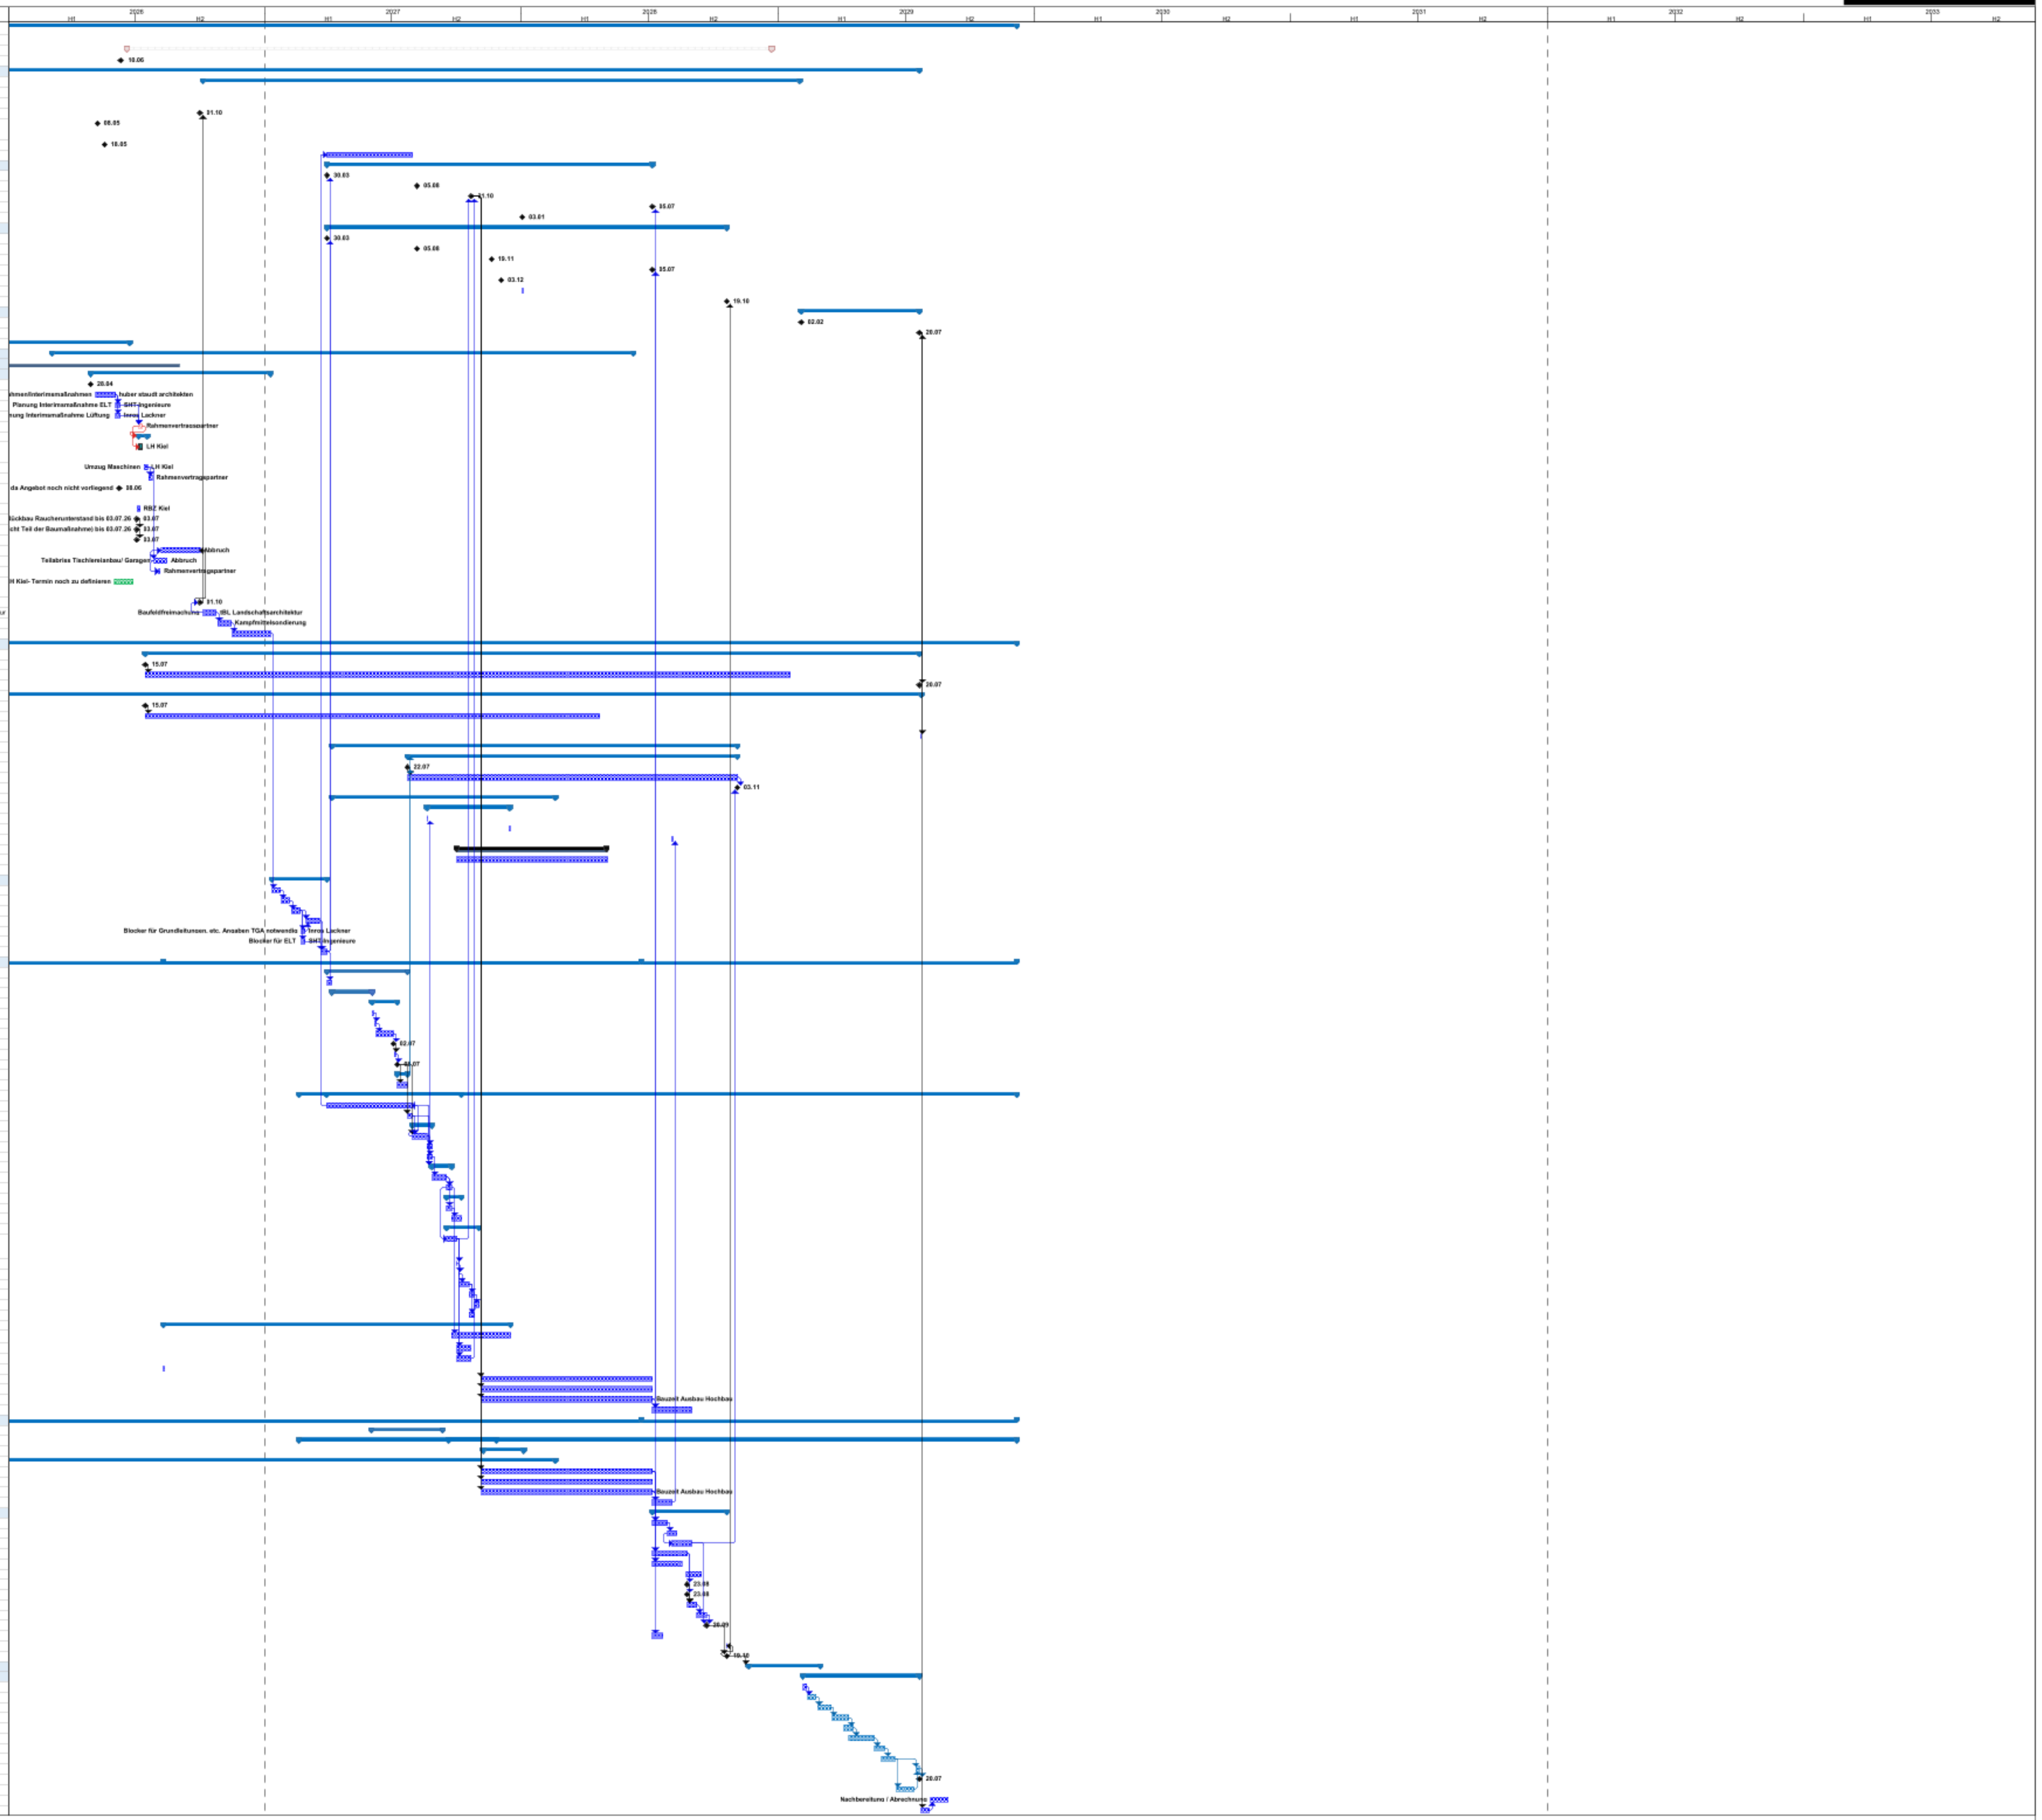
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	Ressourcennamen
1	**Neubau Werkhalle Schützencampus Kiel**	62,2 Monate?	Die 19.11.24	Don 06.12.29			
2							
3	**Schulferien SH 2026-2028 + Kieler Woche / Angaben ohne Gewähr**	30,5 Monate	Fre 19.06.26	Fre 22.12.28			Schulferien SH
18	Hinweis: Abiturtermine 2028 noch unbekannt - Baufreie Zeit + 2027 prüfen	3 Monate	Mit 10.06.26	Mit 10.06.26			
19	**Meilensteine Bauausführung**	57,35 Monate?	Die 19.11.24	Fre 20.07.29			
20	**Vertragsmeilensteine Blocker**	27,6 Monate?	Mon 05.10.26	Mit 31.01.29			
24	Baubeginn	0,05 Monate?	Die 19.11.24	Die 19.11.24			
25	Baustelleneinrichtung (Fertigstellung)	0,05 Monate?	Die 19.11.24	Die 19.11.24			
26	Teilspperrung Parkplatz RBZ	3 Monate	Don 01.10.26	Don 01.10.26	141		
27	**Abstimmung/Angaben Meilensteine Statik H+H, Genehmigunsstatik + Ansätze Prüfstatik, Ausführungsstatik, Regeldetails, etc.**	3 Monate	Fre 08.05.26	Fre 08.05.26			horn+Horn
28	**Detaillierte Angaben zur Planung der Planung notwendig**	3 Monate	Mon 18.05.26	Mon 18.05.26			
29	Werkplanung Gewerk Holzbau Annahme	3,5 Monate	Die 30.03.27	Don 29.07.27	210AA		
30	**Werkhalle BA 2**	14,95 Monate	Die 30.03.27	Mit 05.07.28			
31	Fertigstellung Baugrube	0 Tage	Die 30.03.27	Die 30.03.27	183		
32	Fertigstellung Sohle	0 Tage	Don 05.08.27	Don 05.08.27	199;253		
33	Hülle Dicht - Türen fehlen aktuell	0 Tage	Don 21.10.27	Don 21.10.27	223;233	237EA+10 Tage;235EA+	
34	Beginn Ausbau	0 Tage	Mit 05.07.28	Mit 05.07.28	237		
35	**Angaben Meilensteine TGA notwendig**	0 Tage	Mon 03.01.28	Mon 03.01.28			
36	**Werkhalle BA 1**	18,7 Monate?	Die 30.03.27	Don 19.10.28			
37	Fertigstellung Baugrube	0 Tage	Die 30.03.27	Die 30.03.27	183		
38	Fertigstellung Sohle	0 Tage	Don 05.08.27	Don 05.08.27	253		
39	Hülle Dicht - BA1 zunächst vorraussichtlich mit Folientüren/Fenster	0 Tage	Fre 19.11.27	Fre 19.11.27	275		
40	Beginn Ausbau	0 Tage	Mit 05.07.28	Mit 05.07.28	290		
41	Rohbauabnahme	0 Tage	Fre 03.12.27	Fre 03.12.27	275EA+2 Wochen		
42	**Angaben Meilensteine TGA notwendig**	0,05 Monate?	Mon 03.01.28	Mon 03.01.28			
43	Fertigstellung	3 Monate	Don 19.10.28	Don 19.10.28	306		
44	**Werkhalle BA 3**	5,75 Monate	Fre 02.02.29	Fre 20.07.29			
45	Fertigstellung Abbruch Bestand	3 Monate	Fre 02.02.29	Fre 02.02.29	308		
46	Fertigstellung	3 Monate	Fre 20.07.29	Fre 20.07.29	322	149;154	
47	Planung / Baugenehmigung	15,5 Monate	Mon 31.03.25	Mon 22.06.26			
55	**Ausführungsplanung bis Vergabe - JF zur Klärung Termine ab 12.05.26**	26,85 Monate	Mit 04.03.26	Don 08.06.28			
97	**LP 6 siehe Vergabeterminplan**		Die 19.11.24				
122	**Vorbereitende Maßnahmen**	8,55 Monate	Die 28.04.26	Fre 08.01.27			
123	Vorstellung LP3 RBZ	3 Monate	Die 28.04.26	Die 28.04.26			
124	Planung Vorabmaßnahmen/Interimsmaßnahmen	0,9 Monate	Die 05.05.26	Mon 01.06.26		125;126	huber staudt architekten
125	Planung Interimsmaßnahme ELT	5 Tage	Die 02.06.26	Mon 08.06.26	124	127	SHT-Ingenieure
126	Planung Interimsmaßnahme Lüftung	5 Tage	Die 02.06.26	Mon 08.06.26	124	127	Inros Lackner
127	TGA Maßnahmen für Umzug Maschinen (Annahme E2 Angaben TGA notwendig)	1 Woche	Mon 06.07.26	Fre 10.07.26	125;126	128;129AA	Rahmenvertragspartner
128	**Umzug Maschinen**	0,5 Monate	Mon 06.07.26	Fre 17.07.26	127		
129	Ggf. notwendige Vorabmaßnahmen Maschinenumzug z.B. Lastverteilende Platten, Annahme E2	1 Woche	Mon 06.07.26	Fre 10.07.26	127AA		LH Kiel
130	Umzug Maschinen	1 Woche	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26		131;138	LH Kiel
131	Öffnung verschließen/zumauern	1 Woche	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26	130		Rahmenvertragspartner
132	Stellung Lagercontainer - Termin nicht bestätigt, da Angebot noch nicht vorliegend	3 Monate	Mon 08.06.26	Mon 08.06.26			
133	Freiziehen der Garagen - ASAP bis 03.07.26	2 Tage	Fre 03.07.26	Mon 06.07.26			RBZ Kiel
134	Rückbau Raucherunterstand bis 03.07.26	3 Monate	Fre 03.07.26	Fre 03.07.26		135	RBZ Kiel
135	Demontage Materialien Nutzer (nicht Teil der Baumaßnahme) bis 03.07.26	3 Monate	Fre 03.07.26	Fre 03.07.26	134	136	RBZ Kiel
136	Umsetzen / ggf. Rückbau Garage Hausmeister	3 Monate	Fre 03.07.26	Fre 03.07.26	135		RBZ Kiel
137	Bauzaun für Rückbau Phase 1 - prüfen ob Beleuchtung notwendig	2 Monate	Don 06.08.26	Don 01.10.26	138AA;141AE		Abbruch
138	Teilabriss Tischlereianbau/ Garagen	3 Wochen	Mon 27.07.26	Fre 14.08.26	130	137AA;139AA+5 Tage	Abbruch
139	Dachdecker für Abdichtung Übergang zu Bestand auf Abruf	2 Tage	Mon 03.08.26	Die 04.08.26	138AA+5 Tage		Rahmenvertragspartner
140	BLOCKER-Termin Umweltamt Bäume mit tBL + LH Kiel- Termin noch zu definieren	1 Monat	Mon 01.06.26	Fre 26.06.26			
141	Bauzaunstellung BE Phase 2/ Sperrung Parkplatz	3 Monate	Don 01.10.26	Don 01.10.26	142AA-6 Tage	26;137AE	Bauzaun
142	Baufeldfreimachung	3 Wochen	Mon 05.10.26	Fre 23.10.26		143;141AA-6 Tage;310A	tBL Landschaftsarchitektur
143	Kampfmittelsondierung	3 Wochen	Mon 26.10.26	Fre 13.11.26	142	144	
144	Puffer für etwaige Kampfmittelbergung	6 Wochen	Mon 16.11.26	Fre 08.01.27	143	177	
145	**Bauphase bis Übergabe / Abbruch Bestand**	62,2 Monate?	Die 19.11.24	Don 06.12.29			
146	**Bauwasser**	36,35 Monate	Mit 15.07.26	Fre 20.07.29			
147	Wasseranschluss	0 Tage	Mit 15.07.26	Mit 15.07.26		148	
148	Bauwasser vorhalten	30 Monate	Mit 15.07.26	Mit 17.01.29	147		
149	Rückbau Bauwasser	0 Tage	Fre 20.07.29	Fre 20.07.29	46		
150	**Baustrom**	57,4 Monate?	Die 19.11.24	Mon 23.07.29			
151	Baustrom	3 Monate	Mit 15.07.26	Mit 15.07.26		152	
152	Baustrom vorhalten	21 Monate	Mit 15.07.26	Don 20.04.28	151		
153	Baustrom UVT- suksessive ab	0,05 Monate?	Die 19.11.24	Die 19.11.24			
154	Rückbau Baustrom	0,05 Monate?	Mon 23.07.29	Mon 23.07.29	46		
155	**Baustelleneinrichtung**	18,95 Monate?	Die 06.04.27	Fre 03.11.28			
156	**AG Container**	16 Monate	Don 22.07.27	Fre 03.11.28	207		
157	AG Container Aufbau	3 Monate	Don 22.07.27	Don 22.07.27	207	158	
158	Container vorhalten	16 Monate	Fre 23.07.27	Fre 03.11.28	157	159	
159	Container abbauen	3 Monate	Fre 03.11.28	Fre 03.11.28	295;158		
160	**Kran**	10 Monate	Die 06.04.27	Fre 18.02.28			
164	**Gerüste**	4,2 Monate?	Fre 20.08.27	Mit 15.12.27			
165	Aufbau	0,05 Monate?	Fre 20.08.27	Fre 20.08.27	213		
166	Abbau	0,05 Monate?	Mit 15.12.27	Mit 15.12.27	281		
167	Bauaufzug	0,05 Monate?	Don 03.08.28	Don 03.08.28	291		
168	**Winterbauheizung Angaben TGA notwendig**	7 Monate	Fre 01.10.27	Mon 01.05.28			
169	Winterbauheizung	7 Monate	Fre 01.10.27	Die 02.05.28			
170	**Vermesser**	8,05 Monate?	08.2026	Die 19.11.24			
176	**Erdarbeiten BA 1 + BA 2**	2,75 Monate	Mon 11.01.27	Die 30.03.27			
177	BE Einrichten	2 Wochen	Mon 11.01.27	Fre 22.01.27	144	178	
178	Aushub + Planum	2 Wochen	Mon 25.01.27	Fre 05.02.27	177	179	
179	ggf. Verbau zu Bestand Annahme E2, ist planerisch zu prüfen	2 Wochen	Mon 08.02.27	Fre 19.02.27	178	181;180;182	
180	Rüttelstopfsäulen	3 Wochen	Mon 01.03.27	Fre 19.03.27	181;179	183	
181	**Blocker für Grundleitungen, etc. Angaben TGA notwendig**	1 Woche	Mon 22.02.27	Fre 26.02.27	179	180	Inros Lackner
182	**Blocker für ELT**	1 Woche	Mon 22.02.27	Fre 26.02.27	179	183	SHT-Ingenieure
183	Feinplanum	1 Woche	Mon 22.03.27	Die 30.03.27	180;182	186;31;37	
184	**BA 2**	44 Monate?	Die 19.11.24	Mon 19.06.28			
185	**Rohbau**	3,2 Monate?	Mit 31.03.27	Don 22.07.27			
186	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mit 31.03.27	Die 06.04.27	183	189;188;161	
187	**WU- Bodenplatte**	1,65 Monate?	Mit 07.04.27	Mit 02.06.27			
200	**Sockel**	0,8 Monate	Don 03.06.27	Don 08.07.27			
201	ggf. FBV Folie	2 Tage	Don 03.06.27	Fre 04.06.27	199	202	
202	Sockel_Schalung	2 Tage	Mon 07.06.27	Die 08.06.27	201	203	
203	Bewehrung	8 Tage	Mit 09.06.27	Fre 02.07.27	202	204	
204	Bewehrungsabnahme	0 Tage	Fre 02.07.27	Fre 02.07.27	203	205	
205	Schalung schließen	1 Tag	Mon 05.07.27	Mon 05.07.27	204	206EA+3 Tage	
206	Betonage	3 Monate	Don 08.07.27	Don 08.07.27	205EA+3 Tage	208;211EA+2 Wochen;2	
207	**Abdichtung**	0,5 Monate	Fre 09.07.27	Don 22.07.27		157;156	
208	Abdichtung	10 Tage	Fre 09.07.27	Don 22.07.27	206		
209	**Holzbau**	33,85 Monate?	Fre 19.02.27	Don 06.12.29			
210	Vorplanung + Vorfertigung Holzbau	3,5 Monate	Die 30.03.27	Fre 30.07.27	213AE	216;29AA	
211	Baustelleneinrichtung	1 Woche	Fre 23.07.27	Don 29.07.27	206EA+2 Wochen	216;213	
212	**EG**	1 Monat	Fre 30.07.27	Don 26.08.27			
213	EG Wände + Stützen	3 Wochen	Fre 30.07.27	Don 19.08.27	211;206EA+15 Tage	214;210AE;215;165	
214	Decke über EG	1 Woche	Fre 20.08.27	Don 26.08.27	213		
215	Treppe	1 Woche	Fre 20.08.27	Don 26.08.27	213	217	
216	**1. OG**	1 Monat	Fre 27.08.27	Don 23.09.27	210;211		
217	1. OG Wände + Stützen	3 Wochen	Fre 27.08.27	Don 16.09.27	215	218;220	
218	Decke über 1. OG / Dach	1 Woche	Fre 17.09.27	Don 23.09.27	217	223AA;231	
219	**Dach**	0,75 Monate	Fre 17.09.27	Don 07.10.27			
220	Attika	1 Woche	Fre 17.09.27	Don 23.09.27	217	221	
221	Oberlicht	2 Wochen	Fre 24.09.27	Don 07.10.27	220		
222	**Dach**	1,6 Monate?	Fre 17.09.27	Mon 01.11.27			
223	Dachdecker Notabdichtung (wg. Flachdach zwingend im Zuge der Holzbaumontage einzutakten!) - Dachdecker arbeitet tagesversetzt mit Zimmerer parallel	10 Tage	Fre 17.09.27	Don 30.09.27	218AA	224;232;233;33	
224	Sekuranten	0,05 Monate?	Fre 01.10.27	Fre 01.10.27	223	225	
225	Verkleidung Oberlicht	0,05 Monate?	Mon 04.10.27	Mon 04.10.27	224	226	
226	Dämmung + Dachabdichtung	10 Tage	Die 05.10.27	Mon 18.10.27	225	227;229	
227	Substrat	5 Tage	Die 19.10.27	Mon 25.10.27	226	228	
228	Seilsicherung	1 Woche	Die 26.10.27	Mon 01.11.27	227		
229	Einbau Dachausstieg	1 Woche	Die 19.10.27	Mon 25.10.27	226		
230	**Hülle: Fassade, Türen, Fenster, Dachentwässerung, Oberlicht**	16,2 Monate?	Mon 10.08.26	Don 16.12.27			
231	Fassadenarbeiten holzbau	60 Tage	Fre 24.09.27	Don 16.12.27	218		
232	Fenster EG	15 Tage	Fre 01.10.27	Don 21.10.27	223		
233	Fenster 1. OG	15 Tage	Fre 01.10.27	Don 21.10.27	223	33	
234	Türen	0,05 Monate?	Mon 10.08.26	Mon 10.08.26			
235	**Bauzeit Technik, Blocker für Angaben Inros Lackner**	160 Tage	Fre 05.11.27	Mit 05.07.28	33EA+2 Wochen		
236	**Bauzeit Technik, Blocker für Angaben SHT**	160 Tage	Fre 05.11.27	Mit 05.07.28	33EA+2 Wochen		
237	**Bauzeit Ausbau Hochbau**	160 Tage	Fre 05.11.27	Mit 05.07.28	33EA+10 Tage	238;34	
238	*Terminpuffer Unvorhergesehenes*	2 Monate	Don 06.07.28	Mit 30.08.28	237		
239	**BA 1**	44 Monate?	Die 19.11.24	Mon 19.06.28			
240	**Rohbau**	3,15 Monate	Mit 02.06.27	Fre 10.09.27			
263	**Holzbau**	33,85 Monate	Fre 19.02.27	Don 06.12.29			
274	**Dachabdichtung**	1,6 Monate?	Mon 08.11.27	Die 04.01.28			
282	**Hülle: Fassade, Türen, Fenster, Dachentwässerung, Oberlicht**	39,9 Monate?	Die 19.11.24	Fre 18.02.28			
288	**Bauzeit Technik, Blocker für Angaben Inros Lackner**	160 Tage	Fre 05.11.27	Mit 05.07.28	33EA+2 Wochen	296;297;304	
289	**Bauzeit Technik, Blocker für Angaben SHT**	160 Tage	Fre 05.11.27	Mit 05.07.28	33EA+2 Wochen		
290	**Bauzeit Ausbau Hochbau**	160 Tage	Fre 05.11.27	Mit 05.07.28	33EA+10 Tage	291;293;40	
291	*Terminpuffer Unvorhergesehenes*	1 Monat	Don 06.07.28	Mit 02.08.28	290	167	
292	**Inbetriebnahme/Abnahme/Übergabe**	3,75 Monate?	Don 06.07.28	Don 19.10.28			
293	Vorbegehungen Hochbau (mit Bauherrn)	15 Tage	Don 06.07.28	Mit 26.07.28	290	294	
294	VOB-Abnahmen-Hochbau	10 Tage	Don 27.07.28	Mit 09.08.28	293	295AA+5 Tage	
295	Mängelbeseitigung Hochbau	20 Tage	Don 03.08.28	Mit 30.08.28	294AA+5 Tage	303;159	
296	Inbetriebnahme, Einregulierung und Probebetrieb	35 Tage	Don 06.07.28	Mit 23.08.28	288	299;300	
297	PPVO Abnahmen	30 Tage	Don 06.07.28	Mit 16.08.28	288		
298	Vorbegehungen TGA- Blocker Angaben TGA notwendig	15 Tage	Mit 23.08.28	Die 12.09.28			
299	SV-Abnahmen ELT - Blocker Angaben TGA notwendig	0 Tage	Mit 23.08.28	Mit 23.08.28	296	301	
300	SV-Abnahme Lüftung - Blocker Angaben TGA notwendig	0 Tage	Mit 23.08.28	Mit 23.08.28	296	301	
301	VOB-Abnahmen TGA - Blocker Angaben TGA notwendig	10 Tage	Don 24.08.28	Mit 06.09.28	299;300	302	
302	Mängelbeseitigung TGA - Blocker Angaben TGA notwendig	10 Tage	Don 07.09.28	Mit 20.09.28	301	303	
303	Baurechtliche Abnahme	0 Min.	Mit 20.09.28	Mit 20.09.28	295;302	306EA+1 Monat	
304	Entnahme Trinkwasserproben - Blocker Angaben TGA notwendig	10 Tage	Don 06.07.28	Mit 19.07.28	288		
305	Außenanlagen- ggf. Provisorium Blocker	0,05 Monate?	Don 19.10.28	Don 19.10.28	306AE		
306	Übergabe an das RBZ/Einzug	0 Tage	Don 19.10.28	Don 19.10.28	303EA+1 Monat	305AE;307EA+4 Wochen	
307	**Abbruch Bestand**	3,2 Monate?	Mon 20.11.28	Don 01.03.29	306EA+4 Wochen		
312	**BA 3**	5,75 Monate	Mon 05.02.29	Fre 20.07.29			
313	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 05.02.29	Fre 09.02.29	308	314	
314	Baugrube / Herrichten	10 Tage	Mon 12.02.29	Fre 23.02.29	313	315	
315	Bauzeit Rohbau / Beton	15 Tage	Mon 26.02.29	Fre 16.03.29	314	316	
316	Bauzeit Rohbau / Holz	15 Tage	Mon 19.03.29	Die 10.04.29	315	317EA-5 Tage	
317	Bauzeit Gebäudehülle Dach	10 Tage	Mit 04.04.29	Die 17.04.29	316EA-5 Tage	318EA-5 Tage	
318	Bauzeit Gebäudehülle Fenster / Wand	25 Tage	Mit 11.04.29	Don 17.05.29	317EA-5 Tage	319	
319	Bauzeit Ausbau	10 Tage	Fre 18.05.29	Fre 01.06.29	318	320EA-5 Tage	
320	Bauzeit Technik	15 Tage	Mon 28.05.29	Fre 15.06.29	319EA-5 Tage	323;321	
321	Inbetriebnahmephase / Mängelbeseitigung / Abnahmen	5 Tage	Mon 16.07.29	Fre 20.07.29	323;320	322	
322	Übergabe B.3	0 Tage	Fre 20.07.29	Fre 20.07.29	321	325;46	
323	**Bauzeit Aussenanlagen Angaben tBL notwendig**	20 Tage	Mon 18.06.29	Fre 13.07.29	320	321	
324	Nachbereitung / Abrechnung	19 Tage	Mon 06.08.29	Don 30.08.29	325		
325	Fertigstellung Werkhof (Auflösung Interim) / Stellplätze	10 Tage	Mon 23.07.29	Fre 03.08.29	322	324
