
Bauzeitenplan

Pos	Vorgang	Start	Ende	Unternehmer
1	Vorfertigung Attikakasten	27.10.2025	21.11.2025	Schmitz
2	Bestand, Abbruch Schalung, Wetterschutz	27.10.2025	31.10.2025	Schmitz
3	Bestand, Erstellung Randpfetten, Auskragung	29.10.2025	11.11.2025	Schmitz
4	Bestand, Dachschalung inkl. Ausschnitte	10.11.2025	19.11.2025	Schmitz
5	Bestand, Attikakasten montieren	20.11.2025	26.11.2025	Schmitz
6				
7	Bestand, Brandschutzlage, Dachabdichtung	03.12.2025	19.12.2025	Marx
8	Bestand, Dämmung, Stellwand, Dampfsperre	03.12.2025	19.12.2025	Schmitz
9	Neubau + Bestand, Grundleitungsanschlüsse???	07.09.2026	18.09.2026	TGA
10	Neubau + Bestand, Dacheinbauten TGA???	07.09.2026	18.09.2026	TGA
11				
12	Meterriss anbringen	04.09.2026	04.09.2026	Benzel
13	Neubau, Dampfsperre, Dachrand	31.08.2026	04.09.2026	Marx
14	Neubau, Randholz u. Attikakasten	07.09.2026	11.09.2026	Schmitz
15	Neubau, Fallrohre, Dachaufbau, Dampfsperre	14.09.2026	09.10.2026	Marx
16	Neubau, Gründach	12.10.2026	23.10.2026	Marx
17	Attikabohle, Blech, alle Gebäudeteile außer Aufsicht	26.10.2026	06.11.2026	Marx
18				
19	Bestand, Fallrohre Provisorisch (KG Rohr)	07.09.2026	11.09.2026	Marx
20	Bestand, Dachränder anpassen an Attikakästen	14.09.2026	18.09.2026	Marx
21				
22	Bestand, Oberlichter	14.09.2026	25.09.2026	Schmitz
23	Neubau, Innenputz EG, Anstrich KG	14.09.2026	18.09.2026	Thomas
24	Bestand, Betonwände ausbessern/putzen	14.09.2026	25.09.2026	Thomas
25	Aufmaß Türen und Fenster	07.09.2026	07.09.2026	Reco
26	technische Freigabe nach Aufmaß	07.09.2026	02.10.2026	Reco
27	Lieferzeit Fenster & Türen	05.10.2026	27.11.2026	Reco
28	Stützen Eingangstor	23.11.2026	27.11.2026	Reco
29	Tormontage	30.11.2026	04.12.2026	Reco
30	Montage Fenster & Türen	30.11.2026	11.12.2026	Reco
31				
32	Restarbeiten EMB	26.10.2026	06.11.2026	
33	Trocknungszeiten	02.11.2026	27.11.2026	
34				
35	Neubau, Trockenbau, Wände einseitig	21.09.2026	02.10.2026	Szymanski
36	Bestand, Trockenbau, Wände einseitig	05.10.2026	16.10.2026	Szymanski
37	Neubau, TGA, Wand- und Deckeninstallationen	05.10.2026	06.11.2026	TGA
38	Bestand, TGA, Wand- und Deckeninstallationen	19.10.2026	20.11.2026	TGA
39	Neubau, TRB, Wände schließen, Spachteln, Verkofferungen	09.11.2026	20.11.2026	Szymanski
40	Bestand, TRB, Wände schließen, Spachteln, Verkofferungen	23.11.2026	11.12.2026	Szymanski
41	Tischler, Aufmaß und Fensterbestellung	11.01.2027	05.03.2027	Tischler
42	Tischler, Provisorium Oberlichter	11.01.2027	15.01.2027	Tischler
43	Tischler, Fenster Oberlichter	08.03.2027	19.03.2027	Tischler
44				
45	TGA, Fußbodenheizung	09.11.2026	20.11.2026	TGA
46	Türen müssen vor Estrich eingebaut sein! Welche???			
47	Neubau, Estricharbeiten UG	21.09.2026	25.09.2026	Tash Bodenbau
48	Trocknungszeit	26.09.2026	20.10.2026	Tash Bodenbau
49	Verschließen Rohrgräben inklusive TrocknungWER???	21.09.2026	09.10.2026	
50	Neubau, Estricharbeiten EG Technik	28.09.2026	02.10.2026	Tash Bodenbau
51	Trocknungszeit	03.10.2026	27.10.2026	Tash Bodenbau
52	Bestand, Estricharbeiten UG	12.10.2026	23.10.2026	Tash Bodenbau
53	Trocknungszeit	24.10.2026	17.11.2026	Tash Bodenbau
54	Neubau, Estricharbeiten EG Sozialtrakt	23.11.2026	11.12.2026	Tash Bodenbau
55	Trocknungszeit	12.12.2026	05.01.2027	Tash Bodenbau
56	Bestand, Estricharbeiten EG	18.01.2027	29.01.2027	Tash Bodenbau
57	Trocknungszeit	30.01.2027	23.02.2027	Tash Bodenbau
58				
59	Bestand, TRB, Decken	22.02.2027	12.03.2027	Szymanski
60	Bestand, Fliesenarbeiten	15.03.2027	02.04.2027	Fliesenleger
61	Mobilwand, Unterkonstruktion	08.03.2027	12.03.2027	
62	Neubau, TRB, Decken	15.03.2027	26.03.2027	Szymanski
63	Neubau, Fliesenarbeiten	29.03.2027	09.04.2027	Fliesenleger
64				
65	Bestand, Malerarbeiten, innen	15.03.2027	09.04.2027	Thomas
66	Hauptgebäude, Fassadenbekleidung	29.03.2027	02.04.2027	Schmitz
67	Hauptgebäude Putz + Anstrich, außen	29.03.2027	23.04.2027	Thomas
68	Neubau, Maler, innen	12.04.2027	30.04.2027	Thomas
69	Bestand, Deckstrich Betonwände	03.05.2027	07.05.2027	Thomas
70	Neubau + Bestand, Fallrohre	26.04.2027	30.04.2027	Marx
71	WC-Trennwände, Umkleiden, Schließfächer	03.05.2027	21.05.2027	
72	Kioskeinrichtung	03.05.2027	14.05.2027	
73	Tischler, Innentüren	10.05.2027	14.05.2027	Tischler
74	Mobilwand, Endmontage	10.05.2027	14.05.2027	
75	Schlosser, Sonstiges	10.05.2027	14.05.2027	Schlosser
76	Tischler, Ausstattung	10.05.2027	14.05.2027	Tischler
77				
78	Gerüst Aufsicht	03.05.2027	18.06.2027	
79	Aufsicht, Abbruch Dachdeckung	03.05.2027	05.05.2027	Marx
80	Aufsicht, Dacheinbauten TGA???	03.05.2027	07.05.2027	TGA
81	Aufsicht, Abbruch Attika	06.05.2027	10.05.2027	Schmitz/Reco
82	Aufsicht, Dampfsperre, Dachrand	11.05.2027	14.05.2027	Marx
83	Aufsicht, Attikakasten montieren	17.05.2027	21.05.2027	Schmitz
84	Aufsicht, Dachaufbau	24.05.2027	28.05.2027	Marx
85	Attikabohle, Blech, Aufsicht	31.05.2027	02.06.2027	Marx
86	Aufsicht, Putz + Anstrich, außen	07.06.2027	18.06.2027	Thomas
87	Schlosser, Treppe	31.05.2027	11.06.2027	
88	PV Anlage	05.07.2027	23.07.2027	
89	Außenanlage			

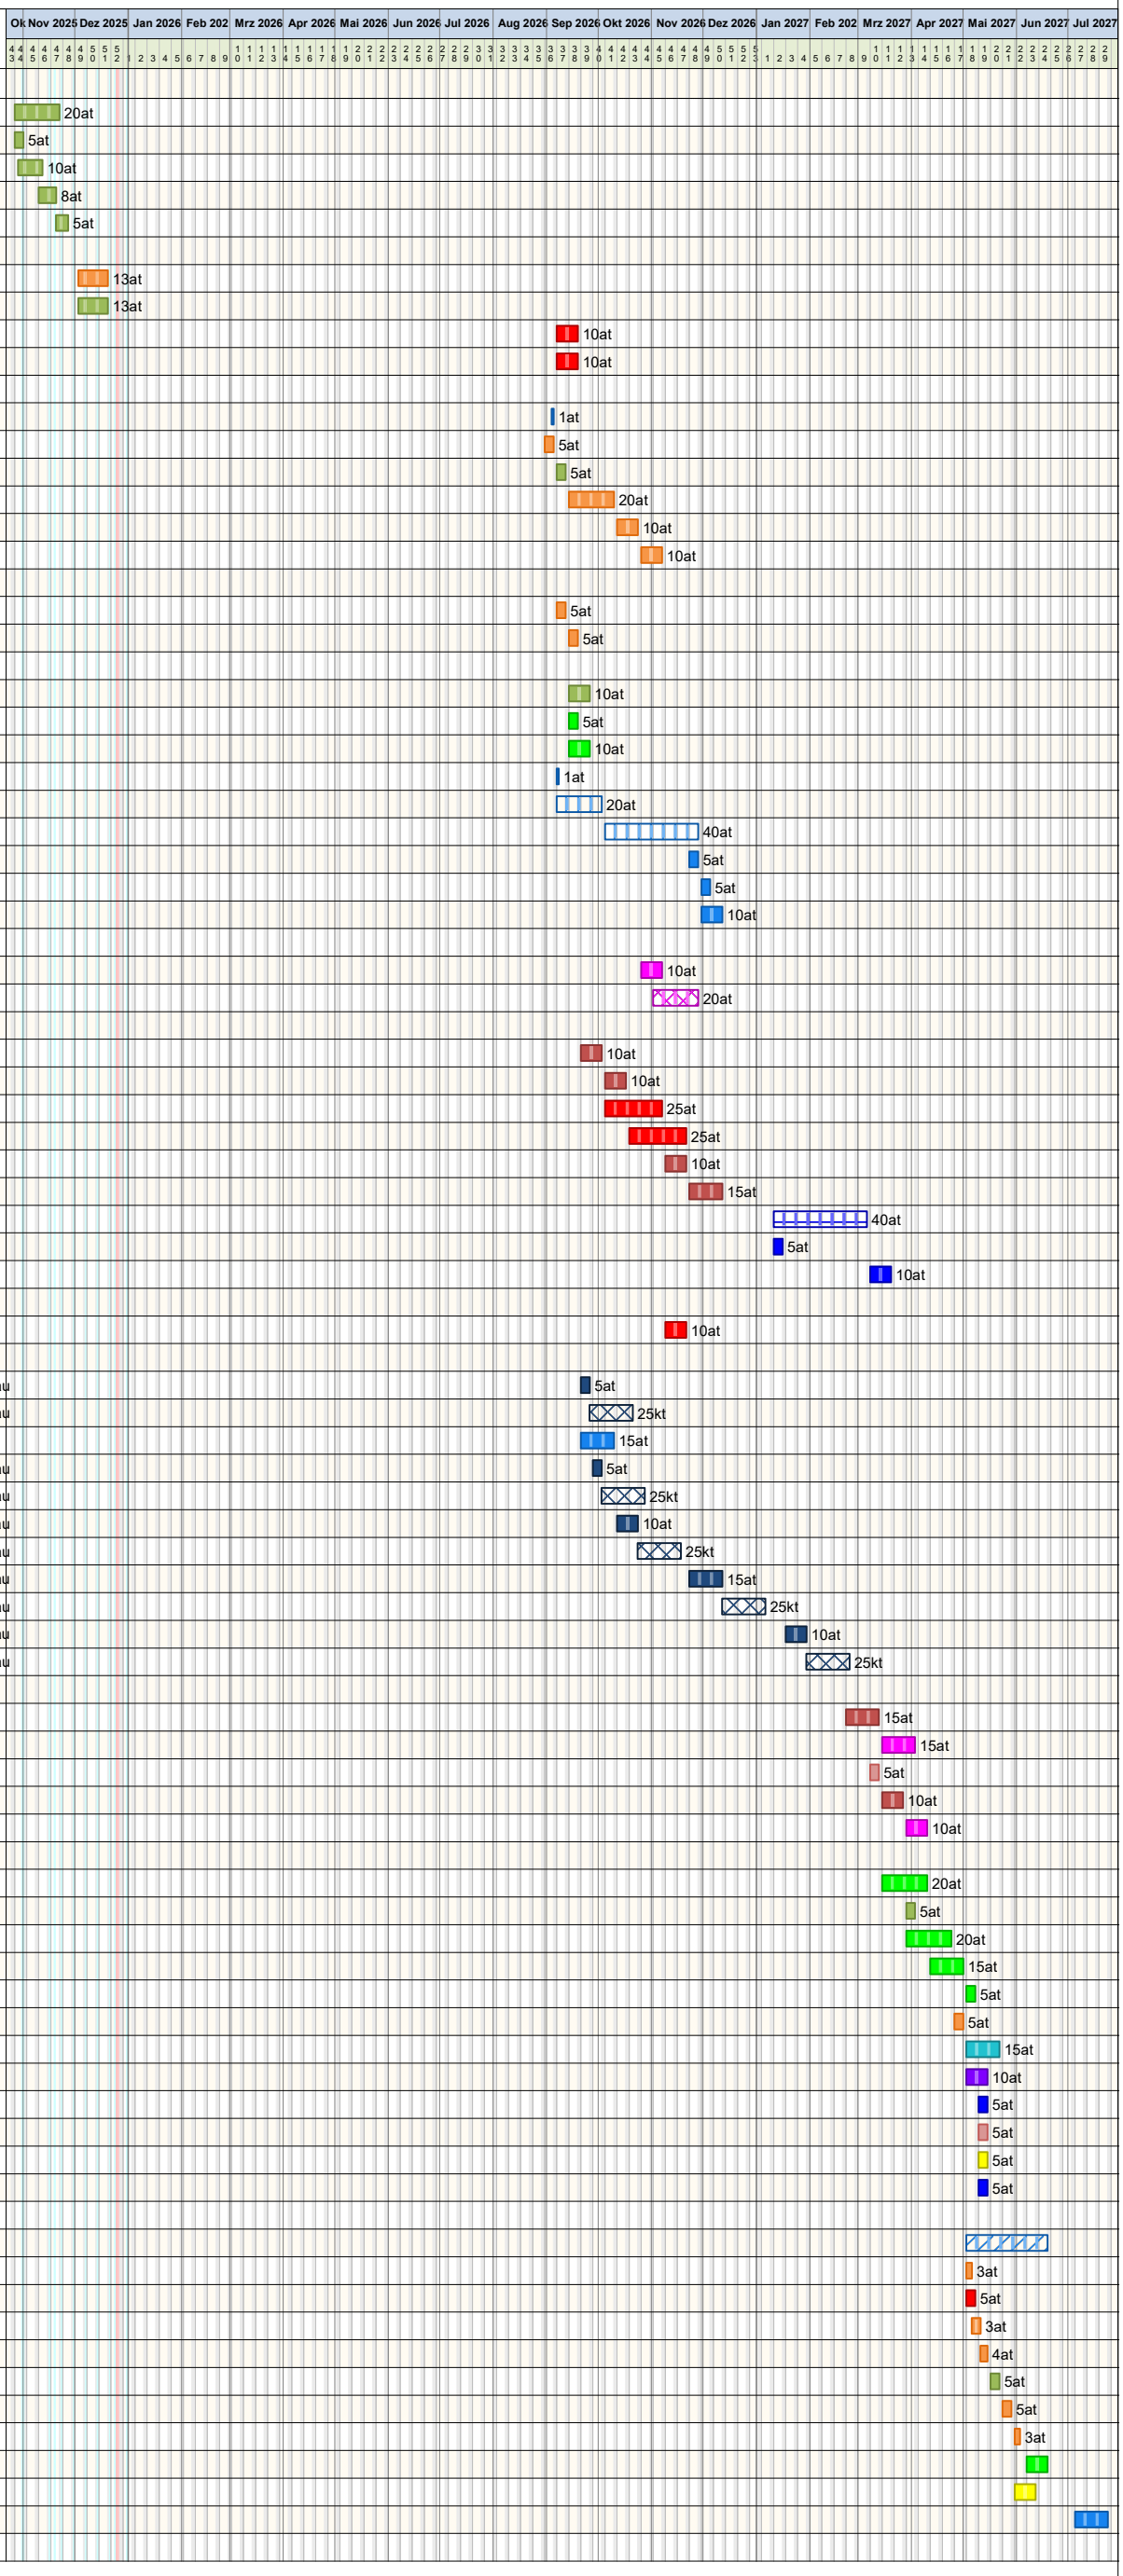

erstellt mit pro-Plan 5 (5.0.1.68) Serien Nr.: 275 Lizenz für Werner, Dillenbourg

Projektzeitrahmen von 13.10.2025 bis 31.07.2027
Kalender: Hessen (eingebettet)
Druckdatum: 11.09.2026 09:44
Filter:

Geupel
Höllkopfstr. 13
D-35759 Driedorf
Tel. 02775 577390
e-Mail: info@ab-geupel.com
