Stand 15.06.2026

Familientagesklinik Hof Menke

w+ID InnenArchitektur und Design
Hermann Weglage

Stichtag: 31.03.26 08:00
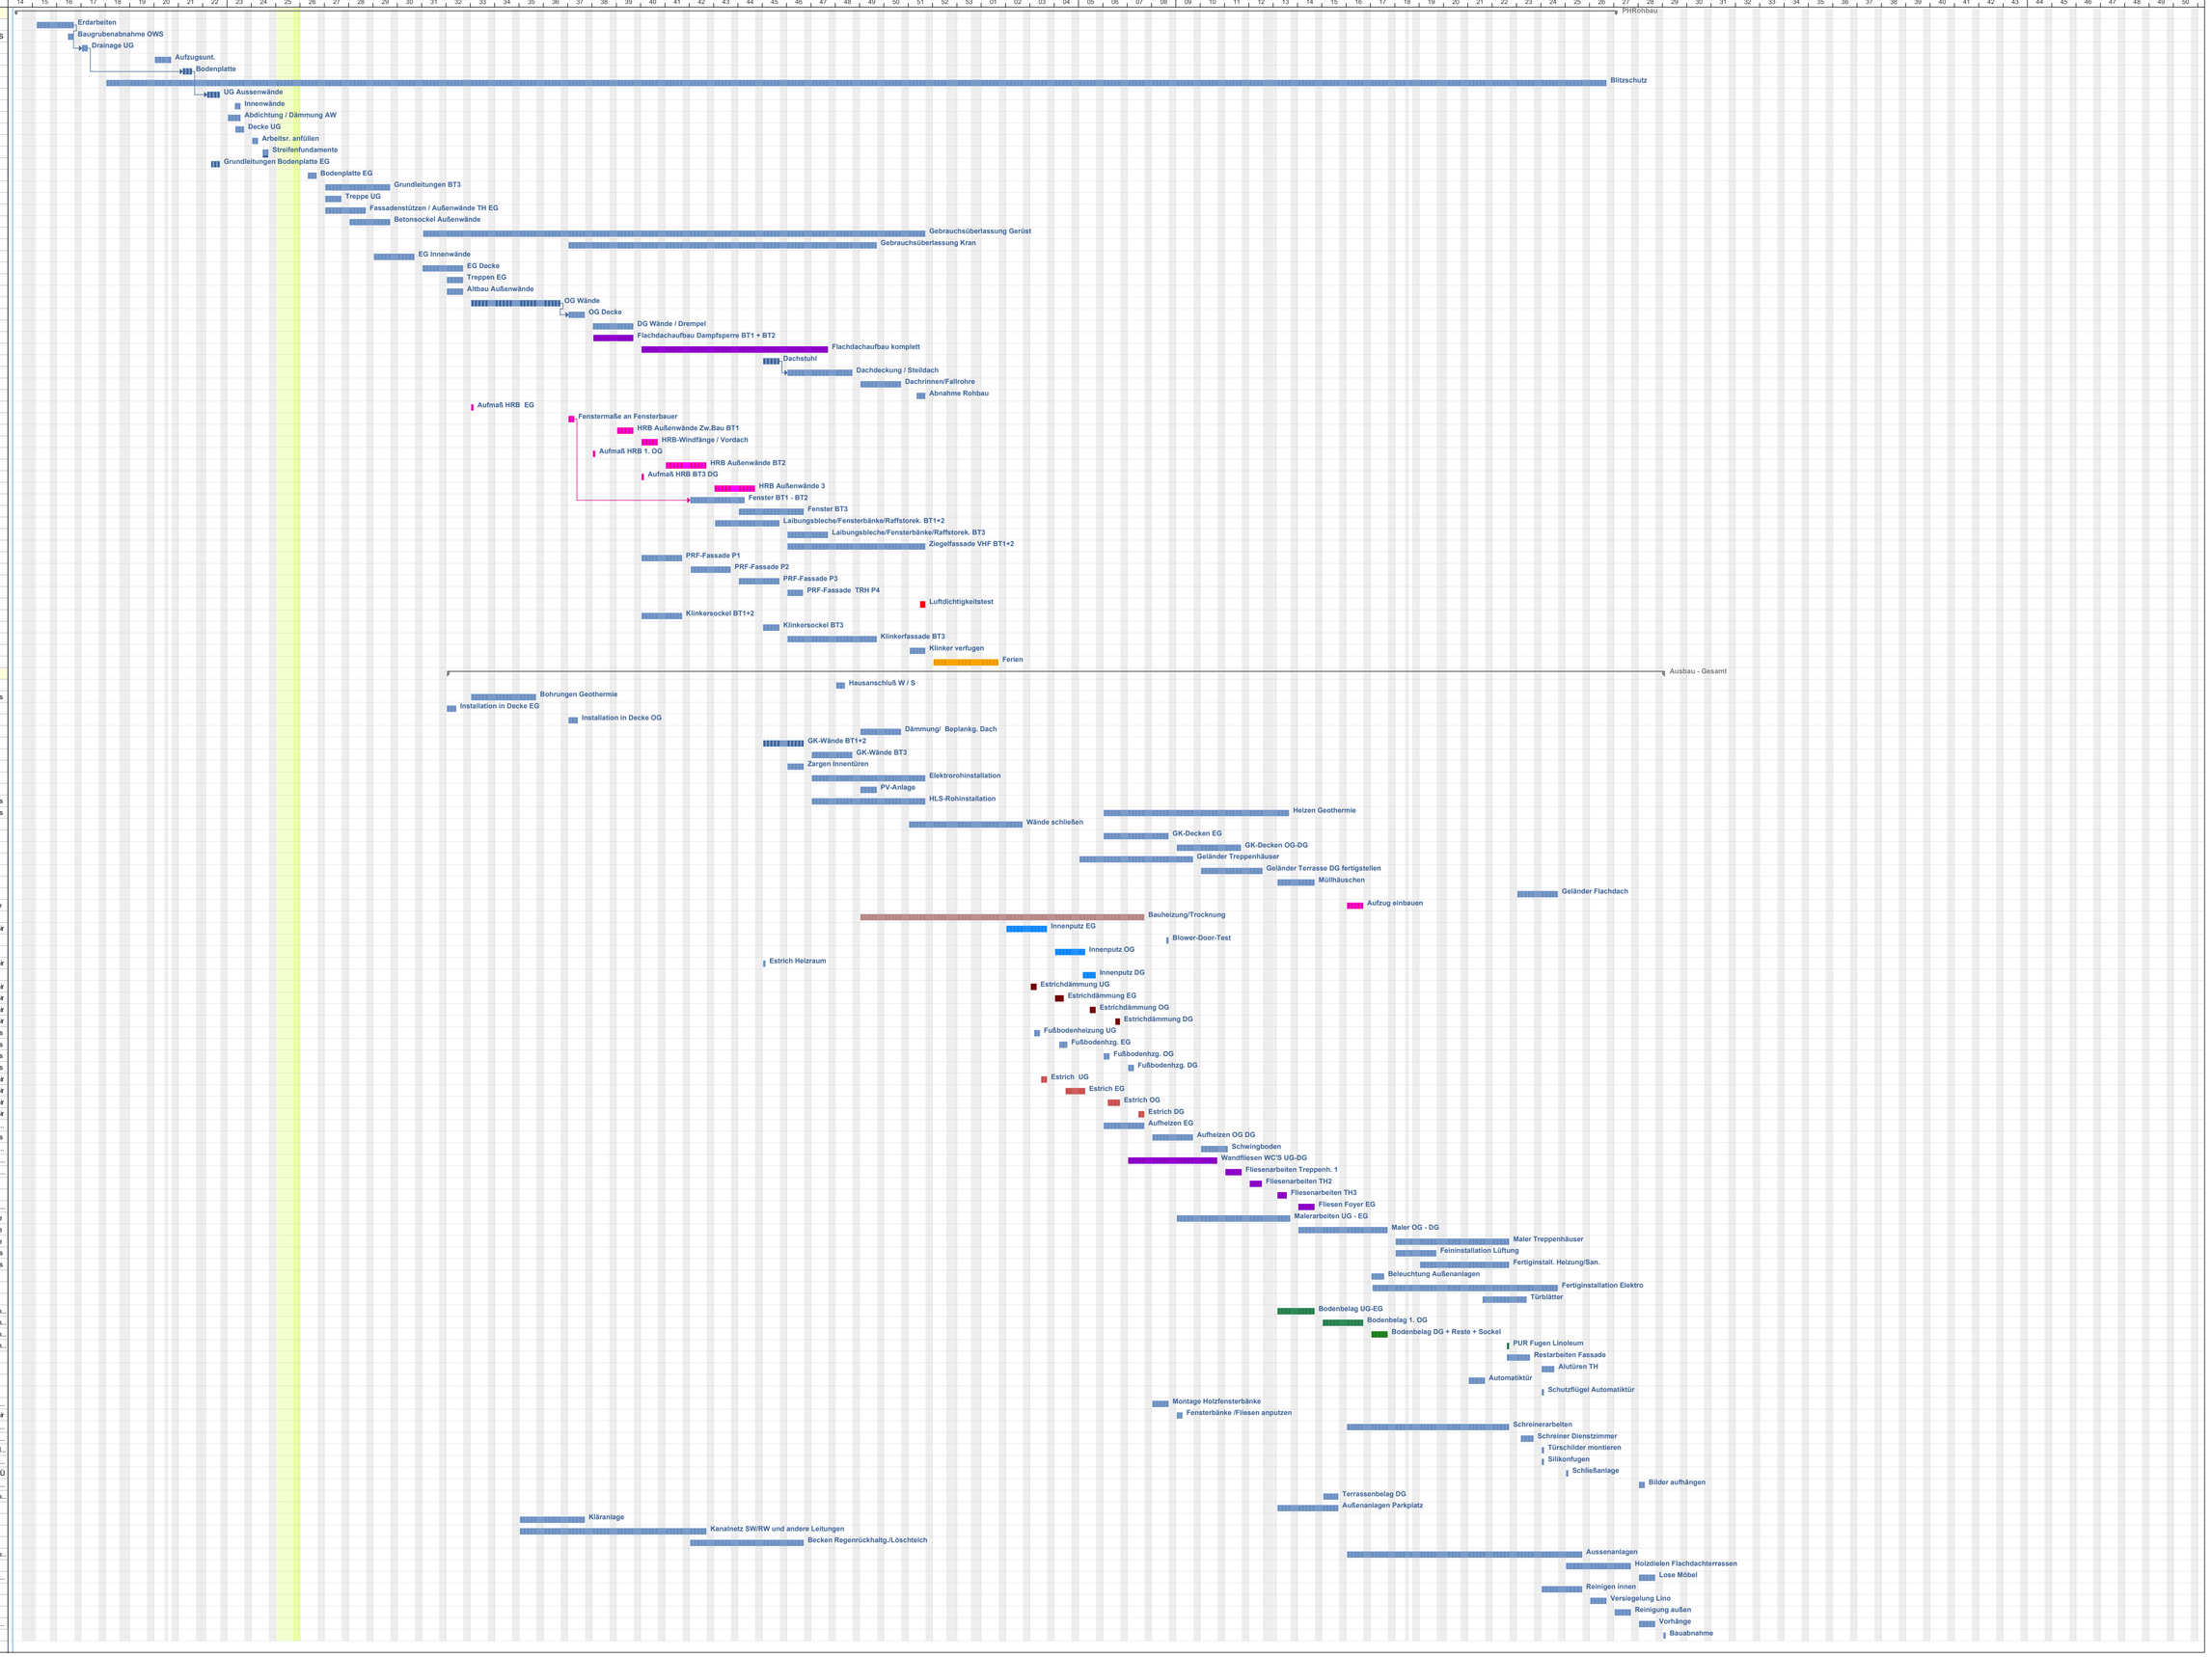
Nr.	Name	Dauer AT	Anfang	Ende	Benu.
1	**PHRohbau**	**318**	**01.04.26**	**06.07.27**	
1.8	Erdarbeiten	9	07.04.26	17.04.26	GH
1.9	Baugrubenabnahme...	2	16.04.26	17.04.26	OWS
1.10	Drainage UG	2	20.04.26	21.04.26	GH
1.12	Aufzugsunt.	4	11.05.26	15.05.26	GH
1.16	Bodenplatte	3	19.05.26	21.05.26	GH
1.17	Blitzschutz	300.88	27.04.26	02.07.27	HL
1.18	UG Aussenwände	4	26.05.26	29.05.26	GH
1.19	Innenwände	2	03.06.26	04.06.26	GH
1.20	Abdichtung / Dämm...	4	01.06.26	04.06.26	GH
1.21	Decke UG	2.5	03.06.26	05.06.26	GH
1.22	Arbeitsr. anfüllen	1.88	08.06.26	09.06.26	GH
1.23	Streifenfundamente	1.88	11.06.26	12.06.26	GH
1.24	Grundleitungen Bod...	2.5	27.05.26	29.05.26	GH
1.25	Bodenplatte EG	2.5	24.06.26	26.06.26	GH
1.26	Grundleitungen BT3	15	29.06.26	17.07.26	GH
1.33	Treppe UG	5	29.06.26	03.07.26	GH
1.35	Fassadenstützen / A...	10	29.06.26	10.07.26	GH
1.36	Betonsockel Außen...	10	06.07.26	17.07.26	GH
1.38	Gebrauchsüberlass...	104.5	27.07.26	18.12.26	EFF
1.39	Gebrauchsüberlass...	65	07.09.26	04.12.26	GH
1.41	EG Innenwände	10	13.07.26	24.07.26	GH
1.42	EG Decke	10	27.07.26	07.08.26	GH
1.44	Treppen EG	5	03.08.26	07.08.26	GH
1.45	Altbau Außenwände	5	03.08.26	07.08.26	GH
1.46	OG Wände	20	10.08.26	04.09.26	GH
1.47	OG Decke	5	07.09.26	11.09.26	GH
1.48	DG Wände / Drempel	10	14.09.26	25.09.26	GH
1.49	Flachdachaufbau D...	9.5	14.09.26	25.09.26	AB
1.66	Flachdachaufbau ko...	40	28.09.26	20.11.26	AB
1.68	Dachstuhl	4.88	02.11.26	06.11.26	HP
1.70	Dachdeckung / Steil...	15	09.11.26	27.11.26	AB
1.71	Dachrinnen/Fallrohre	10	30.11.26	11.12.26	AB
1.75	Abnahme Rohbau	2.5	16.12.26	18.12.26	
1.76	Aufmaß HRB EG	1	10.08.26	10.08.26	HP
1.77	Fenstermaße an Fe...	2	07.09.26	08.09.26	HP
1.78	HRB Außenwände Z...	5	21.09.26	25.09.26	HP
1.79	HRB-Windfänge / V...	5	28.09.26	02.10.26	HP
1.80	Aufmaß HRB 1. OG	1	14.09.26	14.09.26	HP
1.81	HRB Außenwände B...	10	05.10.26	16.10.26	HP
1.82	Aufmaß HRB BT3 DG	1	28.09.26	28.09.26	HP
1.83	HRB Außenwände 3	10	19.10.26	30.10.26	HP
1.84	Fenster BT1 - BT2	11.88	12.10.26	27.10.26	MS
1.85	Fenster BT3	15	26.10.26	13.11.26	MS
1.86	Laibungsbleche/Fen...	14.5	19.10.26	06.11.26	MS
1.87	Laibungsbleche/Fen...	9.88	09.11.26	20.11.26	MS
1.88	Ziegelfassade VHF ...	30	09.11.26	18.12.26	HP
1.90	PRF-Fassade P1	10	28.09.26	09.10.26	MS
1.91	PRF-Fassade P2	9.5	12.10.26	23.10.26	MS
1.92	PRF-Fassade P3	10	26.10.26	06.11.26	MS
1.93	PRF-Fassade TRH...	4.5	09.11.26	13.11.26	MS
1.94	Luftdichtigkeitstest	1.5	17.12.26	18.12.26	HP
1.95	Klinkersockel BT1+2	10	28.09.26	09.10.26	GH
1.98	Klinkersockel BT3	5	02.11.26	06.11.26	GH
1.99	Klinkerfassade BT3	20	09.11.26	04.12.26	GH
1.101	Klinker verfugen	4.5	14.12.26	18.12.26	GH
1.103	Ferien	13	21.12.26	08.01.27	
2	**Ausbau - Gesamt**	**245**	**03.08.26**	**19.07.27**	
2.2	Hausanschluß W / S	2.5	23.11.26	25.11.26	
2.5	Bohrungen Geother...	15	10.08.26	28.08.26	Rings
2.6	Installation in Decke ...	3	03.08.26	05.08.26	BB
2.7	Installation in Decke ...	3	07.09.26	09.09.26	BB
2.10	Dämmung/ Beplank...	10	30.11.26	11.12.26	HP
2.11	GK-Wände BT1+2	10	02.11.26	13.11.26	DH
2.12	GK-Wände BT3	10	16.11.26	27.11.26	DH
2.13	Zargen Innentüren	5	09.11.26	13.11.26	SCH
2.14	Elektrorohinstallation	25	16.11.26	18.12.26	BB
2.15	PV-Anlage	5	30.11.26	04.12.26	
2.20	HLS-Rohinstallation	25	16.11.26	18.12.26	Rings
2.24	Heizen Geothermie	37.13	08.02.27	02.04.27	Rings
2.49	Wände schließen	23	14.12.26	15.01.27	DH
2.51	GK-Decken EG	15	08.02.27	26.02.27	DH
2.52	GK-Decken OG-DG	14.5	01.03.27	19.03.27	DH
2.55	Geländer Treppenhä...	25	01.02.27	05.03.27	MB
2.56	Geländer Terrasse ...	14	08.03.27	25.03.27	MB
2.57	Mülhäuschen	9	30.03.27	09.04.27	MB
2.58	Geländer Flachdach	10	07.06.27	18.06.27	MB
2.59	Aufzug einbauen	5	19.04.27	23.04.27	Kone
2.61	Bauheizung/Trocknu...	57.88	30.11.26	19.02.27	
2.63	Innenputz EG	10	11.01.27	22.01.27	Demir
2.64	Blower-Door-Test	1	26.02.27	26.02.27	HP
2.65	Innenputz OG	7	25.01.27	02.02.27	
2.66	Estrich Heizraum	1	02.11.26	02.11.26	Demir
2.67	Innenputz DG	4	02.02.27	05.02.27	
2.68	Estrichdämmung UG	2	18.01.27	19.01.27	Demir
2.69	Estrichdämmung EG	2.5	25.01.27	27.01.27	Demir
2.70	Estrichdämmung OG	2	04.02.27	05.02.27	Demir
2.71	Estrichdämmung DG	1.13	11.02.27	12.02.27	Demir
2.72	Fußbodenheizung UG	2	19.01.27	20.01.27	Rings
2.73	Fußbodenhzg. EG	2	26.01.27	28.01.27	Rings
2.74	Fußbodenhzg. OG	2	08.02.27	09.02.27	Rings
2.75	Fußbodenhzg. DG	2	15.02.27	16.02.27	Rings
2.76	Estrich UG	2	21.01.27	22.01.27	Demir
2.77	Estrich EG	4	28.01.27	02.02.27	Demir
2.78	Estrich OG	3.5	09.02.27	12.02.27	Demir
2.79	Estrich DG	2	18.02.27	19.02.27	Demir
2.83	Aufheizen EG	10	08.02.27	19.02.27	Schl...
2.84	Aufheizen OG DG	10	22.02.27	05.03.27	Rings
2.86	Schwingboden	6	08.03.27	15.03.27	Top ...
2.87	Wandfliesen WC'S ...	20	15.02.27	12.03.27	Kum...
2.88	Fliesenarbeiten Trep...	5	15.03.27	19.03.27	Kum...
2.89	Fliesenarbeiten TH2	3.5	22.03.27	25.03.27	
2.90	Fliesenarbeiten TH3	3	30.03.27	01.04.27	
2.91	Fliesen Foyer EG	5	05.04.27	09.04.27	Kum...
2.94	Malerarbeiten UG - ...	23	01.03.27	02.04.27	Witte
2.95	Maler OG - DG	20	05.04.27	30.04.27	Witte
2.96	Maler Treppenhäuser	23	03.05.27	04.06.27	Witte
2.97	Feininstallation Lüftung	9	03.05.27	14.05.27	Rings
2.98	Fertiginstall. Heizung...	19	10.05.27	04.06.27	Rings
2.99	Beleuchtung Außena...	4	26.04.27	29.04.27	BB
2.100	Fertiginstallation Ele...	37	26.04.27	18.06.27	BB
2.101	Türblätter	9	28.05.27	09.06.27	SCH
2.102	Bodenbelag UG-EG	9	30.03.27	09.04.27	Holth...
2.103	Bodenbelag 1. OG	10	12.04.27	23.04.27	Holth...
2.104	Bodenbelag DG + R...	5	26.04.27	30.04.27	Holth...
2.105	PUR Fugen Linoleum	0.88	04.06.27	04.06.27	Holth...
2.106	Restarbeiten Fassade	5	04.06.27	10.06.27	MS
2.108	Alutüren TH	4	14.06.27	17.06.27	
2.109	Automatiktür	5	24.05.27	28.05.27	MS
2.110	Schutzflügel Automa...	1	14.06.27	14.06.27	MS
2.112	Montage Holzfenste...	5	22.02.27	26.02.27	Dink...
2.113	Fensterbänke /Flies...	2	01.03.27	02.03.27	Demir
2.114	Schreinerarbeiten	33	19.04.27	04.06.27	Dink...
2.115	Schreiner Dienstzim...	4	08.06.27	11.06.27	Dink...
2.116	Türschilder montieren	1	14.06.27	14.06.27	Dinkl...
2.117	Silikonfugen	1	14.06.27	14.06.27	Dink...
2.118	Schließanlage	1	21.06.27	21.06.27	RÜTÜ
2.119	Bilder aufhängen	2	12.07.27	13.07.27	Dink...
2.120	Terrassenbelag DG	4	12.04.27	16.04.27	Goro...
2.121	Außenanlagen Park...	13.5	30.03.27	16.04.27	
2.122	Kläranlage	15	24.08.26	11.09.26	
2.123	Kanalnetz SW/RW ...	40	24.08.26	16.10.26	
2.124	Becken Regenrückh...	25	12.10.26	13.11.26	
2.125	Aussenanlagen	48	19.04.27	25.06.27	Goro...
2.126	Holzdielen Flachdac...	15	21.06.27	09.07.27	
2.127	Lose Möbel	5	12.07.27	16.07.27	Mad...
2.128	Reinigen innen	10	14.06.27	25.06.27	Kimi
2.130	Versiegelung Lino	5	28.06.27	02.07.27	Kimi
2.131	Reinigung außen	5	05.07.27	09.07.27	Kimi
2.132	Vorhänge	5	12.07.27	16.07.27	Beg...
2.133	Bauabnahme	0.88	19.07.27	19.07.27
