Nr.	Vorgangsmodus	Lph	Los	VE / Gewerk	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
197		**8**		**0.01**	**Verlegung Pendelleitung (VE 0.01)**	**125 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Fre 12.02.27**	
198		8		0.01	Bauzaun setzen	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26	188;139
199		8		0.01	Baustraße + BE-Flächen für Pendelleitung und Baugrube ÜS	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26	198
200		8		0.01	Aushub UK Bettung Pendelleitung	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26	201AA-5 Tage;199
201		8		0.01	Herstellung Bettung	15 Tage	Mon 09.11.26	Fre 27.11.26	202AA-10 Tage
202		8		0.01	Verlegung der Fertigteilrohre	35 Tage	Mon 23.11.26	Fre 29.01.27	212EE+5 Tage
203		8		0.01	Dichtigkeitsprüfung	5 Tage	Mon 01.02.27	Fre 05.02.27	202
204		8		0.01	Arbeitsraumverfüllung	5 Tage	Mon 08.02.27	Fre 12.02.27	203
207		**8**		**0.01**	**VE 0.01 Rohbau Übergabestation**	**180 Tage**	**Mon 31.08.26**	**Fre 28.05.27**	
208		8		0.01	Baustelleneinrichtung (Baucamp, etc.)	10 Tage	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26	199
209		8		0.01	Rampe und Tragschicht für Rammgerät herstellen (+43.00)	20 Tage	Mon 14.09.26	Fre 09.10.26	208
210		8		0.01	Trägerbohlwand einbauen	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26	209
211		8		0.01	Baugrubenaushub (+39.80) und Anpassung Rampe	20 Tage	Mon 26.10.26	Fre 20.11.26	210
212		8		0.01	Bodenaustausch und Anpassung Rampe (bis UK Sauberkeitsschicht)	30 Tage	Mon 23.11.26	Fre 22.01.27	211
213		8		0.01	Aufschüttung auf +42.00 (Bereich Pendelleitung + Baustraße ÜS)	40 Tage	Mon 15.02.27	Fre 09.04.27	204
214		8		0.01	Herstellung Arbeitsebene für ÜS (+43.00)	15 Tage	Mon 12.04.27	Fre 30.04.27	213
215		8		0.01	Herstellung Lastverteilplatte	10 Tage	Mon 03.05.27	Fre 14.05.27	214
216		8		0.01	Sauberkeitsschicht ÜS herstellen	5 Tage	Mon 25.01.27	Fre 29.01.27	212
217		8		0.01	Schalen, Bewehren, Betonieren Bodenplatte	20 Tage	Mon 01.02.27	Fre 26.02.27	216
218		8		0.01	Arbeitsraumverfüllung	10 Tage	Mon 01.03.27	Fre 12.03.27	217
219		8		0.01	Schalen, Bewehren, Betonieren Wände	25 Tage	Mon 15.03.27	Fre 16.04.27	217;218
220		8		0.01	Schalen, Bewehren, Betonieren Balken	15 Tage	Mon 19.04.27	Fre 07.05.27	219
221		8		0.01	Schalen, Bewehren, Betonieren Deckenplatte ink. Attika	15 Tage	Mon 10.05.27	Fre 28.05.27	220

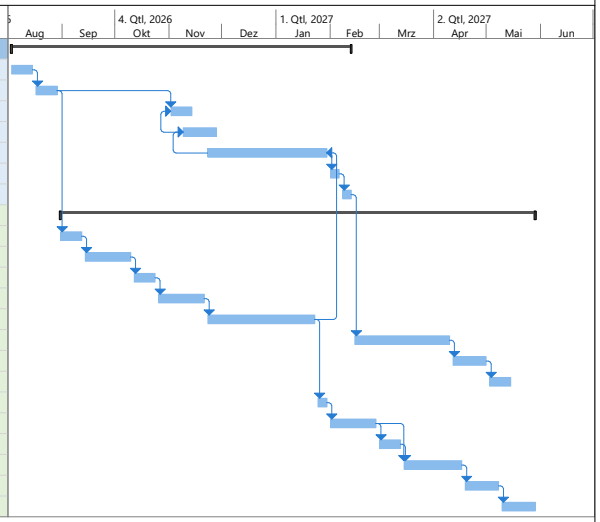

Vorgang | Sammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Nur Dauer | Nur Anfang | Externer Meilenstein | Kritische Unterbrechung
Unterbrechung | Projektsammelvorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Ende | Stichtag | In Arbeit
Meilenstein | Inaktiver Vorgang | Manueller Vorgang | Manueller Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Kritisch | Manueller Fortschritt
