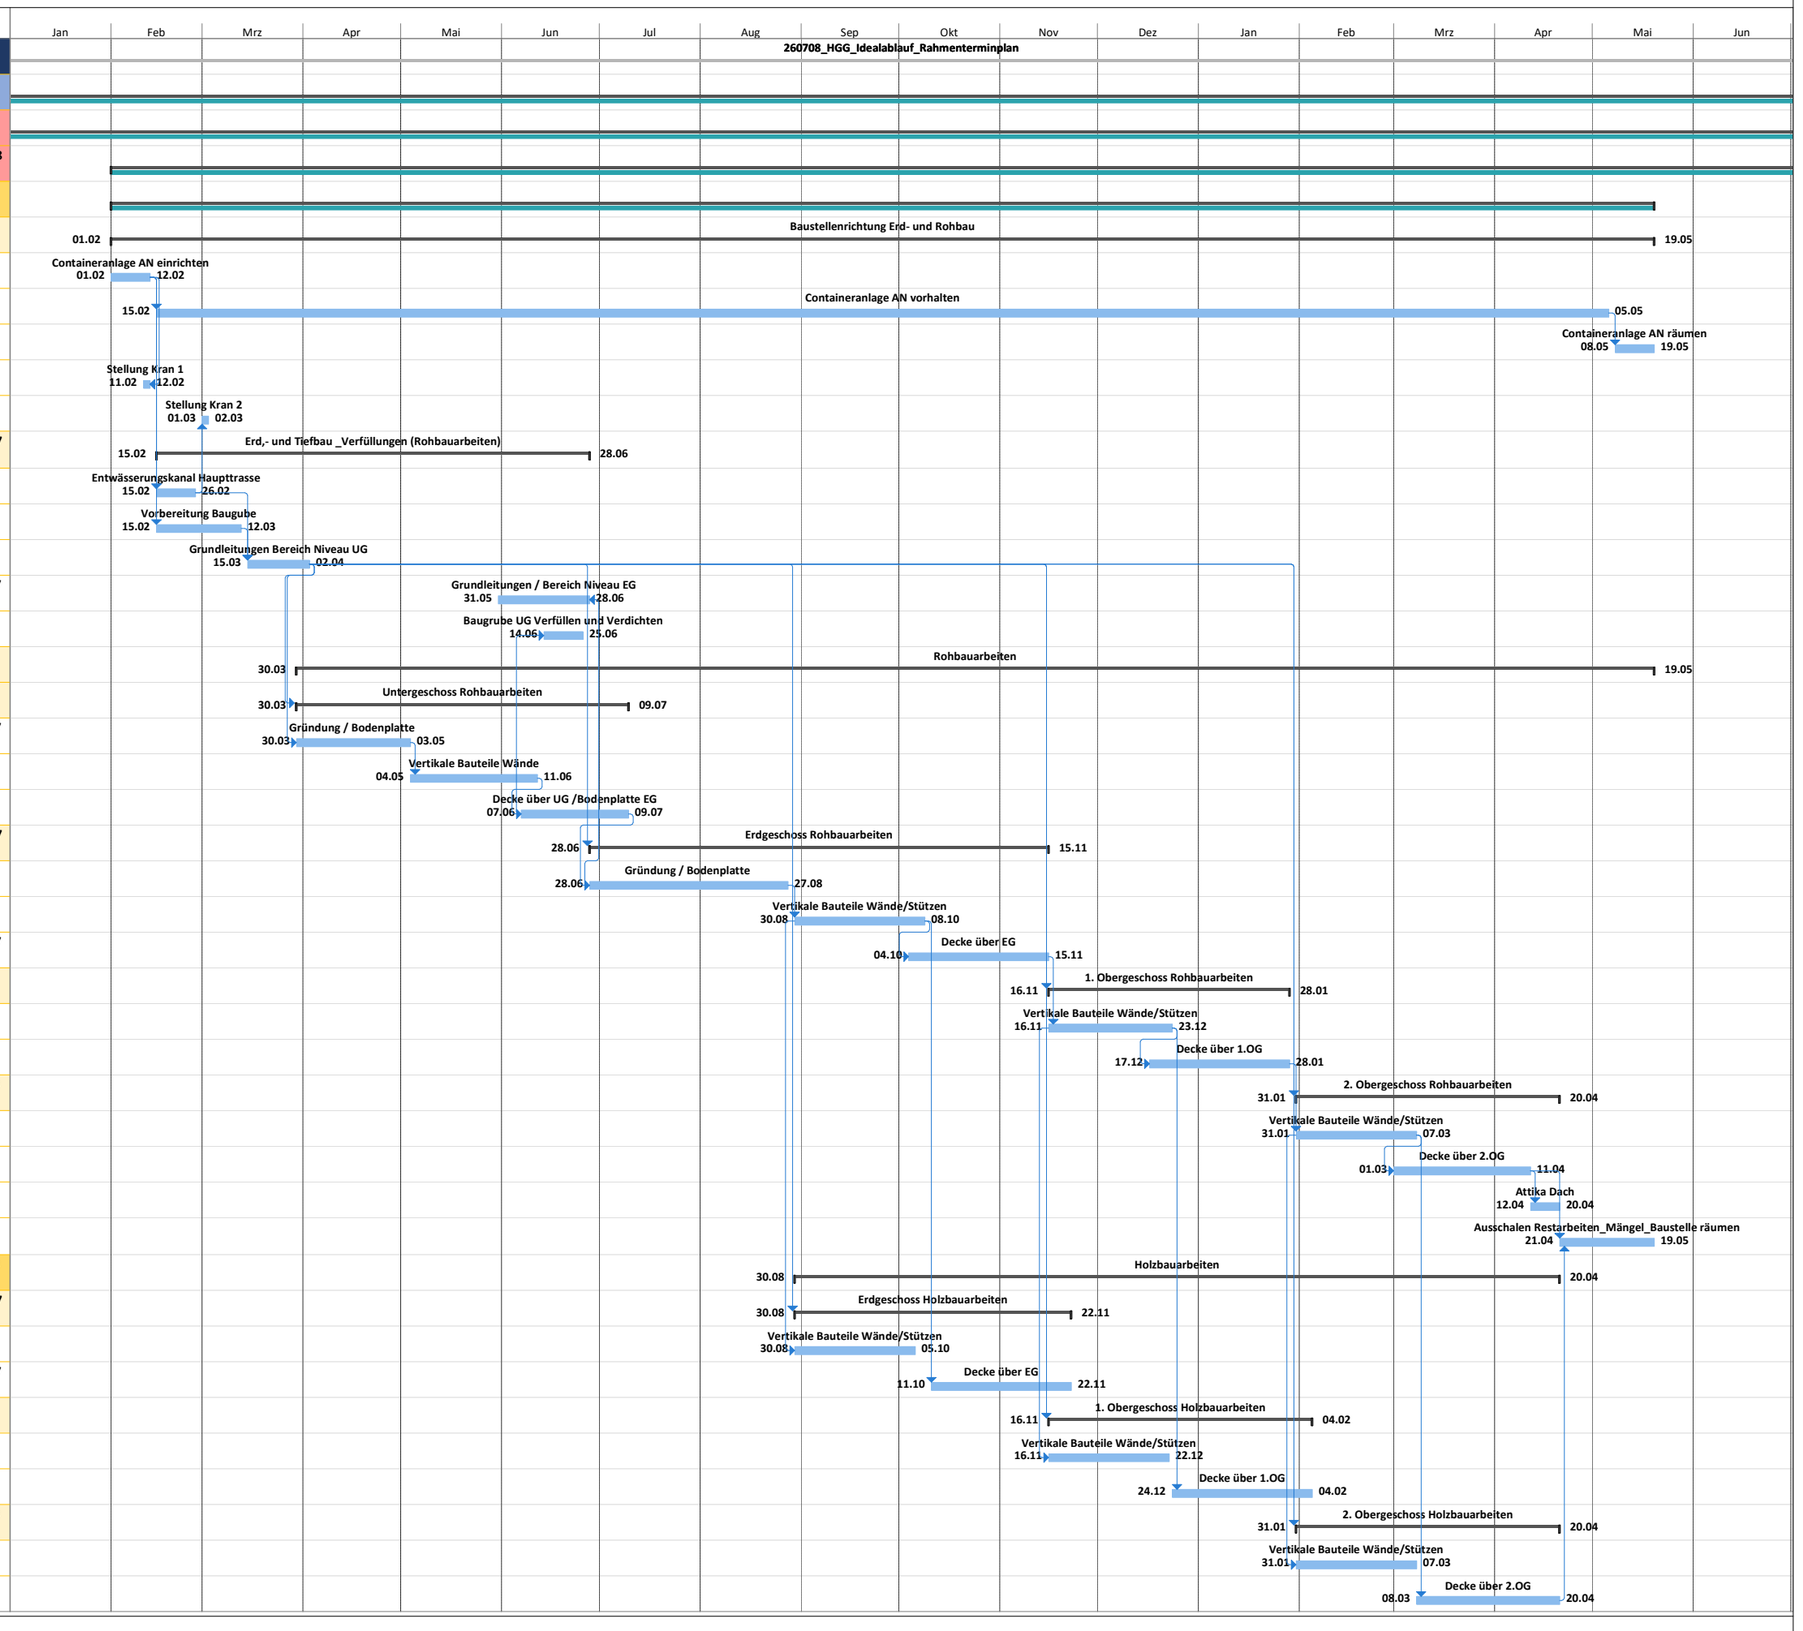Nr.	Gewerk	Firma	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
0			**260708_HGG_Idealablauf_Rahmenterminplan**	**1382 Tage?**	**Mit 24.07.24**	**Mon 07.01.30**
3			**Leistungsphase 8**	**976 Tage?**	**Die 23.12.25**	**Die 30.10.29**
15			**Ersatzneubau**	**760 Tage?**	**Mon 19.10.26**	**Fre 12.10.29**
28			**"HÜLLE DICHT"**	**442 Tage**	**Mon 01.02.27**	**Mon 30.10.28**
29	**Rohba**		**Erd- und Rohbauarbeiten**	**330 Tage**	**Mon 01.02.27**	**Fre 19.05.28**
30	**Rohba**		**Baustellenrichtung Erd- und Rohbau**	**330 Tage**	**Mon 01.02.27**	**Fre 19.05.28**
31	Rohba		Containeranlage AN einrichten	10 Tage	Mon 01.02.27	Fre 12.02.27
32	Rohba		Containeranlage AN vorhalten	310 Tage	Mon 15.02.27	Fre 05.05.28
33	Rohba		Containeranlage AN räumen	10 Tage	Mon 08.05.28	Fre 19.05.28
34	Rohba		Stellung Kran 1	2 Tage	Don 11.02.27	Fre 12.02.27
35	Rohba		Stellung Kran 2	2 Tage	Mon 01.03.27	Die 02.03.27
36	**Rohba**		**Erd,- und Tiefbau _Verfüllungen (Rohbauarbeiten)**	**90 Tage**	**Mon 15.02.27**	**Mon 28.06.27**
37	Rohba		Entwässerungskanal Haupttrasse	10 Tage	Mon 15.02.27	Fre 26.02.27
38	Rohba		Vorbereitung Baugube	20 Tage	Mon 15.02.27	Fre 12.03.27
39	Rohba		Grundleitungen Bereich Niveau UG	13 Tage	Mon 15.03.27	Fre 02.04.27
40	Rohba		Grundleitungen / Bereich Niveau EG	20 Tage	Mon 31.05.27	Mon 28.06.27
41	Rohba		Baugrube UG Verfüllen und Verdichten	10 Tage	Mon 14.06.27	Fre 25.06.27
42	**Rohba**		**Rohbauarbeiten**	**291 Tage**	**Die 30.03.27**	**Fre 19.05.28**
43	**Rohba**		**Untergeschoss Rohbauarbeiten**	**71 Tage**	**Die 30.03.27**	**Fre 09.07.27**
44	Rohba		Gründung / Bodenplatte	25 Tage	Die 30.03.27	Mon 03.05.27
45	Rohba		Vertikale Bauteile Wände	26 Tage	Die 04.05.27	Fre 11.06.27
46	Rohba		Decke über UG /Bodenplatte EG	25 Tage	Mon 07.06.27	Fre 09.07.27
47	**Rohba**		**Erdgeschoss Rohbauarbeiten**	**100 Tage**	**Mon 28.06.27**	**Mon 15.11.27**
48	Rohba		Gründung / Bodenplatte	45 Tage	Mon 28.06.27	Fre 27.08.27
49	Rohba		Vertikale Bauteile Wände/Stützen	30 Tage	Mon 30.08.27	Fre 08.10.27
50	Rohba		Decke über EG	30 Tage	Mon 04.10.27	Mon 15.11.27
51	**Rohba**		**1. Obergeschoss Rohbauarbeiten**	**53 Tage**	**Die 16.11.27**	**Fre 28.01.28**
52	Rohba		Vertikale Bauteile Wände/Stützen	28 Tage	Die 16.11.27	Don 23.12.27
53	Rohba		Decke über 1.OG	30 Tage	Fre 17.12.27	Fre 28.01.28
54	**Rohba**		**2. Obergeschoss Rohbauarbeiten**	**57 Tage**	**Mon 31.01.28**	**Don 20.04.28**
55	Rohba		Vertikale Bauteile Wände/Stützen	27 Tage	Mon 31.01.28	Die 07.03.28
56	Rohba		Decke über 2.OG	30 Tage	Mit 01.03.28	Die 11.04.28
57	Rohba		Attika Dach	5 Tage	Mit 12.04.28	Don 20.04.28
58	Rohba		Ausschalen Restarbeiten_Mängel_Baustelle	20 Tage	Fre 21.04.28	Fre 19.05.28
59	**Rohba**		**Holzbauarbeiten**	**165 Tage**	**Mon 30.08.27**	**Don 20.04.28**
60	**Rohba**		**Erdgeschoss Holzbauarbeiten**	**60 Tage**	**Mon 30.08.27**	**Mon 22.11.27**
61	Rohba		Vertikale Bauteile Wände/Stützen	27 Tage	Mon 30.08.27	Die 05.10.27
62	Rohba		Decke über EG	30 Tage	Mon 11.10.27	Mon 22.11.27
63	**Rohba**		**1. Obergeschoss Holzbauarbeiten**	**58 Tage**	**Die 16.11.27**	**Fre 04.02.28**
64	Rohba		Vertikale Bauteile Wände/Stützen	27 Tage	Die 16.11.27	Mit 22.12.27
65	Rohba		Decke über 1.OG	30 Tage	Fre 24.12.27	Fre 04.02.28
66	**Rohba**		**2. Obergeschoss Holzbauarbeiten**	**57 Tage**	**Mon 31.01.28**	**Don 20.04.28**
67	Rohba		Vertikale Bauteile Wände/Stützen	27 Tage	Mon 31.01.28	Die 07.03.28
68	Rohba		Decke über 2.OG	30 Tage	Mit 08.03.28	Don 20.04.28
