
Ausführungsterminplan
KEV - NB Klärschlammtrocknung und Pyrolyse Buchloe
25 047

Nr	Name	Anfang	Ende	Dauer(AT)
1				
2	KEV Schwaben, Buchloe - Neubau Klärschlammtrocknung und Pyrolyse mit Verwaltungsgebäude			
3				
6	Rohbauarbeiten	Mo, 24.08.26	Fr, 18.12.26	85 Tage
6.1	Baubeginn	Mo, 24.08.26	Mo, 24.08.26	
6.2	Ortbetonarbeiten Aufgabebunker	Mo, 24.08.26	Fr, 04.09.26	10 Tage
6.3	Erdungsanlage	Mo, 24.08.26	Fr, 25.09.26	25 Tage
6.4	Fundamente herstellen Produktionshalle	Mo, 07.09.26	Fr, 25.09.26	15 Tage
6.5	Beginn Verdichten und Aufschüttung Rampe	Mo, 14.09.26	Mo, 14.09.26	
6.6	Kanal und Elektro Leerrohre verlegen	Mo, 14.09.26	Fr, 16.10.26	25 Tage
6.7	Fundamente herstellen Aufgabehalle	Mo, 28.09.26	Fr, 09.10.26	10 Tage
6.8	Fundamente herstellen nach Ziehen der Spundwände	Mo, 12.10.26	Fr, 16.10.26	5 Tage
6.9	Montage Fertigteile Halle	Mo, 19.10.26	Fr, 06.11.26	15 Tage
6.10	Stützwände Aufgabebunker	Mo, 19.10.26	Fr, 30.10.26	10 Tage
6.11	Schornsteinfundamente	Mo, 26.10.26	Fr, 30.10.26	5 Tage
6.12	Auffüllen Rampe Aufgabebunker	Mo, 02.11.26	Fr, 06.11.26	5 Tage
6.13	Bodenplatten/Decke in der Halle	Mo, 02.11.26	Fr, 18.12.26	35 Tage
7	Zimmererarbeiten	Mo, 02.11.26	Fr, 20.11.26	15 Tage
8	Dach- und Fassadenarbeiten	Mo, 16.11.26	Fr, 22.01.27	35 Tage
9	Kranbahn / Brückenkran	Mo, 14.12.26	Fr, 18.12.26	5 Tage
10	Montage Schornsteine	Mo, 11.01.27	Fr, 22.01.27	10 Tage
11	Montage Gastank	Mo, 11.01.27	Fr, 15.01.27	5 Tage
12	Holzbau Pelletsbunker	Mo, 11.01.27	Fr, 15.01.27	5 Tage
13	Gastankeinhausung	Mo, 18.01.27	Fr, 29.01.27	10 Tage
14	Schlosserarbeiten Halle	Mo, 11.01.27	Fr, 12.02.27	25 Tage
15	Fenster	Mo, 01.02.27	Fr, 19.02.27	15 Tage
16	Türen und Tore	Mo, 01.02.27	Fr, 19.02.27	15 Tage
17	Fertigstellung Rohbauarbeiten / Halle dicht	Fr, 19.02.27	Fr, 19.02.27	
18	Lieferung Bürocontainer	Mo, 22.02.27	Mo, 22.02.27	
19	PV-Anlage	Mo, 22.02.27	Fr, 12.03.27	15 Tage
20	Aussenanlagen	Mo, 22.02.27	So, 14.03.27	15 Tage
21	Druckleitung inkl. Spülbohrung	Mo, 29.03.27	Fr, 28.05.27	41 Tage
22	Schlosserarbeiten Aufgabebunker nach Anlagenmontage	Mo, 22.03.27	Di, 20.04.27	20 Tage
23				
25				
26	Beginn Anlagentechnik	Mo, 22.02.27	Fr, 30.07.27	110 Tage
26.1	Aufbau KTK-Anlage	Mo, 22.02.27	Fr, 30.07.27	110 Tage
26.2	Aufbau Pyrolyse	Mo, 14.06.27	Fr, 30.07.27	35 Tage
27				

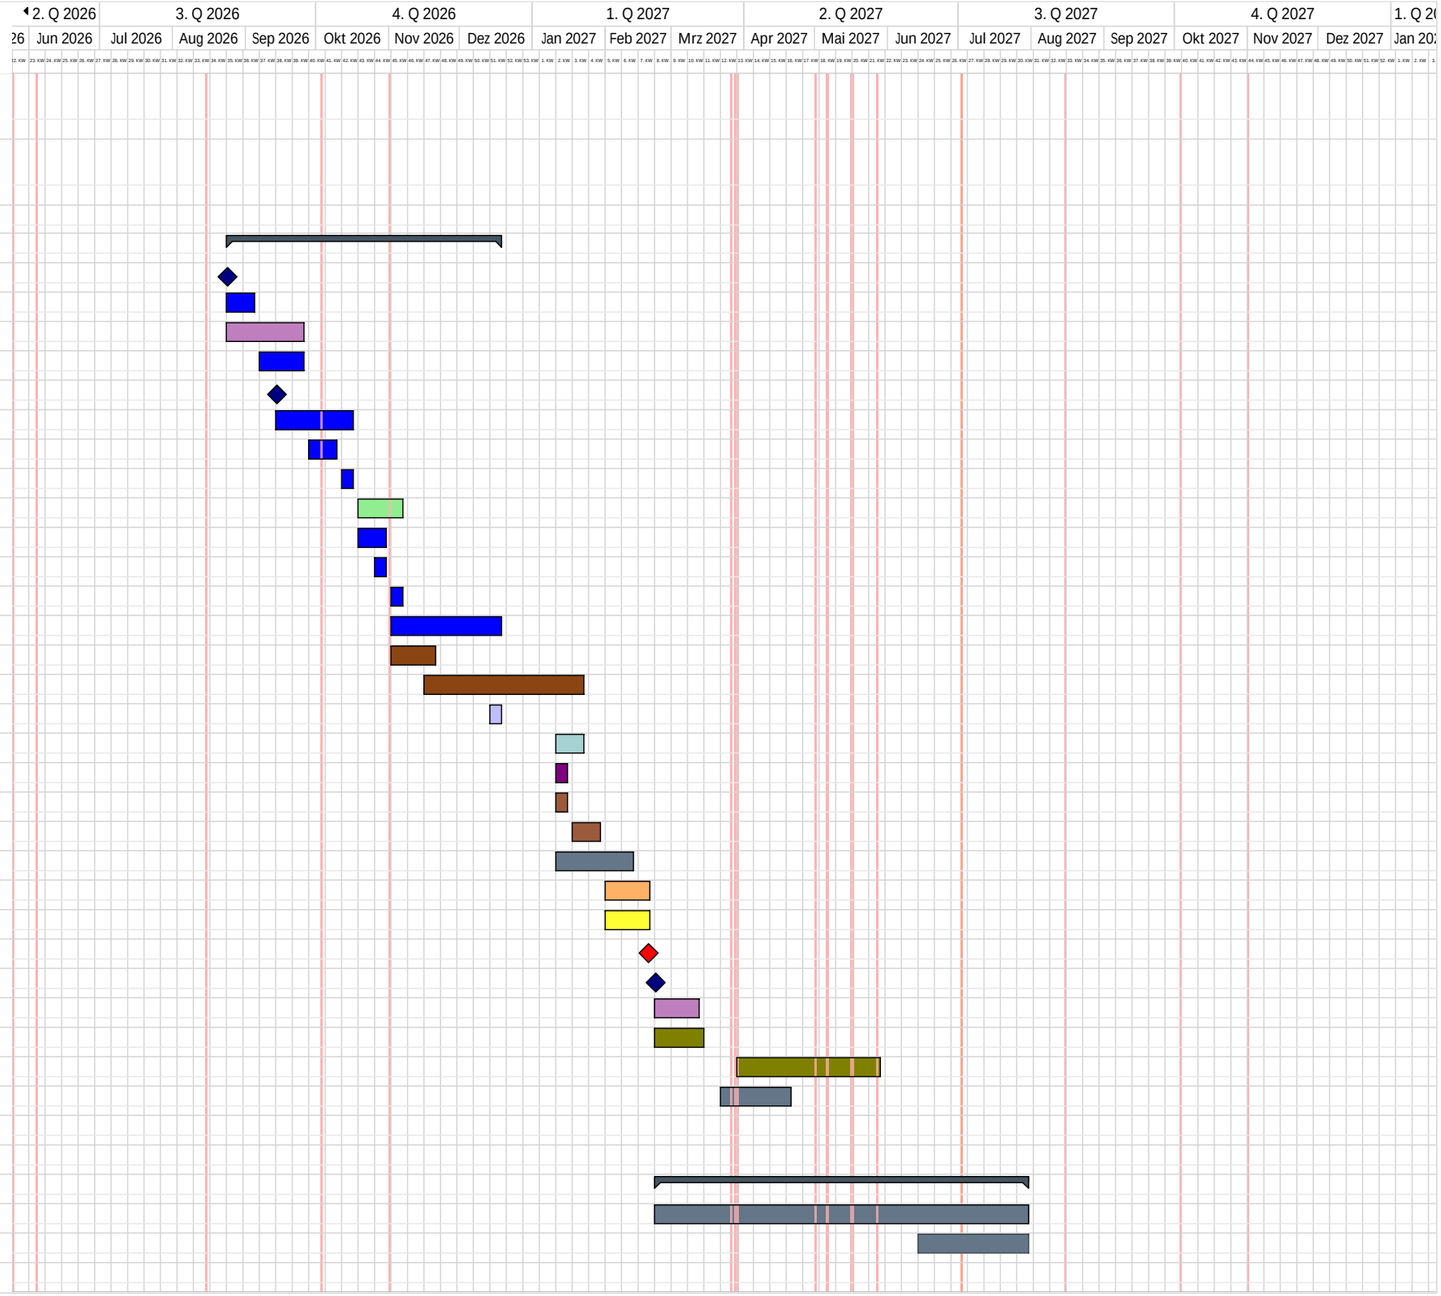

Schuster engineering GmbH
Architekten und Ingenieure
Krumbacher Straße 34
86746 Neuburg an der Kammel
