Projektnummer:

Bauzeitenplan

Dornstetten Heizzentrale

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Montagebeginn Übergabestationen	233at	Mo, 23.03.26	Di, 23.02.27
2	Räumung Baufeld	9at	Di, 24.03.26	Di, 07.04.26
3	Erhalt der Baugenehmigung	5at	Di, 31.03.26	Mi, 08.04.26
4	Stellung Bauzaun	4at	Di, 07.04.26	Fr, 10.04.26
5	Erdarbeiten	18at	Di, 07.04.26	Do, 30.04.26
6	Rohbauarbeiten	62at	Di, 05.05.26	Mo, 03.08.26
7	Fundamenterder	22at	Mo, 11.05.26	Fr, 12.06.26
8	Auffüllung Baugrube (Erdbau)	10at	Mo, 22.06.26	Fr, 03.07.26
9	Fundament Wärmespeicher	15at	Mo, 13.07.26	Fr, 31.07.26
10	Erschließung Wärme, Wasser, Gas	15at	Mo, 03.08.26	Fr, 21.08.26
11	Einbringung Holzkessel / Step 1 AGRO	20at	Mo, 27.07.26	Fr, 21.08.26
12	Schlosserarbeiten Step 1	10at	Do, 20.08.26	Mi, 02.09.26
13	Gerüst- und Sicherungsarbeiten	5at	Mo, 24.08.26	Fr, 28.08.26
14	Montage Wärmespeicher / Hans-Van-Bebber	10at	Mo, 17.08.26	Fr, 28.08.26
15	Befüllung Wärmespeicher	33at	Di, 08.09.26	Do, 22.10.26
16	Wärmedämmung Wärmespeicher	10at	Mo, 26.10.26	Fr, 06.11.26
17	Ausbetonieren Querförderung	10at	Mo, 24.08.26	Fr, 04.09.26
18	Aufbetonieren Holzsilo	5at	Mo, 24.08.26	Fr, 28.08.26
19	Holzbau	15at	Mo, 24.08.26	Fr, 11.09.26
20	Einbringung Zusatzkessel, BHKW	5at	Mo, 31.08.26	Fr, 04.09.26
21	Fassadenarbeiten	35at	Mo, 14.09.26	Fr, 30.10.26
22	Einnetzen (Trapezblechbauer)	3at	Mi, 16.09.26	Fr, 18.09.26
23	Trapezblech	5at	Mo, 21.09.26	Fr, 25.09.26
24	Aufbau Heizungstechnik (Lamparth)	145at	Mo, 21.09.26	Fr, 16.04.27
25	Montage Heizungstechnik	107at	Mo, 07.09.26	Fr, 05.02.27
26	Rohrleitungsmontage / Netz / Wärmespeicher	20at	Mo, 07.09.26	Fr, 02.10.26
27	Einbindung BHKW Zusatzkessel	24at	Mo, 05.10.26	Do, 05.11.26
28	Einbindung Holzkessel	52at	Mo, 09.11.26	Fr, 22.01.27
29	Einbringung Schaltanlage, Rauchrohre / Step 2 / AGRO	10at	Mo, 05.10.26	Fr, 16.10.26
30	Dachabdichtung	15at	Mo, 28.09.26	Fr, 16.10.26
31	Schlosserarbeiten Step 2	10at	Mo, 28.09.26	Fr, 09.10.26
32	Verglasung	10at	Mo, 05.10.26	Fr, 16.10.26
33	Attikablech Dachentwässerung	10at	Mo, 12.10.26	Fr, 23.10.26
34	Außentüren und Tore	8at	Mi, 14.10.26	Fr, 23.10.26
35	Montage Schornsteinanlage	10at	Mo, 19.10.26	Fr, 30.10.26
36	Montage PV-Dachanlage	15at	Mo, 26.10.26	Fr, 13.11.26
37	Blitzschutz	10at	Mo, 26.10.26	Fr, 06.11.26
38	Elektroarbeiten	57at	Mo, 12.10.26	Mi, 30.12.26
39	Installation NSHV	15at	Mo, 26.10.26	Fr, 13.11.26
40	Lieferung u. Montage Trafostation	5at	Mo, 02.11.26	Fr, 06.11.26
41	Einbringung u. Montage Erdtank	5at	Mo, 02.11.26	Fr, 06.11.26
42	Regelungstechnik Step 1 IB 1	10at	Mo, 09.11.26	Fr, 20.11.26
43	Inbetriebnahme Zusatzkessel / BHKW / Wärmespeicher / Netzpumpen	5at	Mo, 16.11.26	Fr, 20.11.26
44	Technische Wärmedämmung	42at	Mo, 23.11.26	Fr, 22.01.27
45	Inbetriebnahme Holzkessel AGRO	10at	Mo, 25.01.27	Fr, 05.02.27
46	Regelungstechnik Step 2	10at	Mo, 25.01.27	Fr, 05.02.27
47	Montage u. Einbindung Tischkühler	10at	Do, 28.01.27	Mi, 10.02.27
48	Einbindung Wärmepumpe	20at	Mi, 10.02.27	Di, 09.03.27
49	Inbetriebnahme Wärmepumpe	5at	Di, 09.03.27	Mo, 15.03.27
50	Außenanlagen	105at	Mo, 16.11.26	Fr, 16.04.27
51	PV- Anlage (Freifläche)	50at	Di, 16.03.27	Mo, 31.05.27
52	IB- PV Anlage (Freifläche)	5at	Di, 01.06.27	Mo, 07.06.27

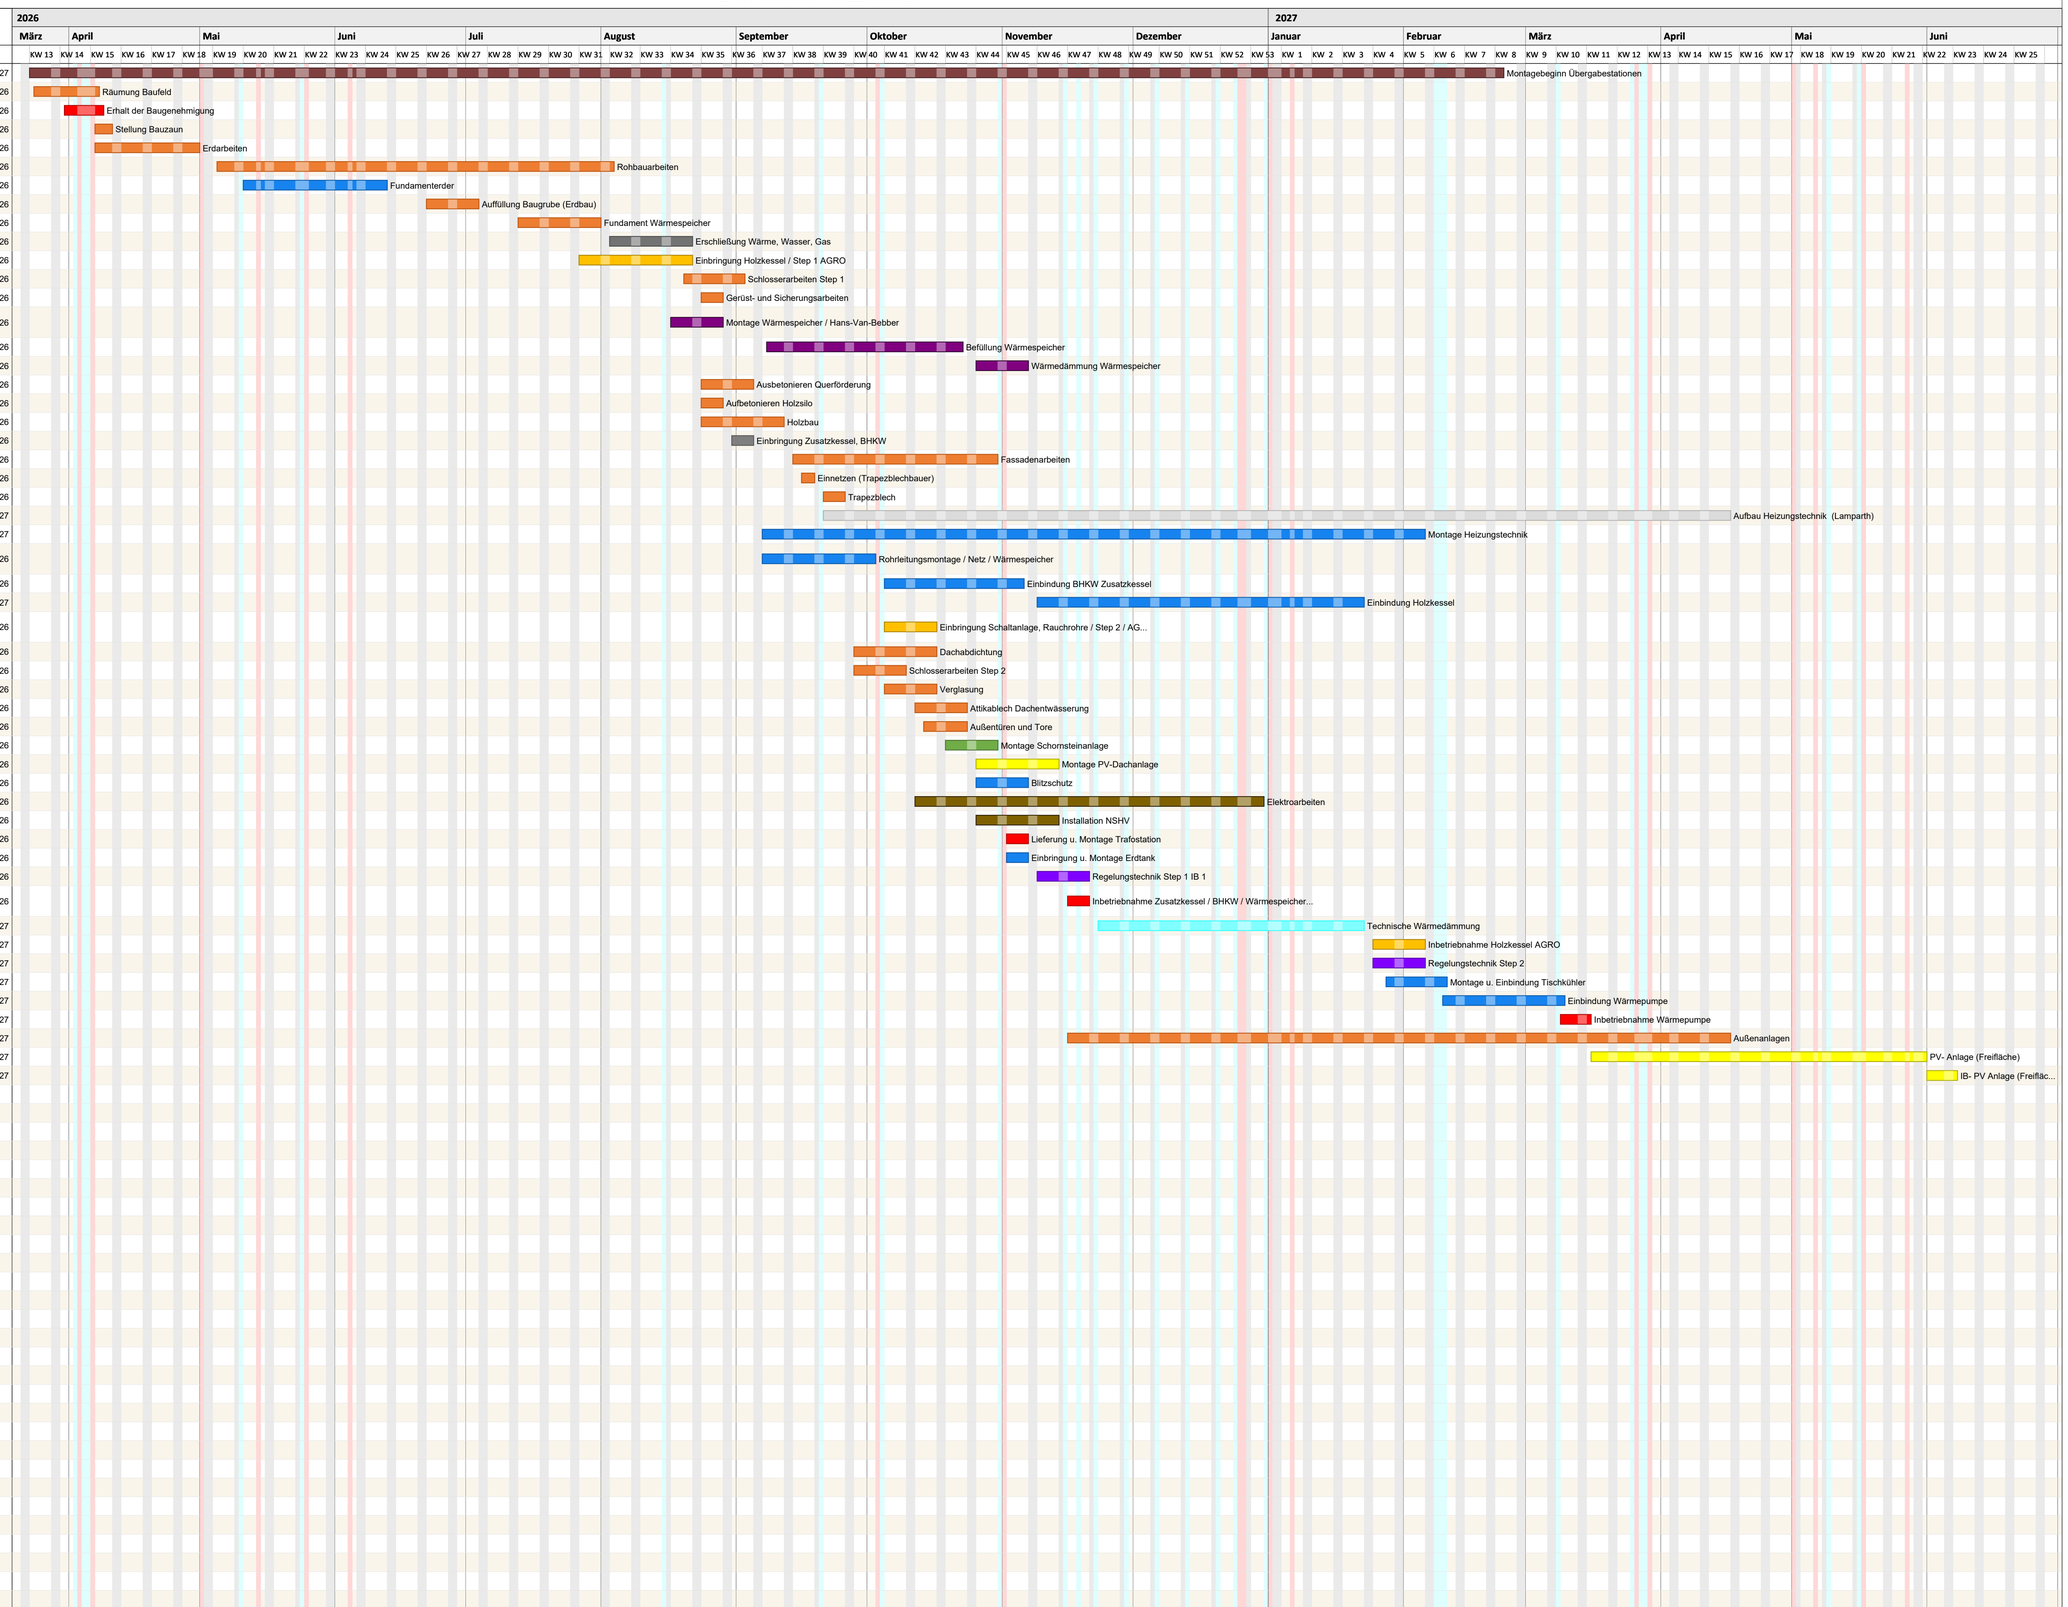

IBS INGENIEURGESELLSCHAFT
Flößerstr. 60/3
Bietigheim-Bissingen
Tel. +49 7142 936361
Fax +49 7142 936350
e-Mail: kontakt@ibs-ing.com

erstellt mit ProjectLibre 1.9.8.1 (64 bit) - licence No. (IN-24-1-0-0-0
