PFI

Kläranlage Rendsburg

Erneuerung der Schlammentwässerung
Neubau Klärschlammbehandlung

Abwasser Rendsburg

Nr.	Vorgangsmodus	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger
1		**Neubau Klärschlammbehandlung**	**376 Tage**	**Sam 01.11.25**	**Fre 23.04.27**		
2		**LP 4**	4 Monate	Sam 01.11.25	Don 05.03.26		
3		**LP 5/6 Vakuumentgasung**	9 Wochen	Mon 23.03.26	Fre 22.05.26		4;5
4		**LP 5/6 IB, VMA, VMA_Fällmittel, EMSR**	9 Wochen	Mon 25.05.26	Fre 24.07.26	3	6
5		Angebotsphase Vakuumentgasung	2 Wochen	Mon 25.05.26	Fre 05.06.26	3	7
6		Angebotsphase IB, VMA, VMA_Fällmittel, EMSR	8 Wochen	Mon 27.07.26	Fre 18.09.26	4	8
7		**LP 7 Vakuumentgasung**	2 Wochen	Mon 08.06.26	Fre 19.06.26	5	11
8		**LP 7 IB, VMA, VMA_Fällmittel, EMSR**	4 Wochen	Mon 21.09.26	Fre 16.10.26	6	10
9		**LP 8**	**220 Tage**	**Mon 22.06.26**	**Fre 23.04.27**		
10		Technische Klärung (Werklplanungen)	8 Wochen	Mon 19.10.26	Fre 11.12.26	8	12
11		Lieferzeit (Vakuumentgasung)	9 Monate	Mon 22.06.26	Fre 26.02.27	7	26
12		Baustellen Einrichtung	1 Woche	Mon 14.12.26	Fre 18.12.26	10	20EA+2 Wochen;14E
13		**Bauzeit IB**	**70 Tage**	**Mon 04.01.27**	**Fre 09.04.27**		
14		Erdarbeiten	4 Wochen	Mon 04.01.27	Fre 29.01.27	12EA+2 Wochen	15;17
15		Stahlbetonarbeiten, Fundamente, Fällmittelplatz	4 Wochen	Mon 01.02.27	Fre 26.02.27	14	23;16;18;29
16		Bauarbeiten Schaltanlagenraum	2 Wochen	Mon 01.03.27	Fre 12.03.27	15	
17		Faulschlammbehälter	6 Wochen	Mon 01.02.27	Fre 12.03.27	14	24
18		Erdverlegte Rohrleitungen	6 Wochen	Mon 01.03.27	Fre 09.04.27	15	
19		**Bauzeit VMA I - Technische Ausrüstung**	**60 Tage**	**Mon 04.01.27**	**Fre 26.03.27**		
20		Anpasungsarbeiten Schlammtasche	5 Tage	Mon 04.01.27	Fre 08.01.27	12EA+2 Wochen	21
21		Schlammleitungen Edelstahl	1 Monat	Mon 11.01.27	Fre 05.02.27	20	22
22		Faulschlammpumpwerk	1 Monat	Mon 08.02.27	Fre 05.03.27	21	
23		Vorlagebehälter Vakuumentgasung	2 Wochen	Mon 01.03.27	Fre 12.03.27	15	
24		Schlosserarbeiten Faulschlammbehälter	2 Wochen	Mon 15.03.27	Fre 26.03.27	17	
25		**Bauzeit VMA II - Vakuumentgaung**	**10 Tage**	**Mon 01.03.27**	**Fre 12.03.27**		
26		Errichtung des Containers auf Fundament	5 Tage	Mon 01.03.27	Fre 05.03.27	11	27
27		Kaltinbetriebnahme	5 Tage	Mon 08.03.27	Fre 12.03.27	26	35EA+2 Wochen
28		**Bauzeit VMA III- Fällmittel**	**40 Tage**	**Mon 01.03.27**	**Fre 23.04.27**		
29		Lagertank, Dosierstation	1 Monat	Mon 01.03.27	Fre 26.03.27	15	30
30		Rohrleitungen	1 Monat	Mon 29.03.27	Fre 23.04.27	29	
31		**Bauzeit EMSR**	**85 Tage**	**Mon 21.12.26**	**Fre 16.04.27**		
32		Anpassungen Schaltanlagenraum	4 Wochen	Mon 21.12.26	Fre 15.01.27	12	33
33		Verkabelungsarbeiten	7 Wochen	Mon 18.01.27	Fre 05.03.27	32	34
34		Software und Programierungen	6 Wochen	Mon 08.03.27	Fre 16.04.27	33	
35		**Anbindungsarbeiten Vakuumentgasung**	2 Wochen	Mon 29.03.27	Fre 09.04.27	27EA+2 Wochen	36
36		**Inbetriebnahme**	2 Wochen	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27	35	

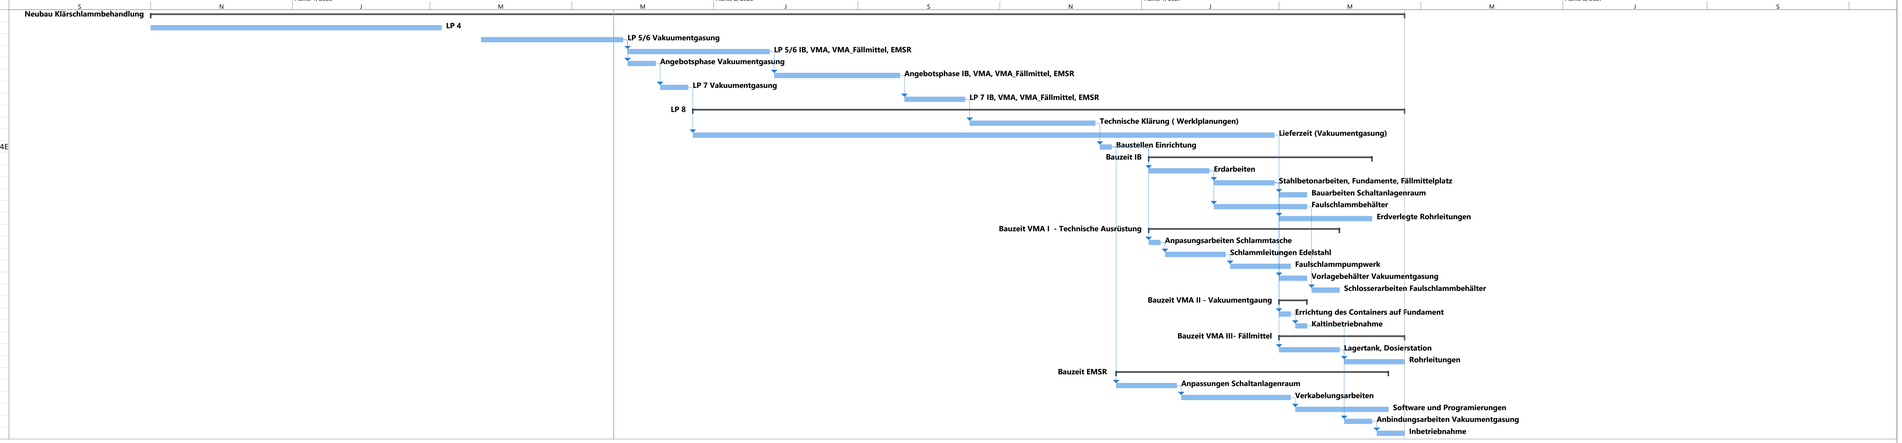

Projekt: TP2026-05-19_4
Datum: Die 19.05.26

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | Stichtag | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Sammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | In Arbeit
