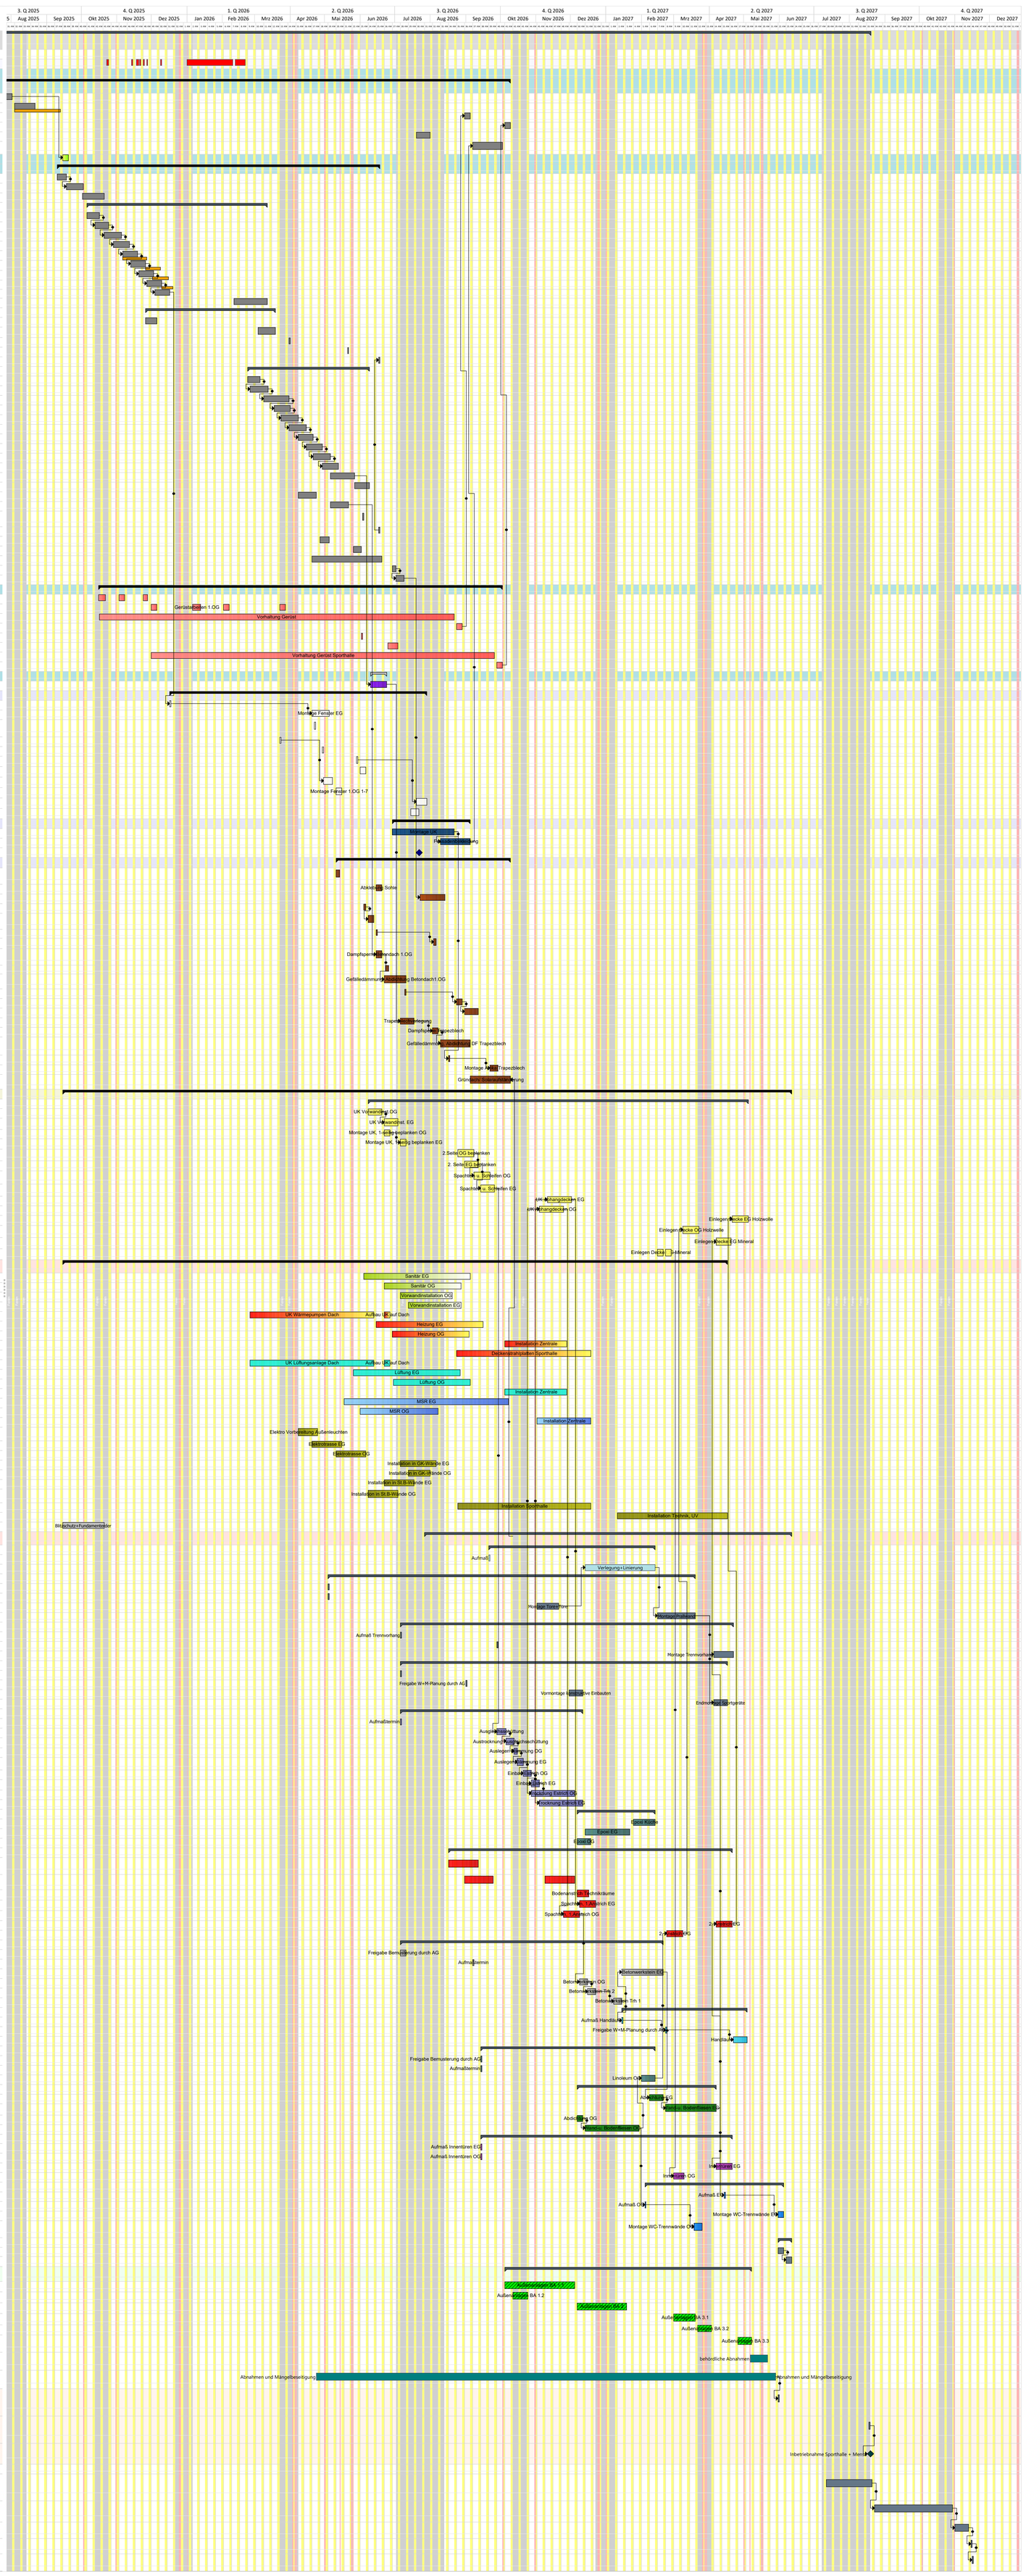Name	Anfang	Ende	Dauer(AT)
LPH 8 - Bauausführung	**Mo, 23.06.25**	**Do, 19.08.27**	**548 Tage**
Baustart	Mo, 23.06.25	Mo, 23.06.25	
KEINE BAUTÄTIGKEIT	**Do, 23.10.25**	**Fr, 20.02.26**	**43 Tage**
BE	**Mo, 23.06.25**	**Fr, 27.06.25**	**5 Tage**
ERDBAU / GRUNDLEITUNGEN	**Mo, 30.06.25**	**Fr, 09.10.26**	**325 Tage**
Bodenaushub	Mo, 30.06.25	Fr, 01.08.25	25 Tage
Grundleitungen	Mo, 04.08.25	Do, 21.08.25	14 Tage
Grundleitungen Nord/ West	Mo, 31.08.26	Fr, 04.09.26	5 Tage
Grundleitungen Süd/ West	Mo, 05.10.26	Fr, 09.10.26	5 Tage
Grundleitungen Zufahrt	Mo, 20.07.26	Fr, 31.07.26	10 Tage
Grundleitungen Ostseite, Rigole	Mo, 07.09.26	Fr, 02.10.26	20 Tage
ERDUNG	**Mo, 15.09.25**	**Fr, 19.09.25**	**5 Tage**
ROHBAU	**Mi, 10.09.25**	**Mi, 17.06.26**	**191 Tage**
Streifenfundamente	Mi, 10.09.25	Mi, 17.09.25	6 Tage
SBK, Sohle T1	Do, 18.09.25	Do, 02.10.25	11 Tage
Sohle T2	Do, 02.10.25	Mo, 20.10.25	12 Tage
Wände EG	Mo, 06.10.25	Mi, 11.03.26	109 Tage
Wände EG-Takt 1	Mo, 06.10.25	Do, 16.10.25	9 Tage
Wände EG-Takt 2	Mo, 13.10.25	Fr, 24.10.25	10 Tage
Wände EG-Takt 3	Di, 21.10.25	Di, 04.11.25	10 Tage
Wände EG-Takt 4	Mi, 29.10.25	Di, 11.11.25	9 Tage
Wände EG-Takt 5	Do, 06.11.25	Di, 18.11.25	9 Tage
Wände EG-Takt 6	Do, 13.11.25	Di, 25.11.25	9 Tage
Wände EG-Takt 7	Do, 20.11.25	Di, 02.12.25	9 Tage
Wände EG-Takt 8	Do, 27.11.25	Di, 09.12.25	9 Tage
Wände EG-Takt 9	Do, 04.12.25	Di, 16.12.25	9 Tage
Wände EG Sporthalle	Mi, 11.02.26	Mi, 11.03.26	21 Tage
Decke EG	Mi, 26.11.25	Mi, 18.03.26	78 Tage
Decke EG Achse 5-15	Mi, 26.11.25	Fr, 05.12.25	8 Tage
Decke EG Achse 1-5	Mi, 04.03.26	Mi, 18.03.26	11 Tage
Stützenfrei EG (Nur Notstützen)	Di, 31.03.26	Di, 31.03.26	1 Tag
Stützenfrei EG Achse 7-15	Do, 21.05.26	Do, 21.05.26	1 Tag
Stützenfrei EG Achse 1-7	Mi, 17.06.26	Mi, 17.06.26	1 Tag
Wände OG	Mo, 23.02.26	Mo, 08.06.26	71 Tage
Wände OG-Takt 1	Mo, 23.02.26	Do, 05.03.26	9 Tage
Wände OG-Takt 2	Mi, 25.02.26	Do, 12.03.26	12 Tage
Wände OG-Takt 3	Mo, 09.03.26	Mo, 30.03.26	16 Tage
Wände OG-Takt 4	Mi, 18.03.26	Di, 31.03.26	10 Tage
Wände OG-Takt 5	Di, 24.03.26	Di, 07.04.26	9 Tage
Wände OG-Takt 6	Di, 31.03.26	Di, 14.04.26	9 Tage
Wände OG-Takt 7	Mi, 08.04.26	Mo, 20.04.26	9 Tage
Wände OG-Takt 8	Mi, 15.04.26	Di, 28.04.26	10 Tage
Wände OG-Takt 9	Di, 21.04.26	Di, 05.05.26	10 Tage
Wände OG-Takt 10	Mi, 29.04.26	Di, 12.05.26	9 Tage
Wände OG-Takt 11	Mi, 06.05.26	Di, 26.05.26	13 Tage
Wände OG-Takt 12	Mi, 27.05.26	Mo, 08.06.26	9 Tage
Decke OG Achse 7-15	Mi, 08.04.26	Do, 23.04.26	12 Tage
Decke OG Achse 1-7	Mi, 06.05.26	Do, 21.05.26	11 Tage
Stützenfrei OG (Nur Notstützen)	Mi, 03.06.26	Mi, 03.06.26	1 Tag
Stützenfrei OG	Mi, 17.06.26	Mi, 17.06.26	1 Tag
Attika Achse 7-15	Mo, 27.04.26	Mo, 04.05.26	5 Tage
Attika Achse 7-15	Di, 26.05.26	Mo, 01.06.26	5 Tage
Verblender	Mo, 20.04.26	Fr, 19.06.26	42 Tage
Rückbau Kran	Mo, 29.06.26	Mi, 01.07.26	3 Tage
Sohlaussparung schließen	Do, 02.07.26	Mi, 08.07.26	5 Tage
GERÜSTARBEITEN	**Do, 16.10.25**	**Fr, 02.10.26**	**243 Tage**
Gerüstarbeiten EG	Do, 16.10.25	Do, 27.11.25	13 Tage
Gerüstarbeiten 1.OG	Mo, 01.12.25	Fr, 27.03.26	20 Tage
Vorhaltung Gerüst	Fr, 17.10.25	Fr, 21.08.26	212 Tage
Gerüstabbau o. Sporthalle	Mo, 24.08.26	Fr, 28.08.26	5 Tage
Gerüstumbau Anbau	Di, 02.06.26	Di, 02.06.26	1 Tag
Sicherheitsschutznetze	Do, 25.06.26	Fr, 03.07.26	7 Tage
Vorhaltung Gerüst Sporthalle	Mo, 01.12.25	Fr, 25.09.26	207 Tage
Gerüstabbau Sporthalle	Mo, 28.09.26	Fr, 02.10.26	5 Tage
ZIMMERER	**Mi, 10.06.26**	**Di, 23.06.26**	**10 Tage**
Auflegen der Binder	Mi, 10.06.26	Di, 23.06.26	10 Tage
FENSTER	**Mi, 17.12.25**	**Di, 28.07.26**	**152 Tage**
Aufmaß Fenster EG	Mi, 17.12.25	Mi, 17.12.25	1 Tag
Montage Fenster EG	Mo, 20.04.26	Mo, 04.05.26	10 Tage
Aufmaß AL-Innentüren EG+OG	Mi, 22.04.26	Mi, 22.04.26	1 Tag
Aufmaß Fenster 1.OG 7-15	Mo, 23.03.26	Mo, 23.03.26	1 Tag
Aufmaß Fenster 1.OG 1-7	Mi, 29.04.26	Mi, 29.04.26	1 Tag
Aufmaß Fenster Sporthalle	Fr, 29.05.26	Fr, 29.05.26	1 Tag
Montage F30-Fenster	Mo, 01.06.26	Fr, 05.06.26	5 Tage
Montage Fenster 1.OG 7-15	Do, 30.04.26	Do, 07.05.26	5 Tage
Montage Fenster 1.OG 1-7	Mo, 11.05.26	Fr, 15.05.26	4 Tage
Montage Fenster Sporthalle	Mo, 20.07.26	Di, 28.07.26	7 Tage
Montage AL-Innentüren	Mi, 15.07.26	Di, 21.07.26	5 Tage
VHF	**Mo, 29.06.26**	**Fr, 04.09.26**	**50 Tage**
Montage UK	Mo, 29.06.26	Fr, 21.08.26	40 Tage
Fassadenbekleidung	Mo, 10.08.26	Fr, 04.09.26	20 Tage
GEBÄUDEFASSADE DICHT	**Mi, 22.07.26**	**Mi, 22.07.26**	
DACHARBEITEN	**Mo, 11.05.26**	**Fr, 09.10.26**	**108 Tage**
Eindichten Fußpunkt bodentiefe Elemente	Mo, 11.05.26	Mi, 13.05.26	3 Tage
Abklebung Sohle	Mo, 15.06.26	Fr, 19.06.26	5 Tage
Abklebung Sohle Sporthalle	Do, 23.07.26	Do, 13.08.26	16 Tage
Dampfsperre Betondach EG	Do, 04.06.26	Fr, 05.06.26	2 Tage
Gefälledämmung, Abdichtung Betondach EG	Mo, 08.06.26	Fr, 12.06.26	5 Tage
Aufmaß Attika Dach EG	Mo, 15.06.26	Mo, 15.06.26	1 Tag
Montage Attika Dach EG	Di, 04.08.26	Mi, 05.08.26	2 Tage
Dampfsperre Betondach 1.OG	Mo, 15.06.26	Fr, 19.06.26	5 Tage
Einbauten Betondach	Di, 23.06.26	Do, 25.06.26	3 Tage
Gefälledämmung, Abdichtung Betondach1.OG	Mo, 22.06.26	Fr, 10.07.26	15 Tage
Aufmaß Attika Betondächer	Fr, 10.07.26	Fr, 10.07.26	1 Tag
Montage Attika Betondächer	Mo, 24.08.26	Fr, 28.08.26	5 Tage
Gründächer Betondächer	Mo, 31.08.26	Fr, 11.09.26	10 Tage
Trapezblechverlegung	Mo, 06.07.26	Fr, 17.07.26	10 Tage
Dampfsperre Trapezblech	Mo, 03.08.26	Fr, 07.08.26	5 Tage
Gefälledämmung, Abdichtung DF Trapezblech	Mo, 10.08.26	Fr, 04.09.26	20 Tage
Aufmaß Attika Trapezblech	Mo, 17.08.26	Mo, 17.08.26	1 Tag
Montage Attika Trapezblech	Di, 22.09.26	Mo, 28.09.26	5 Tage
Gründach/ Solaraufständerung	Sa, 05.09.26	Fr, 09.10.26	25 Tage
INNENAUSBAU	**Mo, 15.09.25**	**Fr, 11.06.27**	**439 Tage**
Trockenbau	**Mo, 08.06.26**	**Di, 04.05.27**	**233 Tage**
UK Vorwandinst.OG	Mo, 08.06.26	Fr, 19.06.26	10 Tage
UK Vorwandinst. EG	Mo, 22.06.26	Fr, 03.07.26	10 Tage
Montage UK, 1-seitig beplanken OG	Mo, 22.06.26	Fr, 26.06.26	5 Tage
Montage UK, 1-seitig beplanken EG	Mo, 06.07.26	Fr, 10.07.26	5 Tage
2.Seite OG beplanken	Di, 25.08.26	Mo, 07.09.26	10 Tage
2. Seite EG beplanken	Mo, 31.08.26	Fr, 11.09.26	10 Tage
Spachteln u. Schleifen OG	Di, 08.09.26	Mo, 21.09.26	10 Tage
Spachteln u. Schleifen EG	Mo, 14.09.26	Fr, 25.09.26	10 Tage
UK Abhangdecken EG	Mi, 11.11.26	Di, 01.12.26	15 Tage
UK Abhangdecken OG	Mi, 04.11.26	Di, 24.11.26	15 Tage
Einlegen Decke EG Holzwolle	Mi, 21.04.27	Di, 04.05.27	10 Tage
Einlegen Decke OG Holzwolle	Di, 09.03.27	Mo, 22.03.27	10 Tage
Einlegen Decke EG Mineral	Mi, 07.04.27	Mo, 19.04.27	9 Tage
Einlegen Decke OG Mineral	Mo, 15.02.27	Fr, 26.02.27	10 Tage
TGA Rohinstallation	**Mo, 15.09.25**	**Fr, 16.04.27**	**401 Tage**
Sanitär EG	Do, 04.06.26	Fr, 04.09.26	67 Tage
Sanitär OG	Mo, 22.06.26	Do, 27.08.26	49 Tage
Vorwandinstallation OG	Mo, 06.07.26	Mi, 19.08.26	33 Tage
Vorwandinstallation EG	Mo, 13.07.26	Do, 27.08.26	34 Tage
UK Wärmepumpen Dach	Mi, 25.02.26	Fr, 26.06.26	78 Tage
Heizung EG	Mo, 15.06.26	Di, 15.09.26	67 Tage
Heizung OG	Mo, 29.06.26	Do, 03.09.26	49 Tage
Installation Zentrale	Mo, 05.10.26	Fr, 27.11.26	40 Tage
Deckenstrahlplatten Sporthalle	Mo, 24.08.26	Fr, 18.12.26	85 Tage
UK Lüftungsanlage Dach	Mi, 25.02.26	Fr, 26.06.26	78 Tage
Lüftung EG	Di, 26.05.26	Mi, 26.08.26	67 Tage
Lüftung OG	Di, 30.06.26	Fr, 04.09.26	49 Tage
Installation Zentrale	Mo, 05.10.26	Fr, 27.11.26	40 Tage
MSR EG	Mo, 18.05.26	Mi, 07.10.26	102 Tage
MSR OG	Mo, 01.06.26	Fr, 07.08.26	50 Tage
Installation Zentrale	Mo, 02.11.26	Fr, 18.12.26	35 Tage
Elektro Vorbereitung Außenleuchten	Mi, 08.04.26	Fr, 24.04.26	13 Tage
Elektrotrasse EG	Mo, 20.04.26	Fr, 15.05.26	18 Tage
Elektrotrasse OG	Mo, 11.05.26	Fr, 05.06.26	18 Tage
Installation in GK-Wände EG	Mo, 06.07.26	Mi, 05.08.26	23 Tage
Installation in GK-Wände OG	Mo, 13.07.26	Fr, 31.07.26	15 Tage
Installation in St.B-Wände EG	Mo, 22.06.26	Fr, 17.07.26	20 Tage
Installation in St.B-Wände OG	Mo, 08.06.26	Fr, 03.07.26	20 Tage
Installation Sporthalle	Di, 25.08.26	Fr, 18.12.26	84 Tage
Installation Technik, UV	Mo, 11.01.27	Fr, 16.04.27	68 Tage
Blitzschutz+Fundamenterder	Mo, 15.09.25	Mo, 20.10.25	25 Tage
TGA Feininstallation	**Mo, 27.07.26**	**Fr, 11.06.27**	**224 Tage**
Sportboden	**Mo, 21.09.26**	**Fr, 12.02.27**	**103 Tage**
Aufmaß	Mo, 21.09.26	Mo, 21.09.26	**1 Tag**
Verlegung+Linierung	Mo, 14.12.26	Fr, 12.02.27	**43 Tage**
Prallwand	**Mo, 04.05.26**	**Fr, 19.03.27**	**226 Tage**
Aufmaß Tore+Türe	Mo, 04.05.26	Mo, 04.05.26	**1 Tag**
Aufmaß Prallwand	Mo, 04.05.26	Mo, 04.05.26	**1 Tag**
Montage Tore+Türe	Mo, 02.11.26	Fr, 20.11.26	**15 Tage**
Montage Prallwand	Mo, 15.02.27	Fr, 19.03.27	**25 Tage**
Trennvorhang	**Mo, 06.07.26**	**Mi, 21.04.27**	**204 Tage**
Aufmaß Trennvorhang freigabe W+M-Planung durch AG	Mo, 06.07.26	Mo, 06.07.26	**1 Tag**
	Mo, 28.09.26	Mo, 28.09.26	**1 Tag**
Montage Trennvorhang	Mo, 05.04.27	Mi, 21.04.27	**13 Tage**
Einbauten Sporthalle	**Mo, 06.07.26**	**Fr, 16.04.27**	**201 Tage**
Aufmaß Einbauten freigabe W+M-Planung durch AG	Mo, 06.07.26	Mo, 06.07.26	**1 Tag**
	Di, 01.09.26	Di, 01.09.26	**1 Tag**
Vormontage konstruktive Einbauten	Mo, 30.11.26	Fr, 11.12.26	**10 Tage**
Endmontage Sportgeräte	Mo, 05.04.27	Fr, 16.04.27	**10 Tage**
Estricharbeiten	**Mo, 06.07.26**	**Fr, 11.12.26**	**115 Tage**
Aufmaßtermin	Mo, 06.07.26	Mo, 06.07.26	1 Tag
Ausgleichsschüttung	Mo, 28.09.26	Mo, 05.10.26	6 Tage
Austrocknung Ausgleichsschüttung	Di, 06.10.26	Mo, 12.10.26	5 Tage
Auslegen Dämmung OG	Di, 13.10.26	Do, 15.10.26	3 Tage
Auslegen Dämmung EG	Fr, 16.10.26	Di, 20.10.26	3 Tage
Einbau Estrich OG	Mi, 21.10.26	Di, 27.10.26	5 Tage
Einbau Estrich EG	Mi, 28.10.26	Di, 03.11.26	5 Tage
Trocknung Estrich OG	Mi, 28.10.26	Fr, 04.12.26	28 Tage
Trocknung Estrich EG	Mi, 04.11.26	Fr, 11.12.26	28 Tage
Epoxi-Beschichtung	**Mo, 07.12.26**	**Fr, 12.02.27**	**48 Tage**
Epoxi Küche	Mo, 25.01.27	Fr, 12.02.27	**15 Tage**
Epoxi EG	Mo, 14.12.26	Do, 21.01.27	**27 Tage**
Epoxi OG	Mo, 07.12.26	Fr, 18.12.26	**10 Tage**
Malerarbeiten	**Mo, 17.08.26**	**Di, 20.04.27**	**173 Tage**
Schleifarbeiten Sichtbetonwände	Mo, 17.08.26	Fr, 11.09.26	20 Tage
Lasuranstrich Sichtbetonwände	Mo, 31.08.26	Fr, 04.12.26	39 Tage
Bodenanstrich Technikräume	Mo, 07.12.26	Mi, 16.12.26	8 Tage
Spachteln, 1.Anstrich EG	Mi, 09.12.26	Di, 22.12.26	10 Tage
Spachteln, 1.Anstrich OG	Mi, 25.11.26	Di, 08.12.26	10 Tage
2. Anstrich EG	**Mi, 07.04.27**	**Di, 20.04.27**	**10 Tage**
2. Anstrich OG	**Di, 23.02.27**	**Mo, 08.03.27**	**10 Tage**
Betonwerkstein	**Mo, 06.07.26**	**Fr, 19.02.27**	**163 Tage**
Freigabe Bemusterung durch AG	Mo, 06.07.26	Fr, 10.07.26	5 Tage
Aufmaßtermin	Mo, 07.09.26	Mo, 07.09.26	1 Tag
Betonwerkstein EG	Fr, 15.01.27	Fr, 19.02.27	26 Tage
Betonwerkstein OG	Mi, 09.12.26	Di, 15.12.26	5 Tage
Betonwerkstein Trh 2	Mi, 16.12.26	Di, 22.12.26	5 Tage
Betonwerkstein Trh 1	Fr, 08.01.27	Do, 14.01.27	5 Tage
Schlosserarbeiten	**Fr, 15.01.27**	**Mo, 03.05.27**	**75 Tage**
Aufmaß Handläufe freigabe W+M-Planung durch AG	Fr, 15.01.27	Fr, 15.01.27	**1 Tag**
	Mo, 22.02.27	Mo, 22.02.27	**1 Tag**
Handläufe	Do, 22.04.27	Mo, 03.05.27	**8 Tage**
Linoleum	**Mo, 14.09.26**	**Fr, 12.02.27**	**108 Tage**
freigabe Bemusterung durch AG	Mo, 14.09.26	Mo, 14.09.26	1 Tag
Aufmaßtermin	Mo, 14.09.26	Mo, 14.09.26	1 Tag
Linoleum OG	Mo, 01.02.27	Fr, 12.02.27	10 Tage
Fliesenarbeiten	**Mo, 07.12.26**	**Di, 06.04.27**	**83 Tage**
Abdichtung EG	Mo, 08.02.27	Fr, 19.02.27	10 Tage
Wand-u. Bodenfliesen EG	Mo, 22.02.27	Di, 06.04.27	30 Tage
Abdichtung OG	Mo, 07.12.26	Fr, 11.12.26	5 Tage
Wand-u. Bodenfliesen OG	Mo, 14.12.26	Fr, 29.01.27	33 Tage
Innentüren	**Mo, 14.09.26**	**Di, 20.04.27**	**153 Tage**
Aufmaß Innentüren EG	Mo, 14.09.26	Mo, 14.09.26	1 Tag
Aufmaß Innentüren OG	Mo, 14.09.26	Mo, 14.09.26	1 Tag
Innentüren EG	Mi, 07.04.27	Di, 20.04.27	10 Tage
Innentüren OG	Mo, 01.03.27	Di, 09.03.27	7 Tage
WC-Trennwände	**Do, 04.02.27**	**Fr, 04.06.27**	**83 Tage**
Aufmaß EG	Mi, 14.04.27	Mi, 14.04.27	1 Tag
Aufmaß OG	Do, 04.02.27	Do, 04.02.27	1 Tag
Montage WC-Trennwände EG	Mo, 31.05.27	Fr, 04.06.27	5 Tage
Montage WC-Trennwände OG	Fr, 19.03.27	Do, 25.03.27	5 Tage
Baureinigung	Mo, 31.05.27	Fr, 11.06.27	10 Tage
Baureinigung OG	Mo, 31.05.27	Fr, 04.06.27	5 Tage
Baureinigung EG	Mo, 07.06.27	Fr, 11.06.27	5 Tage
Außenanlagen (außer Stellplätze) Ang. LAR	**Mo, 05.10.26**	**Fr, 07.05.27**	**150 Tage**
Außenanlagen BA 1.1	Mo, 05.10.26	Fr, 04.12.26	45 Tage
Außenanlagen BA 1.2	Mo, 12.10.26	Sa, 24.10.26	10 Tage
Außenanlagen BA 2	Mo, 07.12.26	Mo, 18.01.27	29 Tage
Außenanlagen BA 3.1	Mo, 01.03.27	Fr, 19.03.27	15 Tage
Außenanlagen BA 3.2	Mo, 22.03.27	Fr, 02.04.27	8 Tage
Außenanlagen BA 3.3	Mo, 26.04.27	Fr, 07.05.27	9 Tage
behördliche Abnahmen	Fr, 07.05.27	Fr, 21.05.27	10 Tage
Abnahmen und Mängelbeseitigung	Fr, 24.04.26	Fr, 28.05.27	277 Tage
Fertigstellung Hochbau & Außenanlagen	Mo, 31.05.27	Mo, 31.05.27	1 Tag
Ende der Sommerferien	Mi, 18.08.27	Mi, 18.08.27	1 Tag
Inbetriebnahme Sporthalle + Mensa	Do, 19.08.27	Do, 19.08.27	
Abbruch Hausmeister (abliegt nicht Planung OKFI, GGF, mit Beginn der Sommerferien.	*Mo, 12.07.27*	*Fr, 20.08.27*	*30 Tage*
Außenanlagen Stellplätze	*Mo, 23.08.27*	*Fr, 29.10.27*	*50 Tage*
Abnahmen und Mängelbeseitigung	*Mo, 01.11.27*	*Fr, 12.11.27*	*10 Tage*
behördliche Abnahmen	*Mo, 15.11.27*	*Mo, 15.11.27*	*1 Tag*
Inbetriebnahme Stellplätze	*Di, 16.11.27*	*Di, 16.11.27*	*1 Tag*
