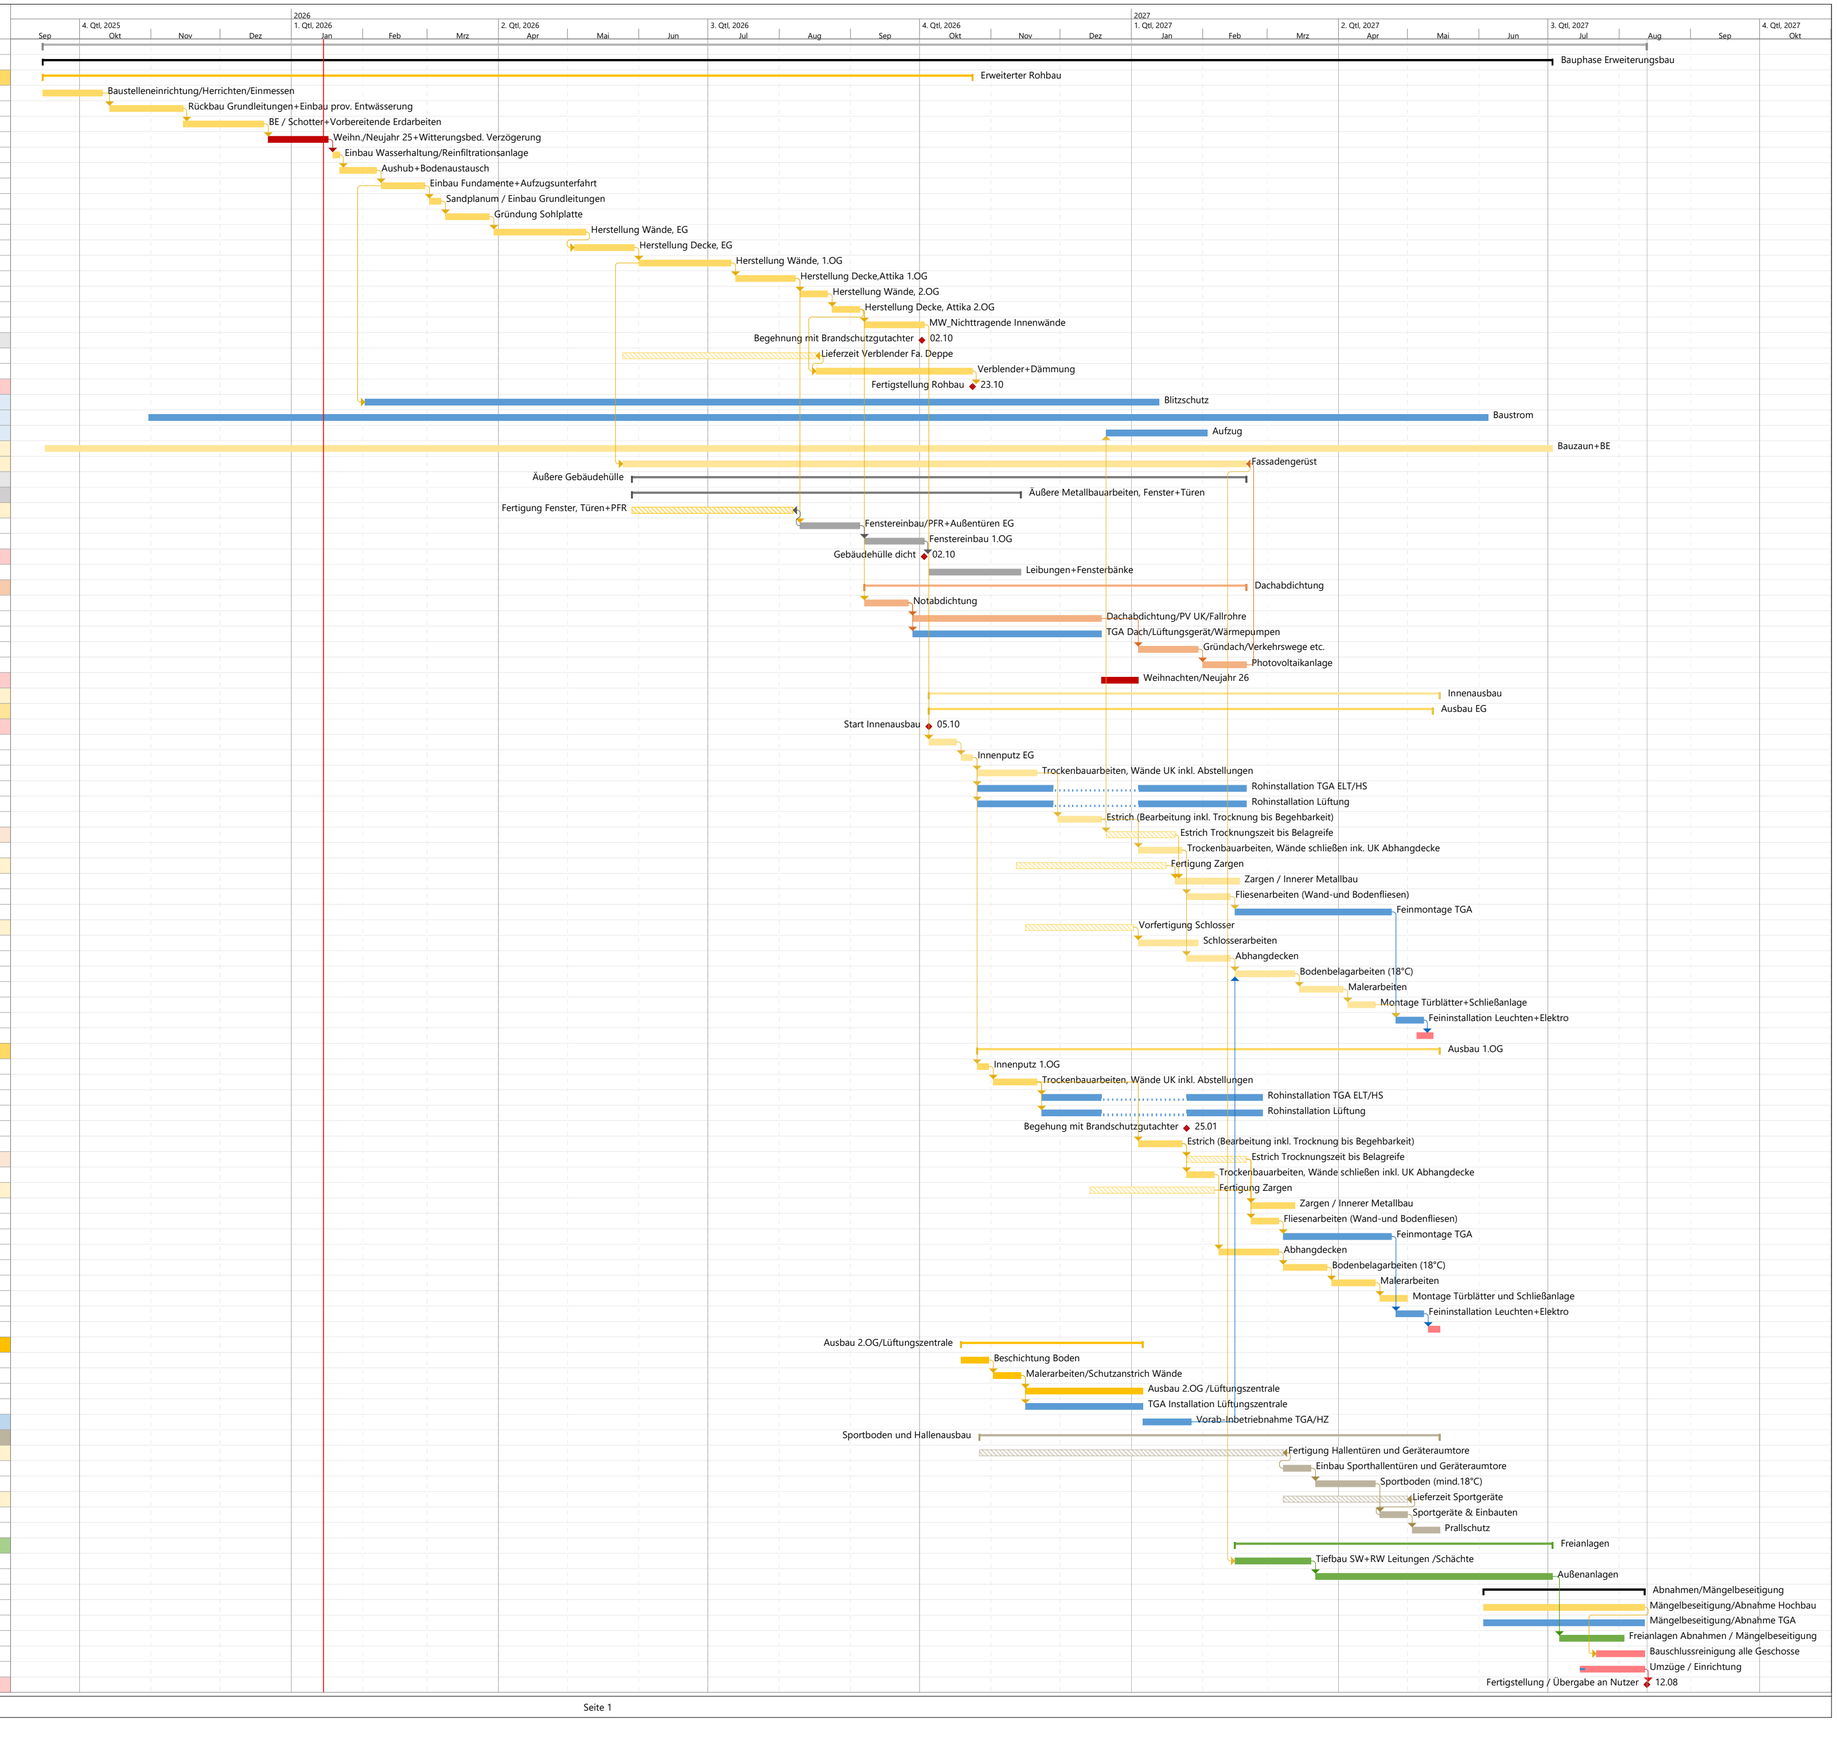Nr.	Vorgan	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
0		**Bauausführung (LPH8) GS Am Grünen Kamp**	**483 Tage**	**Mon 15.09.25**	**Don 12.08.27**
1		**Bauphase Erweiterungsbau**	**454 Tage**	**Mon 15.09.25**	**Fre 02.07.27**
2		**Erweiterter Rohbau**	**281 Tage**	**Mon 15.09.25**	**Fre 23.10.26**
3		Baustelleneinrichtung/Herrichten/Einmessen	1 Monat	Mon 15.09.25	Fre 10.10.25
4		Rückbau Grundleitungen+Einbau prov. Entwässerung	24 Tage	Mon 13.10.25	Fre 14.11.25
5		BE / Schotter+Vorbereitende Erdarbeiten	25 Tage	Fre 14.11.25	Fre 19.12.25
6		**Weihn./Neujahr 25+Witterungsbed. Verzögerung**	**11 Tage**	**Mon 22.12.25**	**Fre 16.01.26**
7		Einbau Wasserhaltung/Reinfiltrationsanlage	3 Tage	Mon 19.01.26	Mit 21.01.26
8		Aushub+Bodenaustausch	12 Tage	Don 22.01.26	Fre 06.02.26
9		Einbau Fundamente+Aufzugsunterfahrt	3 Wochen	Mon 09.02.26	Fre 27.02.26
10		Sandplanum / Einbau Grundleitungen	1 Woche	Mon 02.03.26	Fre 06.03.26
11		Gründung Sohlplatte	15 Tage	Mon 09.03.26	Fre 27.03.26
12		Herstellung Wände, EG	30 Tage	Mon 30.03.26	Fre 08.05.26
13		Herstellung Decke, EG	20 Tage	Mon 04.05.26	Fre 29.05.26
14		Herstellung Wände, 1.OG	30 Tage	Mon 01.06.26	Fre 10.07.26
15		Herstellung Decke,Attika 1.OG	20 Tage	Mon 13.07.26	Fre 07.08.26
16		Herstellung Wände, 2.OG	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26
17		Herstellung Decke, Attika 2.OG	10 Tage	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26
18		MW_Nichttragende Innenwände	20 Tage	Mon 07.09.26	Fre 02.10.26
19		**Begehnung mit Brandschutzgutachter**	**0 Tage**	**Fre 02.10.26**	**Fre 02.10.26**
20		Lieferzeit Verblender Fa. Deppe	12 Wochen	Mon 25.05.26	Mon 17.08.26
21		Verblender+Dämmung	10 Wochen	Mon 17.08.26	Fre 23.10.26
22		**Fertigstellung Rohbau**	**0 Tage**	**Fre 23.10.26**	**Fre 23.10.26**
23		**Blitzschutz**	12 Monate	Mon 02.02.26	Die 12.01.27
24		**Baustrom**	20 Monate	Fre 31.10.25	Fre 04.06.27
25		Aufzug	5 Wochen	Mon 21.12.26	Die 02.02.27
26		Bauzaun+BE	453 Tage	Mon 15.09.25	Fre 02.07.27
27		Fassadengerüst	188 Tage	Mon 25.05.26	Fre 19.02.27
28		**Äußere Gebäudehülle**	**184 Tage**	**Fre 29.05.26**	**Fre 19.02.27**
29		**Äußere Metallbauarbeiten, Fenster+Türen**	**121 Tage**	**Fre 29.05.26**	**Fre 13.11.26**
30		Fertigung Fenster, Türen+PFR	10 Wochen	Fre 29.05.26	Fre 07.08.26
31		Fenstereinbau/PFR+Außentüren EG	20 Tage	Mon 10.08.26	Fre 04.09.26
32		Fenstereinbau 1.OG	20 Tage	Mon 07.09.26	Fre 02.10.26
33		**Gebäudehülle dicht**	**0 Tage**	**Fre 02.10.26**	**Fre 02.10.26**
34		Leibungen+Fensterbänke	30 Tage	Mon 05.10.26	Fre 13.11.26
35		**Dachabdichtung**	**113 Tage**	**Mon 07.09.26**	**Fre 19.02.27**
36		Notabdichtung	3 Wochen	Mon 07.09.26	Fre 25.09.26
37		Dachabdichtung/PV UK/Fallrohre	12 Wochen	Mon 28.09.26	Fre 18.12.26
38		**TGA Dach/Lüftungsgerät/Wärmepumpen**	**60 Tage**	**Mon 28.09.26**	**Fre 18.12.26**
39		Gründach/Verkehrswege etc.	20 Tage	Mon 04.01.27	Fre 29.01.27
40		Photovoltaikanlage	15 Tage	Mon 01.02.27	Fre 19.02.27
41		**Weihnachten/Neujahr 26**	**5 Tage**	**Sam 19.12.26**	**Son 03.01.27**
42		**Innenausbau**	**153 Tage**	**Mon 05.10.26**	**Fre 14.05.27**
43		**Ausbau EG**	**150 Tage**	**Mon 05.10.26**	**Die 11.05.27**
44		**Start Innenausbau**	**0 Tage**	**Mon 05.10.26**	**Mon 05.10.26**
45		Sohlabdichtung EG inkl. Bodeneinläufe	2 Wochen	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26
46		Innenputz EG	5 Tage	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26
47		Trockenbauarbeiten, Wände UK inkl. Abstellungen	4 Wochen	Mon 26.10.26	Fre 20.11.26
48		**Rohinstallation TGA ELT/HS**	**12 Wochen**	**Mon 26.10.26**	**Fre 19.02.27**
49		**Rohinstallation Lüftung**	**12 Wochen**	**Mon 26.10.26**	**Fre 19.02.27**
50		Estrich (Bearbeitung inkl. Trocknung bis Begehbarkeit)	15 Tage	Mon 30.11.26	Fre 18.12.26
51		Estrich Trocknungszeit bis Belagreife	3 Wochen	Mon 21.12.26	Die 19.01.27
52		Trockenbauarbeiten, Wände schließen ink. UK Abhangdecke	3 Wochen	Mon 04.01.27	Fre 22.01.27
53		Fertigung Zargen	8 Wochen	Mit 11.11.26	Fre 15.01.27
54		Zargen / Innerer Metallbau	4 Wochen	Mit 20.01.27	Die 16.02.27
55		Fliesenarbeiten (Wand-und Bodenfliesen)	3 Wochen	Mon 25.01.27	Fre 12.02.27
56		**Feinmontage TGA**	**10 Wochen**	**Mon 15.02.27**	**Fre 23.04.27**
57		Vorfertigung Schlosser	5,6 Wochen	Mon 16.11.26	Fre 01.01.27
58		Schlosserarbeiten	4 Wochen	Mon 04.01.27	Fre 29.01.27
59		Abhangdecken	3 Wochen	Mon 25.01.27	Fre 12.02.27
60		Bodenbelagarbeiten (18°C)	20 Tage	Mon 15.02.27	Fre 12.03.27
61		Malerarbeiten	3 Wochen	Mon 15.03.27	Fre 02.04.27
62		Montage Türblätter+Schließanlage	2 Wochen	Mon 05.04.27	Fre 16.04.27
63		**Feininstallation Leuchten+Elektro**	**2 Wochen**	**Mon 26.04.27**	**Fre 07.05.27**
64		Grobreinigung	1 Woche	Mit 05.05.27	Die 11.05.27
65		**Ausbau 1.OG**	**138 Tage**	**Mon 26.10.26**	**Fre 14.05.27**
66		Innenputz 1.OG	5 Tage	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26
67		Trockenbauarbeiten, Wände UK inkl. Abstellungen	3 Wochen	Mon 02.11.26	Fre 20.11.26
68		**Rohinstallation TGA ELT/HS**	**9 Wochen**	**Mon 23.11.26**	**Fre 26.02.27**
69		**Rohinstallation Lüftung**	**9 Wochen**	**Mon 23.11.26**	**Fre 26.02.27**
70		Begehung mit Brandschutzgutachter	0 Tage	Mon 25.01.27	Mon 25.01.27
71		Estrich (Bearbeitung inkl. Trocknung bis Begehbarkeit)	15 Tage	Mon 04.01.27	Fre 22.01.27
72		Estrich Trocknungszeit bis Belagreife	4 Wochen	Mon 25.01.27	Fre 19.02.27
73		Trockenbauarbeiten, Wände schließen inkl. UK Abhangdecke	2 Wochen	Mon 25.01.27	Fre 05.02.27
74		Fertigung Zargen	6,5 Wochen	Mon 14.12.26	Fre 05.02.27
75		Zargen / Innerer Metallbau	3 Wochen	Mon 22.02.27	Fre 12.03.27
76		Fliesenarbeiten (Wand-und Bodenfliesen)	2 Wochen	Mon 22.02.27	Fre 05.03.27
77		Feinmontage TGA	7 Wochen	Mon 08.03.27	Fre 23.04.27
78		Abhangdecken	4 Wochen	Mon 08.02.27	Fre 05.03.27
79		Bodenbelagarbeiten (18°C)	15 Tage	Mon 08.03.27	Fre 26.03.27
80		Malerarbeiten	15 Tage	Mon 29.03.27	Fre 16.04.27
81		Montage Türblätter und Schließanlage	2 Wochen	Mon 19.04.27	Fre 30.04.27
82		Feininstallation Leuchten+Elektro	2 Wochen	Mon 26.04.27	Fre 07.05.27
83		Bauzwischenreinigung	1 Woche	Mon 10.05.27	Fre 14.05.27
84		**Ausbau 2.OG/Lüftungszentrale**	**50 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Die 05.01.27**
85		Beschichtung Boden	2 Wochen	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26
86		Malerarbeiten/Schutzanstrich Wände	2 Wochen	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26
87		Ausbau 2.OG /Lüftungszentrale	30 Tage	Mon 16.11.26	Die 05.01.27
88		**TGA Installation Lüftungszentrale**	**6 Wochen**	**Mon 16.11.26**	**Die 05.01.27**
89		Vorab-Inbetriebnahme TGA/HZ	3 Wochen	Mit 06.01.27	Die 26.01.27
90		**Sportboden und Hallenausbau**	**137,5 Tage**	**Mon 26.10.26**	**Fre 14.05.27**
91		Fertigung Hallentüren und Geräteraumtore	17,5 Wochen	Mon 26.10.26	Mon 08.03.27
92		Einbau Sporthallentüren und Geräteraumtore	2 Wochen	Mon 08.03.27	Fre 19.03.27
93		Sportboden (mind.18°C)	4 Wochen	Mon 22.03.27	Fre 16.04.27
94		Lieferzeit Sportgeräte	8 Wochen	Mon 08.03.27	Fre 30.04.27
95		Sportgeräte & Einbauten	2 Wochen	Mon 19.04.27	Fre 30.04.27
96		Prallschutz	2 Wochen	Mon 03.05.27	Fre 14.05.27
97		**Freianlagen**	**100 Tage**	**Mon 15.02.27**	**Fre 02.07.27**
98		Tiefbau SW+RW Leitungen /Schächte	**25 Tage**	**Mon 15.02.27**	**Fre 19.03.27**
99		Außenanlagen	**15 Wochen**	**Mon 22.03.27**	**Fre 02.07.27**
100		**Abnahmen/Mängelbeseitigung**	**50 Tage**	**Don 03.06.27**	**Mit 11.08.27**
101		Mängelbeseitigung/Abnahme Hochbau	2,5 Monate	Don 03.06.27	Mit 11.08.27
102		Mängelbeseitigung/Abnahme TGA	2,5 Monate	Don 03.06.27	Mit 11.08.27
103		Freianlagen Abnahmen / Mängelbeseitigung	20 Tage	Die 06.07.27	Mon 02.08.27
104		Bauschlussreinigung alle Geschosse	15 Tage	Don 22.07.27	Mit 11.08.27
105		**Umzüge / Einrichtung**	**20 Tage**	**Don 15.07.27**	**Mit 11.08.27**
106		**Fertigstellung / Übergabe an Nutzer**	**0 Tage**	**Don 12.08.27**	**Don 12.08.27**
