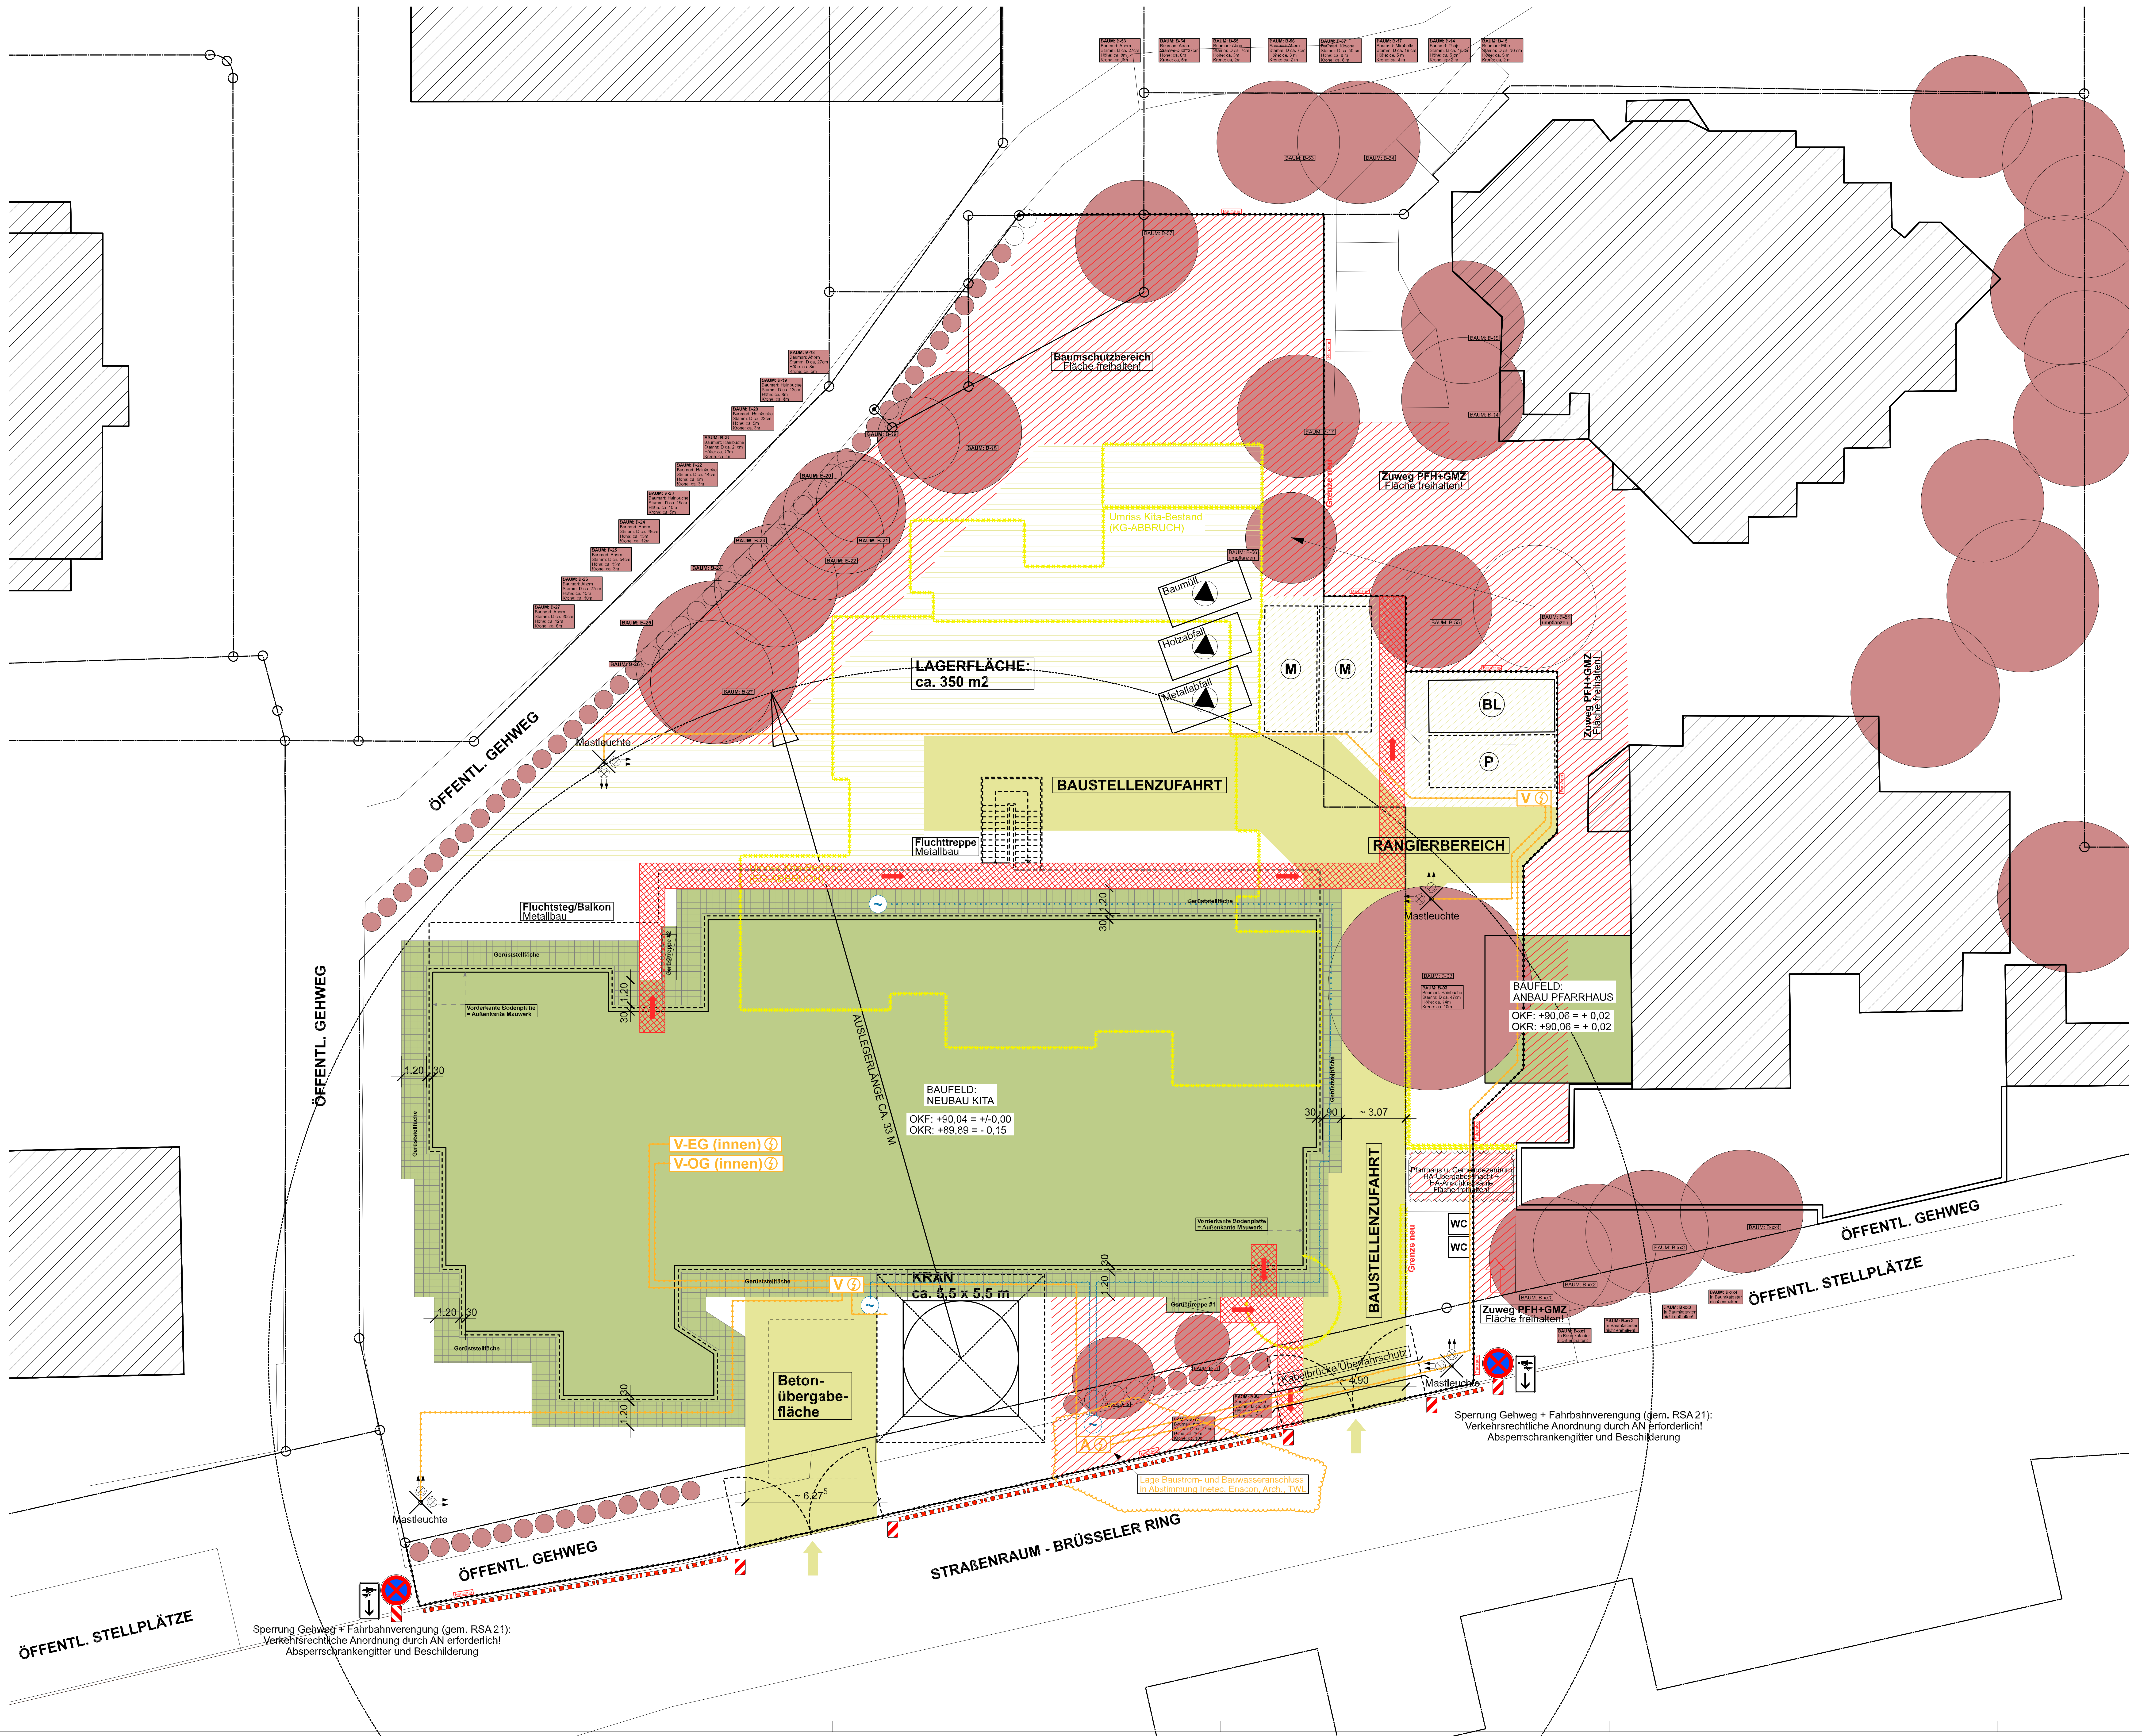

HINWEIS ZU BAUMSCHUTZMAßNAHMEN:
siehe auch DIN 18920 und RAS-LP4

Vor Beginn der Bautätigkeit ortsfeste Schutzzäune um den Baum herum anbringen

- Bodenverunreinigen zwingend vermeiden
- Boden im Wurzelbereich der Bäume nicht durch Befahren oder Materialablagerung verdichten
- Graben im Wurzelbereich (Kronentraufe zuzüglich 1,5 m) nur in Handarbeit oder mittels Absaugtechnik
- Wurzelverletzungen vermeiden, sonst Wurzeln sauber abschneiden
- Freigelegtes Wurzelwerk mit Jute oder Frostschutzmatten abdecken
- bei trockener Witterung bewässern
- Verlegen von Leitungen durch Unterfahren (Durchbohren)
- Arbeiten an Bäumen nur in Astimmung mit Baumpfleger
- Bodenauftrag oder Bodenabtrag im Wurzelbereich von Bäumen vermeiden
- Überfüllungen des Bodens unter der Krone ist zu vermeiden
- wenn Überfüllungen erforderlich sind, nur mit luft- und wasserdurchlässigem Material
- Befahren des Bereichs unter der Krone ist zu vermeiden
- bei Bedarf Baupiste anlegen (Schutzvlies, Schotter, Stahlplatte)
- Baugruben in Baumnähe mit Wurzelvorhang ausbilden (Abstand zu Stamm ca. 2,5 m)

LEGENDE - Baustelleneinrichtung

OK Gebäude-Bestand ca. + 8 m	Gebäude - Bestand
▨ OK Gebäude-Bestand ca. + 8 m	Nachbargebäude - Bestand
🟩	Baufeld/Baugrube - Neubau
🟫	Erdarbeiten - siehe Angaben Plan
🟨	Baustellenzufahrt
▤	Lagerflächen
▨	Aufstellflächen
P	Parkplatz
🟥	Freizuhaltende Flächen
⊠	Kran - Aufstellfläche
BL	Container - Büro Bauleitung/Besprechung (AG - bauseits)
P	Container - Büro Polier (durch AN zu stellen)
M	Container - Lager/Magazin (durch AN zu stellen)
WC	Toilettenzelle
▲	Abfallentsorgung (durch AN zu stellen)
-□-□-□-□-	Bauzaun
A ⚡ V ⚡	Baustromverteiler (Anschluss- oder Verteilerschrank)
~	Bauwasseranschluss
T	Telefonanschluss
-o-o-o-o-	frei verlegte Leitungen - Strom/Wasser/Telefon
	Kabel-/Leitungsbrücke
- - - - -	erdverlegte Leitungen oder Bauteile - siehe Angaben Plan
	Leerrohre
— - - -	Bauteile Hochbau - siehe Angaben Plan
	Mastleuchte - Holzmast mit 2 Stück Außenstrahler
●	Baum - erhalten
	REGENABWASSERLEITUNG - Bestand
	SCHMUTABZWASSER - Bestand
● RR	Regenwasserfallrohr RR 1 = Nr. / DF 1 = Nr. Dachfläche
	Regenwasserleitung - neu Rw-1.1 = Strang - NR.
● SW	Schmutzwasser / Rohrdurchführung SW 1 = Nr. / - E = Entlüftung
	Schmutzwasserleitung - neu Sw-1.2 = Strang - NR.
BA	Bodenablauf - Schmutzwasser-Rohrdurchführung BA 1= NR.

Index	Datum	Geändert	Änderung
			VORABZUG

Architekt:
RAINER HELD
DIPL.ING. FH - ARCHITEKT
76829 LANDAU, MARTIN-LUTHER-STR.48
tel. 06341/85383 fax 06341/89590
e-mail r.held@rainerheld.de

Planungsstand:	WERKPLANUNG W 1-1		
Projekt:	ABBRUCH UND NEUBAU DES 2-GRUPPIGEN KINDERGARTENS ZU EINER 4-GRUPPIGEN EINRICHTUNG KITA-REGENBOGEN BRÜSSELER RING 57 67069 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN		
Bauherr:	PROTESTANTISCHE KIRCHENGEMEINDE LUDWIGSHAFEN-PFINGSTWEIDE BRÜSSELER RING 57 67069 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN		
Träger:	VERBUND PROT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN IM PROT. KIRCHENBEZIRK LU - GEMEINSAM UNTER EINEM DACH LUTHERSTRASSE 14 67059 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN		
Planinhalt:	BAUSTELLENEINRICHTUNG		
Zusatz Planinhalt:			
	Name:	Datum:	
gezeichnet / Stand:	dd	2026-07-02	
geprüft:			
Höhen:	**EG - OKF = +90,04 ü.NN = +/- 0,00**		
Plangröße: A0	Maßstab: 1:100	Plan-Nr.: W_0.3	Index-Stand:
