Nr.	Vorgangsname	Dauer	Verantwortlich	Anfang	Ende	% Abg.	Vorgänger
0	260611 RA Bauablaufplan	472 Tage		Don 18.06.26	Fre 21.04.28	0%	
1	1 Auszug Nutzer	9 Tage	AKK	Don 18.06.26	Die 30.06.26	0%	
2	2 Kick-Off	1 Tag	ALLE	Don 18.06.26	Don 18.06.26	0%	1AA
3	3 Vorab Maßnahmen	123 Tage		Mit 01.07.26	Fre 18.12.26	0%	
39	4 Aufstockung Reha	346 Tage		Mon 24.08.26	Mon 03.01.28	0%	
56	5 UG	22 Tage		Mit 02.09.26	Don 01.10.26	0%	
73	6 EG	123 Tage	ALLE	Mit 01.07.26	Fre 18.12.26	0%	
75	7 Abbruch Bestand über EG	28 Tage	Rohbau / TGA	Die 15.09.26	Don 22.10.26	0%	
81	8 1.OG	283 Tage	ALLE	Die 13.10.26	Don 25.11.27	0%	
82	8.1 Rohbau 1.OG	74 Tage	Rohbau	Die 13.10.26	Fre 05.02.27	0%	
83	8.1.1 Abbruch Attika	10 Tage	Rohbau	Die 13.10.26	Mon 26.10.26	0%	78
84	8.1.2 Anschlussbewehrung bohren & einbringen	10 Tage	Rohbau	Die 27.10.26	Mon 09.11.26	0%	83
85	8.1.3 Schalung Außenwände und Stützen	10 Tage	Rohbau	Die 03.11.26	Mon 16.11.26	0%	84AA+5 Tage
86	8.1.4 Bewehrung Außenwände und Stützen	10 Tage	Rohbau	Die 10.11.26	Mon 23.11.26	0%	85AA+5 Tage
87	8.1.5 Betonage Außenwände und Sützen	10 Tage	Rohbau	Die 17.11.26	Mon 30.11.26	0%	86AA+5 Tage
88	8.1.6 Trocknungszeit Wände und Stützen	25 Tage	Rohbau	Die 24.11.26	Mon 28.12.26	0%	87AA+5 Tage
89	8.1.7 Ausschalen	10 Tage	Rohbau	Die 01.12.26	Mon 14.12.26	0%	88AA+5 Tage
90	8.1.8 Mauerwerkswände erstellen	12 Tage	Rohbau	Die 01.12.26	Mit 16.12.26	0%	89AA
91	8.1.9 Fertigteilstürze über Wandöffnungen einbringen	5 Tage	Rohbau	Die 01.12.26	Mon 07.12.26	0%	88AA+5 Tage
92	8.1.10 Baustelle Winterfest	2 Tage		Die 15.12.26	Mit 16.12.26	0%	
93	8.1.10.1 Mauerwerkswände schützen	2 Tage	Rohbau	Die 15.12.26	Mit 16.12.26	0%	90EE
94	8.1.10.2 Material sichern	2 Tage	Rohbau	Die 15.12.26	Mit 16.12.26	0%	90EE
95	8.1.11 Anlieferung Träger	4 Tage	Rohbau	Don 17.12.26	Die 05.01.27	0%	89EA+2 Tage
96	8.1.12 Montage Träger	8 Tage	Rohbau	Mit 06.01.27	Fre 15.01.27	0%	95
97	8.1.13 Anlieferung Deckenteile	4 Tage	Rohbau	Mon 18.01.27	Don 21.01.27	0%	96
98	8.1.14 Montage Deckenteile	8 Tage	Rohbau	Fre 22.01.27	Die 02.02.27	0%	97
99	8.1.15 Vergussbeton	3 Tage	Rohbau	Mit 03.02.27	Fre 05.02.27	0%	98
100	8.2 Fenster Einsatz 1	25 Tage		Mon 08.02.27	Fre 12.03.27	0%	
106	8.3 Innenputz	20 Tage		Die 09.03.27	Mon 05.04.27	0%	
111	8.4 Innenwände	133 Tage		Die 06.04.27	Don 07.10.27	0%	
119	8.5 Estrich	47 Tage		Fre 13.08.27	Mon 18.10.27	0%	
125	8.6 Fliesen	18 Tage		Die 19.10.27	Don 11.11.27	0%	
129	8.7 Innentüren	20 Tage		Don 09.09.27	Mit 06.10.27	0%	
132	8.8 Malerarbeiten	35 Tage		Fre 08.10.27	Don 25.11.27	0%	
139	8.9 Bodenbelag	26 Tage		Die 19.10.27	Die 23.11.27	0%	
144	8.10 Möbel	12 Tage		Fre 29.10.27	Mon 15.11.27	0%	
147	9 2.OG	233 Tage		Mon 08.02.27	Mit 29.12.27	0%	
148	9.1 Rohbau 2.OG	59 Tage		Mon 08.02.27	Don 29.04.27	0%	
161	9.2 Schnittstelle zum 1.OG	21 Tage		Die 27.04.27	Die 25.05.27	0%	
167	9.3 Fenster Einsatz 1	25 Tage		Fre 30.04.27	Don 03.06.27	0%	
173	9.4 Innenputz	20 Tage		Mon 31.05.27	Fre 25.06.27	0%	
178	9.5 Innenwände	98 Tage		Mon 28.06.27	Mit 10.11.27	0%	
186	9.6 Estrich	47 Tage		Don 16.09.27	Fre 19.11.27	0%	
192	9.7 Fliesen	10 Tage		Mon 22.11.27	Fre 03.12.27	0%	
196	9.8 Innentüren	20 Tage		Mit 13.10.27	Die 09.11.27	0%	
199	9.9 Malerarbeiten	35 Tage		Don 11.11.27	Mit 29.12.27	0%	
206	9.10 Bodenbelag	26 Tage		Mon 22.11.27	Mon 27.12.27	0%	
211	9.11 Möbel	12 Tage		Don 02.12.27	Fre 17.12.27	0%	
214	10 3.OG	243 Tage		Fre 30.04.27	Die 04.04.28	0%	
215	10.1 Rohbau 3.OG	59 Tage		Fre 30.04.27	Mit 21.07.27	0%	
228	10.2 Schnittstelle zum 2.OG	21 Tage		Mon 19.07.27	Mon 16.08.27	0%	
234	10.3 Fenster Einsatz 1	25 Tage		Don 22.07.27	Mit 25.08.27	0%	
240	10.4 Innenputz	20 Tage		Fre 20.08.27	Don 16.09.27	0%	
245	10.5 Innenwände	98 Tage		Fre 17.09.27	Die 01.02.28	0%	
253	10.6 Estrich	47 Tage		Mit 08.12.27	Don 10.02.28	0%	
259	10.7 Fliesen	10 Tage		Fre 11.02.28	Don 24.02.28	0%	
263	10.8 Innentüren	20 Tage		Die 04.01.28	Mon 31.01.28	0%	
266	10.9 Malerarbeiten	45 Tage		Mit 02.02.28	Die 04.04.28	0%	
273	10.10 Bodenbelag	26 Tage		Fre 11.02.28	Fre 17.03.28	0%	
278	10.11 Möbel	12 Tage		Mit 08.03.28	Don 23.03.28	0%	
281	11 Dachabdichtungsarbeiten	53 Tage		Don 22.07.27	Mon 04.10.27	0%	
291	12 WDVS	65 Tage		Don 12.08.27	Mit 10.11.27	0%	
300	13 Fenster Einsatz 2	10 Tage		Don 04.11.27	Mit 17.11.27	0%	
302	14 Metallfassade	13 Tage		Don 18.11.27	Mon 06.12.27	0%	
305	15 Schlosserarbeiten	50 Tage		Die 04.01.28	Mon 13.03.28	0%	50
306	16 Inbetriebnahme und Abnahmen	30 Tage		Mon 13.03.28	Fre 21.04.28	0%	

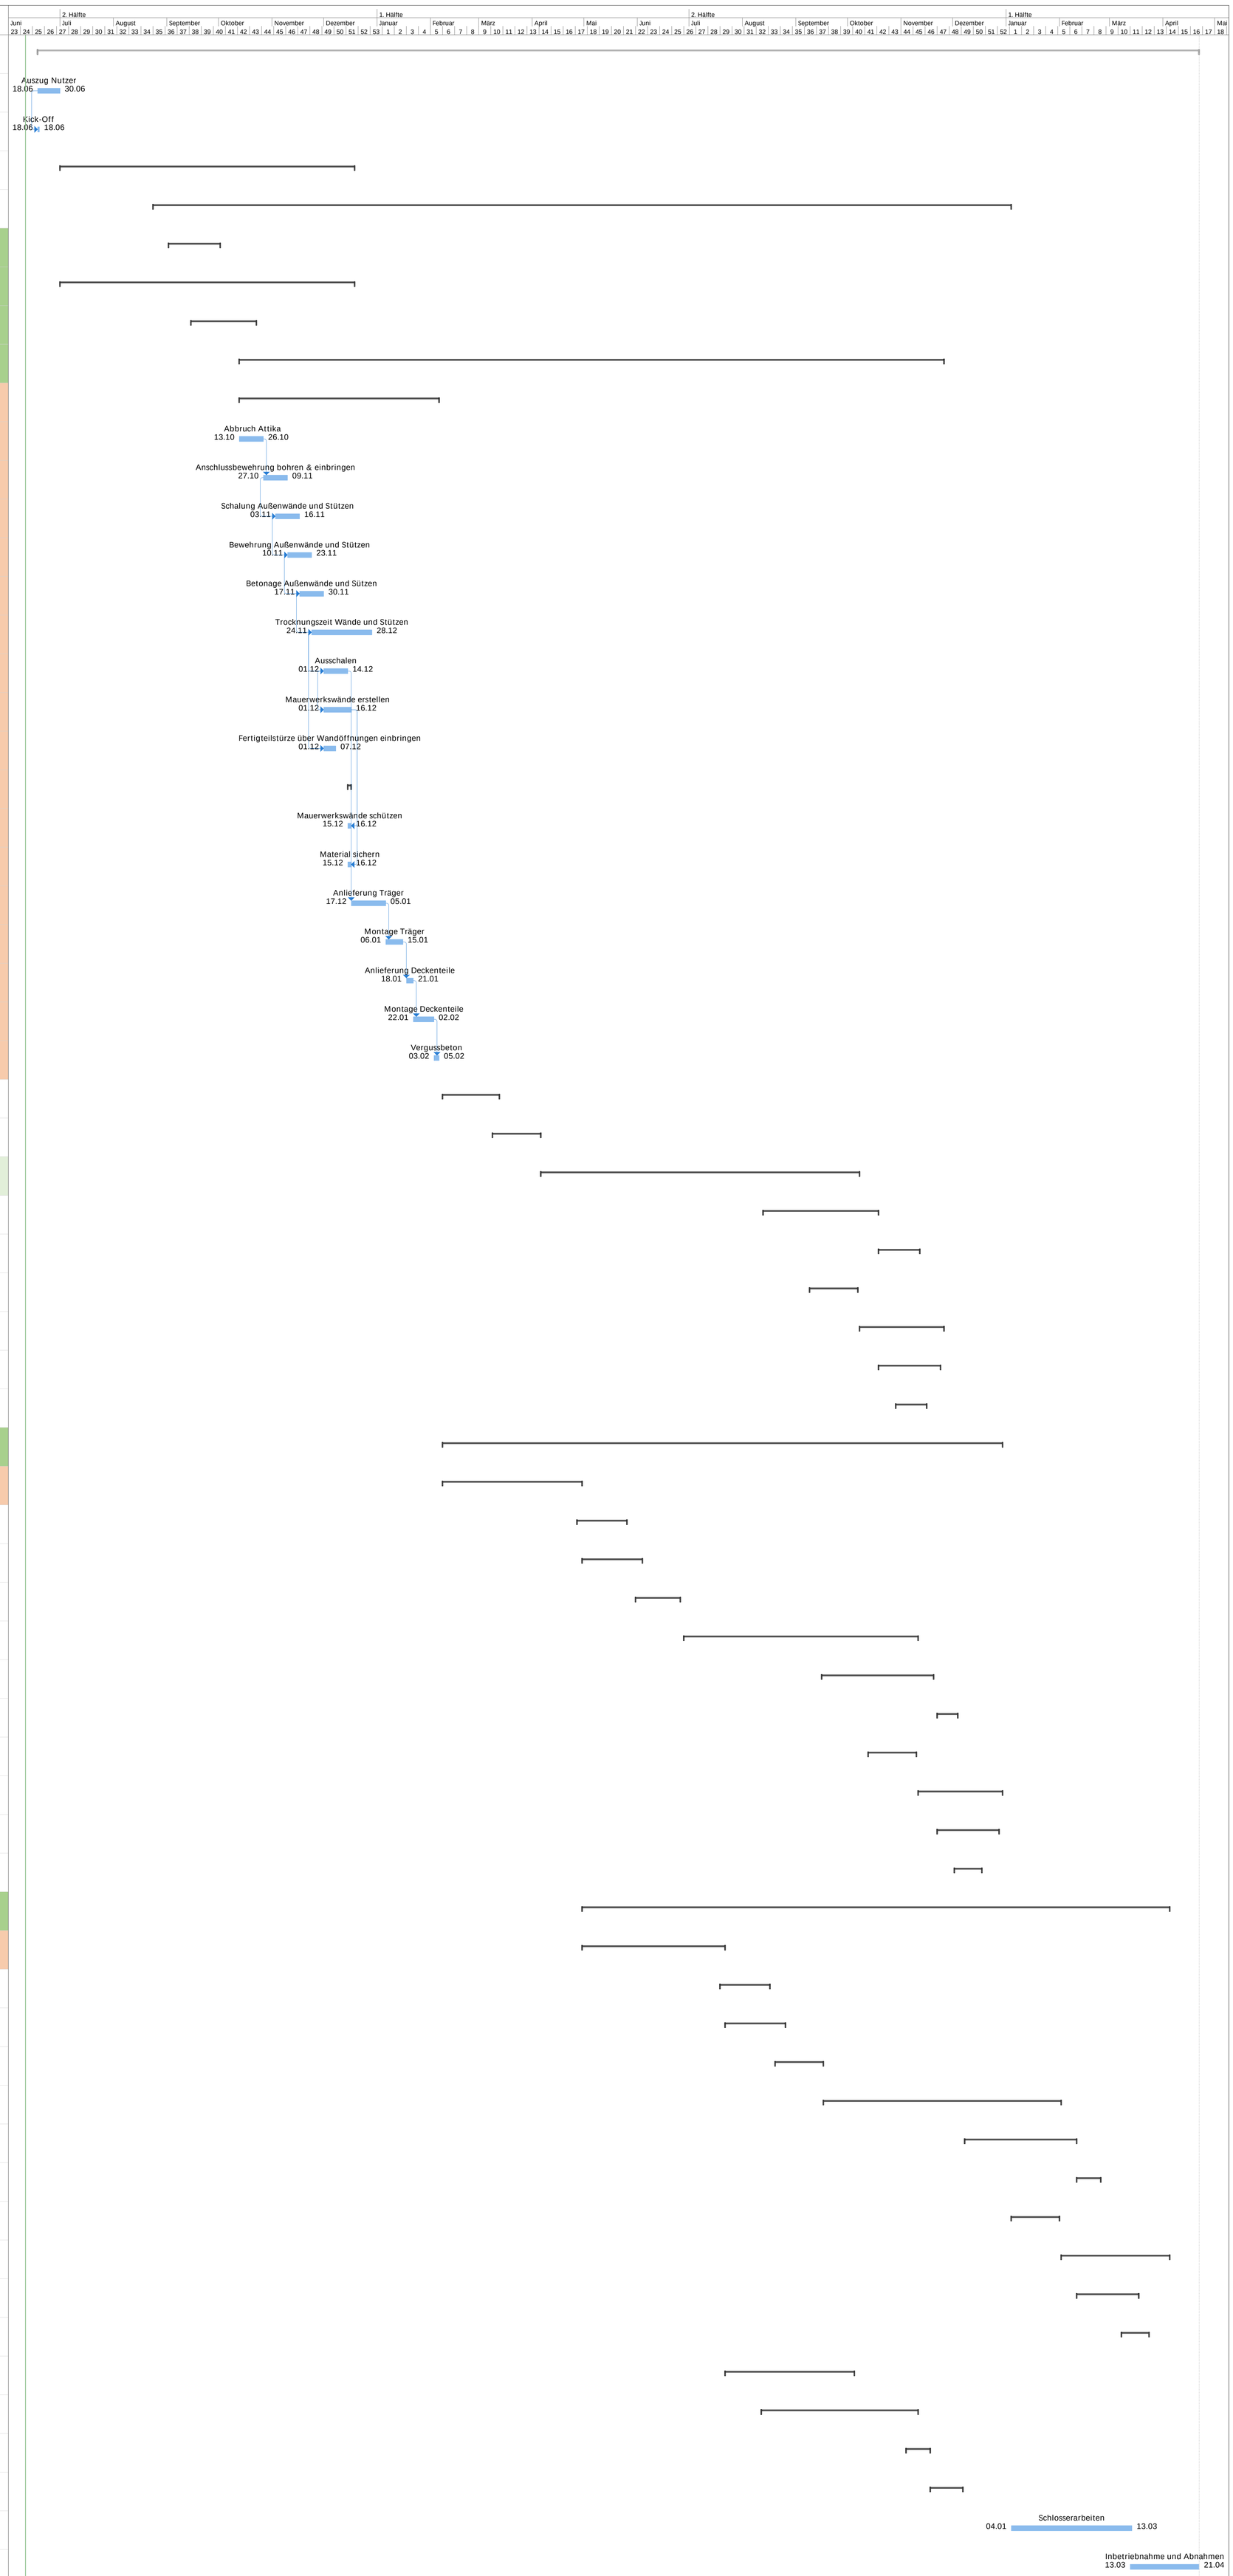

Projekt: 260611 RA Bauablaufp
Datum: Don 11.06.26

Vorgang · Meilenstein · Projektsammelvorgang · Inaktiver Meilenstein · Manueller Vorgang · Manueller Sammelrollup · Nur Anfang · Externe Vorgänge · Stichtag · Manueller Fortschritt
Unterbrechung · Sammelvorgang · Inaktiver Vorgang · Inaktiver Sammelvorgang · Nur Dauer · Manueller Sammelvorgang · Nur Ende · Externer Meilenstein · In Arbeit
