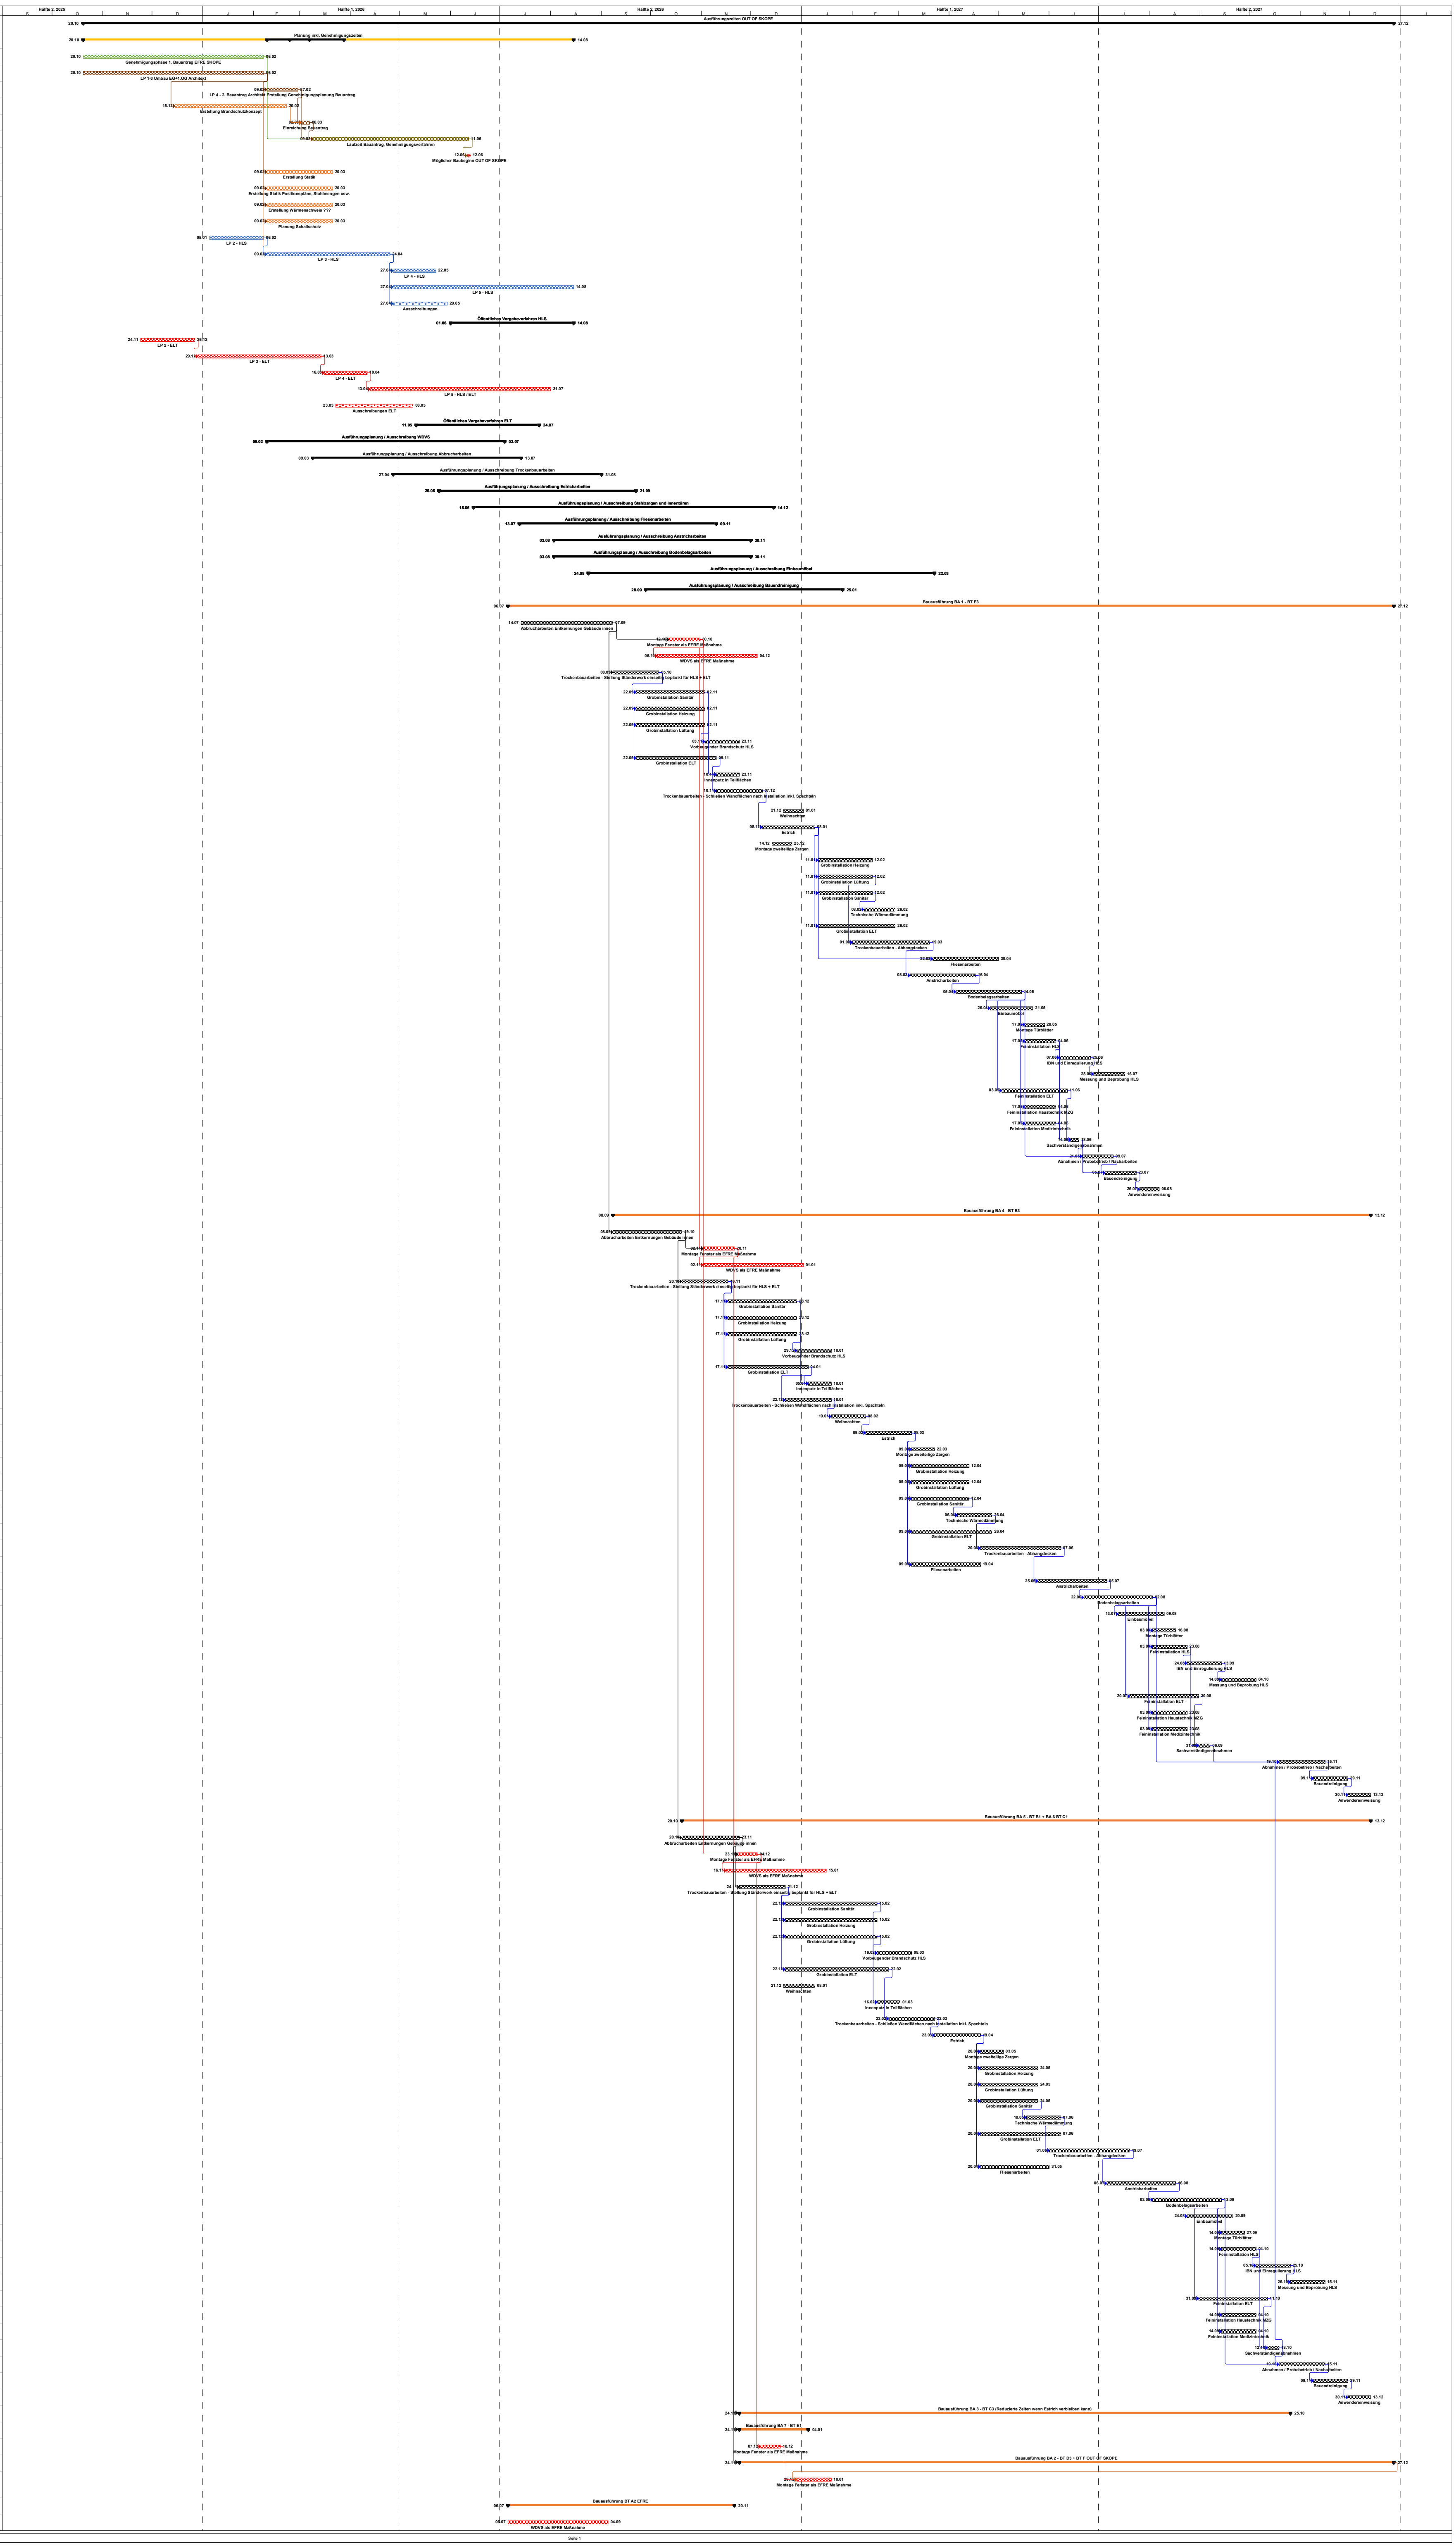Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	**Ausführungszeiten OUT OF SKOPE**	**571 Tage**	**Mon 20.10.25**	**Mon 27.12.27**	
2	**Planung inkl. Genehmigungszeiten**	**215 Tage**	**Mon 20.10.25**	**Fre 14.08.26**	
3	Genehmigungsphase 1. Bauantrag EFRE SKOPE	80 Tage	Mon 20.10.25	Fre 06.02.26	
4	LP 1-3 Umbau EG+1.OG Architekt	80 Tage	Mon 20.10.25	Fre 06.02.26	
5	LP 4 - 2. Bauantrag Architekt Erstellung Genehmigungsplanung Bauantrag	15 Tage	Mon 09.02.26	Fre 27.02.26	4
6	Erstellung Brandschutzkonzept	50 Tage	Mon 15.12.25	Fre 20.02.26	4EA-40 Tage
7	Einreichung Bauantrag	5 Tage	Mon 02.03.26	Fre 06.03.26	6;5
8	Laufzeit Bauantrag, Genehmigungsverfahren	69 Tage	Mon 09.03.26	Don 11.06.26	7;5;3EA+5 Tage
9	Möglicher Baubeginn OUT OF SKOPE	1 Tag	Fre 12.06.26	Fre 12.06.26	8
10	Erstellung Statik	30 Tage	Mon 09.02.26	Fre 20.03.26	4
11	Erstellung Statik Positionspläne, Stahlmengen usw.	30 Tage	Mon 09.02.26	Fre 20.03.26	4
12	Erstellung Wärmenachweis ???	30 Tage	Mon 09.02.26	Fre 20.03.26	4
13	Planung Schallschutz	30 Tage	Mon 09.02.26	Fre 20.03.26	4
14	LP 2 - HLS	25 Tage	Mon 05.01.26	Fre 06.02.26	
15	LP 3 - HLS	55 Tage	Mon 09.02.26	Fre 24.04.26	4;14
16	LP 4 - HLS	20 Tage	Mon 27.04.26	Fre 22.05.26	15
17	LP 5 - HLS	80 Tage	Mon 27.04.26	Fre 14.08.26	15
18	Ausschreibungen	25 Tage	Mon 27.04.26	Fre 29.05.26	15
19	**Öffentliches Vergabeverfahren HLS**	**55 Tage**	**Mon 01.06.26**	**Fre 14.08.26**	
29	LP 2 - ELT	25 Tage	Mon 24.11.25	Fre 26.12.25	
30	LP 3 - ELT	55 Tage	Mon 29.12.25	Fre 13.03.26	29
31	LP 4 - ELT	20 Tage	Mon 16.03.26	Fre 10.04.26	30
32	LP 5 - HLS / ELT	80 Tage	Mon 13.04.26	Fre 31.07.26	31
33	Ausschreibungen ELT	35 Tage	Mon 23.03.26	Fre 08.05.26	
34	**Öffentliches Vergabeverfahren ELT**	**55 Tage**	**Mon 11.05.26**	**Fre 24.07.26**	
44	**Ausführungsplanung / Ausschreibung WDVS**	**105 Tage**	**Mon 09.02.26**	**Fre 03.07.26**	
57	**Ausführungsplanung / Ausschreibung Abbrucharbeiten**	**91 Tage**	**Mon 09.03.26**	**Mon 13.07.26**	
70	**Ausführungsplanung / Ausschreibung Trockenbauarbeiten**	**91 Tage**	**Mon 27.04.26**	**Mon 31.08.26**	
83	**Ausführungsplanung / Ausschreibung Estricharbeiten**	**86 Tage**	**Mon 25.05.26**	**Mon 21.09.26**	
96	**Ausführungsplanung / Ausschreibung Stahlzargen und Innentüren**	**131 Tage**	**Mon 15.06.26**	**Mon 14.12.26**	
110	**Ausführungsplanung / Ausschreibung Fliesenarbeiten**	**86 Tage**	**Mon 13.07.26**	**Mon 09.11.26**	
123	**Ausführungsplanung / Ausschreibung Anstricharbeiten**	**86 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Mon 30.11.26**	
136	**Ausführungsplanung / Ausschreibung Bodenbelagsarbeiten**	**86 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Mon 30.11.26**	
149	**Ausführungsplanung / Ausschreibung Einbaumöbel**	**151 Tage**	**Mon 24.08.26**	**Mon 22.03.27**	
163	**Ausführungsplanung / Ausschreibung Bauendreinigung**	**86 Tage**	**Mon 28.09.26**	**Mon 25.01.27**	
176	**Bauausführung BA 1 - BT E3**	**386 Tage**	**Mon 06.07.26**	**Mon 27.12.27**	
177	Abbrucharbeiten Entkernungen Gebäude innen	40 Tage	Die 14.07.26	Mon 07.09.26	68;69;55
178	Montage Fenster als EFRE Maßnahme	15 Tage	Mon 12.10.26	Fre 30.10.26	177EA-10 Tage
179	WDVS als EFRE Maßnahme	45 Tage	Mon 05.10.26	Fre 04.12.26	178EA-20 Tage;56
180	Trockenbauarbeiten - Stellung Ständerwerk einseitig beplankt für HLS + ELT	20 Tage	Die 08.09.26	Mon 05.10.26	177;81
181	Grobinstallation Sanitär	30 Tage	Die 22.09.26	Mon 02.11.26	28;43;180EA-10 Tage
182	Grobinstallation Heizung	30 Tage	Die 22.09.26	Mon 02.11.26	28;43;180EA-10 Tage
183	Grobinstallation Lüftung	30 Tage	Die 22.09.26	Mon 02.11.26	28;43;180EA-10 Tage
184	Vorbeugender Brandschutz HLS	15 Tage	Die 03.11.26	Mon 23.11.26	183;28;43
185	Grobinstallation ELT	35 Tage	Die 22.09.26	Mon 09.11.26	28;43;180EA-10 Tage
186	Innenputz in Teilflächen	10 Tage	Die 10.11.26	Mon 23.11.26	181;185
187	Trockenbauarbeiten - Schließen Wandflächen nach Installation inkl. Spachteln	20 Tage	Die 10.11.26	Mon 07.12.26	185
188	Weihnachten	10 Tage	Mon 21.12.26	Fre 01.01.27	
189	Estrich	24 Tage	Die 08.12.26	Fre 08.01.27	187;94;107;121;134;147
190	Montage zweiteilige Zargen	10 Tage	Mon 14.12.26	Fre 25.12.26	108
191	Grobinstallation Heizung	25 Tage	Mon 11.01.27	Fre 12.02.27	189
192	Grobinstallation Lüftung	25 Tage	Mon 11.01.27	Fre 12.02.27	189
193	Grobinstallation Sanitär	25 Tage	Mon 11.01.27	Fre 12.02.27	189
194	Technische Wärmedämmung	15 Tage	Mon 08.02.27	Fre 26.02.27	193EA-5 Tage
195	Grobinstallation ELT	35 Tage	Mon 11.01.27	Fre 26.02.27	189
196	Trockenbauarbeiten - Abhangdecken	35 Tage	Mon 01.02.27	Fre 19.03.27	192EA-10 Tage
197	Fliesenarbeiten	30 Tage	Mon 22.03.27	Fre 30.04.27	189;121;134;147;161
198	Anstricharbeiten	30 Tage	Mon 08.03.27	Fre 16.04.27	196EA-10 Tage
199	Bodenbelagsarbeiten	30 Tage	Mon 05.04.27	Fre 14.05.27	198EA-10 Tage;147;161
200	Einbaumöbel	20 Tage	Mon 26.04.27	Fre 21.05.27	199EA-15 Tage;161
201	Montage Türblätter	10 Tage	Mon 17.05.27	Fre 28.05.27	199
202	Feininstallation HLS	15 Tage	Mon 17.05.27	Fre 04.06.27	199
203	IBN und Einregulierung HLS	15 Tage	Mon 07.06.27	Fre 25.06.27	202
204	Messung und Beprobung HLS	15 Tage	Mon 28.06.27	Fre 16.07.27	203
205	Feininstallation ELT	30 Tage	Mon 03.05.27	Fre 11.06.27	199EA-10 Tage
206	Feininstallation Haustechnik MZG	15 Tage	Mon 17.05.27	Fre 04.06.27	199
207	Feininstallation Medizintechnik	15 Tage	Mon 17.05.27	Fre 04.06.27	199
208	Sachverständigenabnahmen	5 Tage	Mon 14.06.27	Fre 18.06.27	207;205;202
209	Abnahmen / Probebetrieb / Nacharbeiten	15 Tage	Mon 21.06.27	Fre 09.07.27	199;208
210	Bauendreinigung	15 Tage	Mon 05.07.27	Fre 23.07.27	209EA-5 Tage;208EA-5 Tage
211	Anwendereinweisung	10 Tage	Mon 26.07.27	Fre 06.08.27	210
212	**Bauausführung BA 4 - BT B3**	**330 Tage**	**Die 08.09.26**	**Mon 13.12.27**	
213	Abbrucharbeiten Entkernungen Gebäude innen	30 Tage	Die 08.09.26	Mon 19.10.26	177
214	Montage Fenster als EFRE Maßnahme	15 Tage	Mon 02.11.26	Fre 20.11.26	213EA-10 Tage;178
215	WDVS als EFRE Maßnahme	45 Tage	Mon 02.11.26	Fre 01.01.27	214EA-15 Tage;56
216	Trockenbauarbeiten - Stellung Ständerwerk einseitig beplankt für HLS + ELT	20 Tage	Die 20.10.26	Mon 16.11.26	213
217	Grobinstallation Sanitär	30 Tage	Die 17.11.26	Mon 28.12.26	216
218	Grobinstallation Heizung	30 Tage	Die 17.11.26	Mon 28.12.26	216
219	Grobinstallation Lüftung	30 Tage	Die 17.11.26	Mon 28.12.26	216
220	Vorbeugender Brandschutz HLS	15 Tage	Die 29.12.26	Mon 18.01.27	219
221	Grobinstallation ELT	35 Tage	Die 17.11.26	Mon 04.01.27	216
222	Innenputz in Teilflächen	10 Tage	Die 05.01.27	Mon 18.01.27	217;221
223	Trockenbauarbeiten - Schließen Wandflächen nach Installation inkl. Spachteln	20 Tage	Die 22.12.26	Mon 18.01.27	221EA-10 Tage
224	Weihnachten	15 Tage	Die 19.01.27	Mon 08.02.27	223
225	Estrich	20 Tage	Die 09.02.27	Mon 08.03.27	224
226	Montage zweiteilige Zargen	10 Tage	Die 09.03.27	Mon 22.03.27	225
227	Grobinstallation Heizung	25 Tage	Die 09.03.27	Mon 12.04.27	225
228	Grobinstallation Lüftung	25 Tage	Die 09.03.27	Mon 12.04.27	225
229	Grobinstallation Sanitär	25 Tage	Die 09.03.27	Mon 12.04.27	225
230	Technische Wärmedämmung	15 Tage	Die 06.04.27	Mon 26.04.27	229EA-5 Tage
231	Grobinstallation ELT	35 Tage	Die 09.03.27	Mon 26.04.27	225
232	Trockenbauarbeiten - Abhangdecken	35 Tage	Die 20.04.27	Mon 07.06.27	230EA-5 Tage
233	Fliesenarbeiten	30 Tage	Die 09.03.27	Mon 19.04.27	225
234	Anstricharbeiten	30 Tage	Die 25.05.27	Mon 05.07.27	232EA-10 Tage
235	Bodenbelagsarbeiten	30 Tage	Die 22.06.27	Mon 02.08.27	234EA-10 Tage
236	Einbaumöbel	20 Tage	Die 13.07.27	Mon 09.08.27	235EA-15 Tage
237	Montage Türblätter	10 Tage	Die 03.08.27	Mon 16.08.27	235
238	Feininstallation HLS	15 Tage	Die 03.08.27	Mon 23.08.27	235
239	IBN und Einregulierung HLS	15 Tage	Die 24.08.27	Mon 13.09.27	238
240	Messung und Beprobung HLS	15 Tage	Die 14.09.27	Mon 04.10.27	239
241	Feininstallation ELT	30 Tage	Die 20.07.27	Mon 30.08.27	235EA-10 Tage
242	Feininstallation Haustechnik MZG	15 Tage	Die 03.08.27	Mon 23.08.27	235
243	Feininstallation Medizintechnik	15 Tage	Die 03.08.27	Mon 23.08.27	235
244	Sachverständigenabnahmen	5 Tage	Die 31.08.27	Mon 06.09.27	238;241
245	Abnahmen / Probebetrieb / Nacharbeiten	20 Tage	Die 19.10.27	Mon 15.11.27	235;244;280
246	Bauendreinigung	15 Tage	Die 09.11.27	Mon 29.11.27	245EA-5 Tage
247	Anwendereinweisung	10 Tage	Die 30.11.27	Mon 13.12.27	246
248	Bauausführung BA 5 - BT B1 + BA 6 BT C1	300 Tage	Die 20.10.26	Mon 13.12.27	
249	Abbrucharbeiten Entkernungen Gebäude innen	25 Tage	Die 20.10.26	Mon 23.11.26	213
250	Montage Fenster als EFRE Maßnahme	10 Tage	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26	178;249EA-10 Tage;214
251	WDVS als EFRE Maßnahme	45 Tage	Mon 16.11.26	Fre 15.01.27	250EA-15 Tage;56
252	Trockenbauarbeiten - Stellung Ständerwerk einseitig beplankt für HLS + ELT	20 Tage	Die 24.11.26	Mon 21.12.26	249
253	Grobinstallation Sanitär	40 Tage	Die 22.12.26	Mon 15.02.27	252
254	Grobinstallation Heizung	40 Tage	Die 22.12.26	Mon 15.02.27	252
255	Grobinstallation Lüftung	40 Tage	Die 22.12.26	Mon 15.02.27	252
256	Vorbeugender Brandschutz HLS	15 Tage	Die 16.02.27	Mon 08.03.27	255
257	Grobinstallation ELT	45 Tage	Die 22.12.26	Mon 22.02.27	252
258	Weihnachten	15 Tage	Mon 21.12.26	Fre 08.01.27	
259	Innenputz in Teilflächen	10 Tage	Die 16.02.27	Mon 01.03.27	253
260	Trockenbauarbeiten - Schließen Wandflächen nach Installation inkl. Spachteln	20 Tage	Die 23.02.27	Mon 22.03.27	257
261	Estrich	20 Tage	Die 23.03.27	Mon 19.04.27	260
262	Montage zweiteilige Zargen	10 Tage	Die 20.04.27	Mon 03.05.27	261
263	Grobinstallation Heizung	25 Tage	Die 20.04.27	Mon 24.05.27	261
264	Grobinstallation Lüftung	25 Tage	Die 20.04.27	Mon 24.05.27	261
265	Grobinstallation Sanitär	25 Tage	Die 20.04.27	Mon 24.05.27	261
266	Technische Wärmedämmung	15 Tage	Die 18.05.27	Mon 07.06.27	265EA-5 Tage
267	Grobinstallation ELT	35 Tage	Die 20.04.27	Mon 07.06.27	261
268	Trockenbauarbeiten - Abhangdecken	35 Tage	Die 01.06.27	Mon 19.07.27	266EA-5 Tage
269	Fliesenarbeiten	30 Tage	Die 20.04.27	Mon 31.05.27	261
270	Anstricharbeiten	30 Tage	Die 06.07.27	Mon 16.08.27	268EA-10 Tage
271	Bodenbelagsarbeiten	30 Tage	Die 03.08.27	Mon 13.09.27	270EA-10 Tage
272	Einbaumöbel	20 Tage	Die 24.08.27	Mon 20.09.27	271EA-15 Tage
273	Montage Türblätter	10 Tage	Die 14.09.27	Mon 27.09.27	271
274	Feininstallation HLS	15 Tage	Die 14.09.27	Mon 04.10.27	271
275	IBN und Einregulierung HLS	15 Tage	Die 05.10.27	Mon 25.10.27	274
276	Messung und Beprobung HLS	15 Tage	Die 26.10.27	Mon 15.11.27	275
277	Feininstallation ELT	30 Tage	Die 31.08.27	Mon 11.10.27	271EA-10 Tage
278	Feininstallation Haustechnik MZG	15 Tage	Die 14.09.27	Mon 04.10.27	271
279	Feininstallation Medizintechnik	15 Tage	Die 14.09.27	Mon 04.10.27	271
280	Sachverständigenabnahmen	5 Tage	Die 12.10.27	Mon 18.10.27	277;274
281	Abnahmen / Probebetrieb / Nacharbeiten	20 Tage	Die 19.10.27	Mon 15.11.27	271;280
282	Bauendreinigung	15 Tage	Die 09.11.27	Mon 29.11.27	281EA-5 Tage
283	Anwendereinweisung	10 Tage	Die 30.11.27	Mon 13.12.27	282
284	Bauausführung BA 3 - BT C3 (Reduzierte Zeiten wenn Estrich verbleiben kann)	240 Tage	Die 24.11.26	Mon 25.10.27	249
285	Bauausführung BA 7 - BT E1	30 Tage	Die 24.11.26	Mon 04.01.27	249
286	Montage Fenster als EFRE Maßnahme	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26	250
287	Bauausführung BA 2 - BT D3 + BT F OUT OF SKOPE	285 Tage	Die 24.11.26	Mon 27.12.27	249
288	Montage Fenster als EFRE Maßnahme	15 Tage	Die 29.12.26	Mon 18.01.27	286;287EA-260 Tage
289	Bauausführung BT A2 EFRE	100 Tage	Mon 06.07.26	Fre 20.11.26	
290	WDVS als EFRE Maßnahme	45 Tage	Mon 06.07.26	Fre 04.09.26	56
