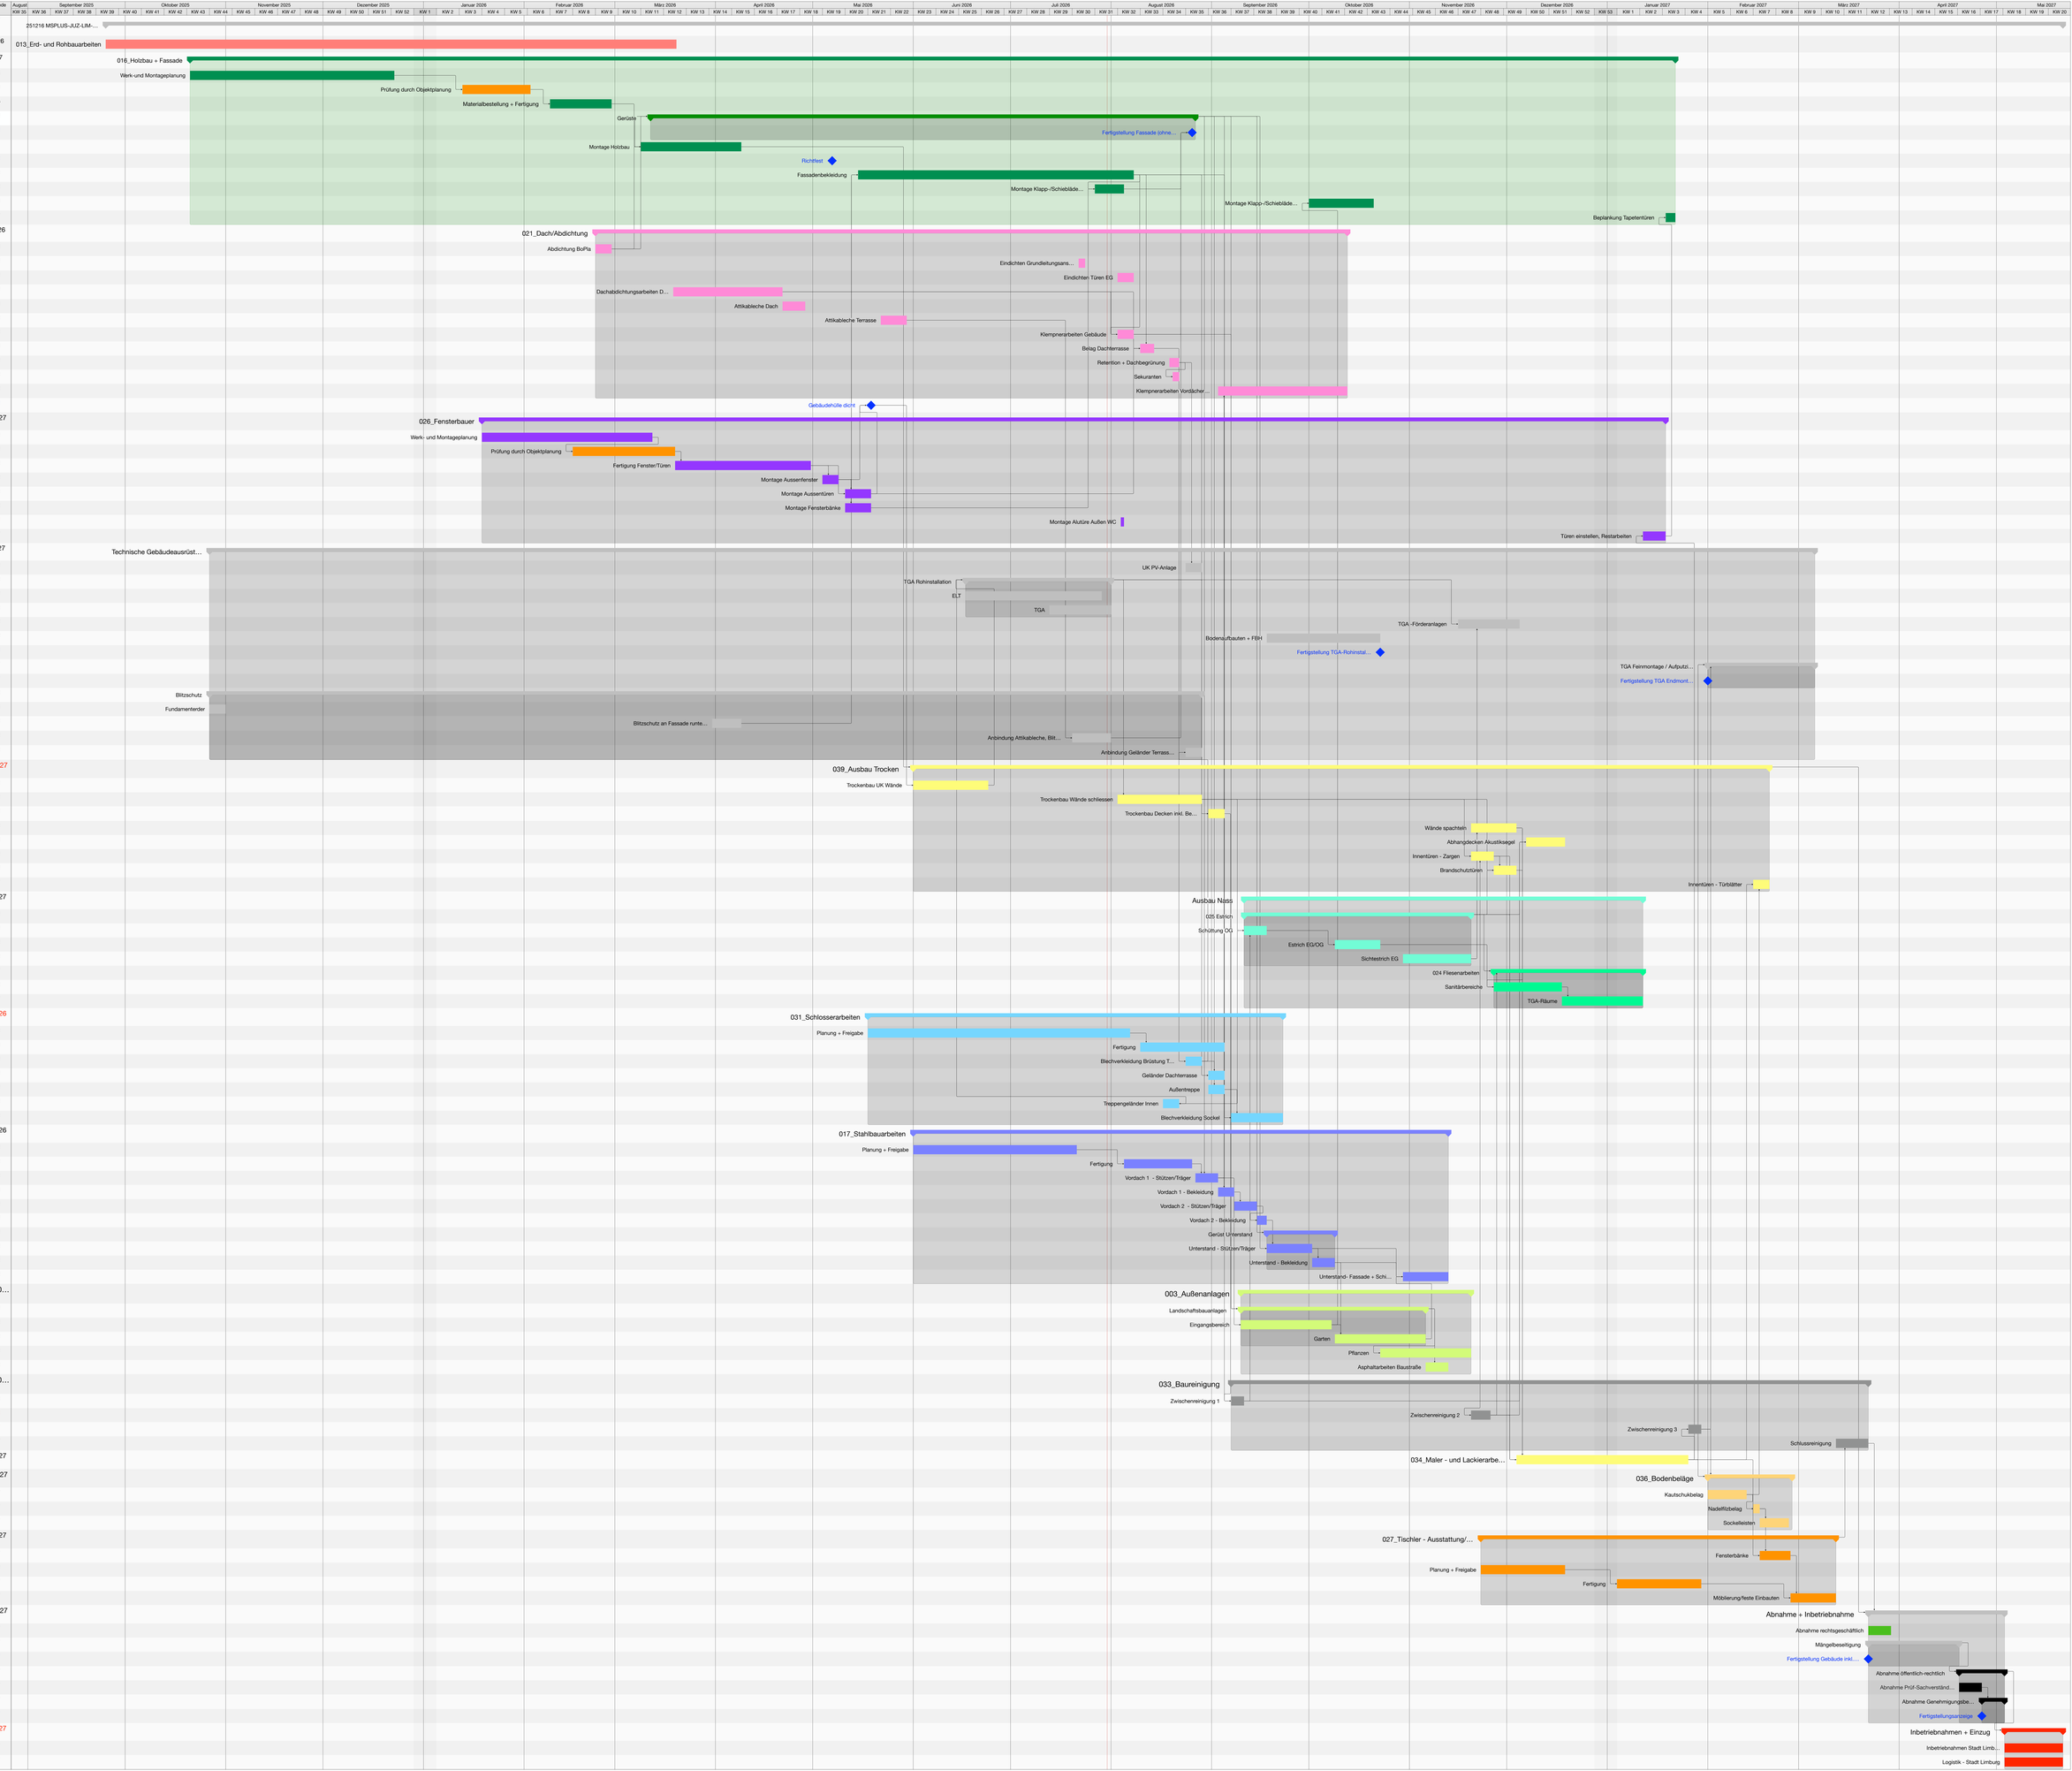#	Info	Titel	Erwarteter Start	Erwartetes Ende
0		251216 MSPLUS-JUZ-LIM-Blauzeitenplan nach Gewerken_Mellensteine	25.09.2025	21.05.2027
1		013_Erd- und Rohbauarbeiten	25.09.2025	19.03.2026
12		016_Holzbau + Fassade	21.10.2025	21.01.2027
13		Werk-und Montageplanung	21.10.2025	22.12.2025
14		Prüfung durch Objektplanung	13.01.2026	02.02.2026
15		Materialbestellung + Fertigung	09.02.2026	27.02.2026
16		Gerüste	12.03.2026	27.08.2026
17		Fertigstellung Fassade (ohne Schiebeläden EG)	26.08.2026	26.08.2026
18		Montage Holzbau	09.03.2026	08.04.2026
24		Richtfest	06.05.2026	06.05.2026
25		Fassadenbekleidung	15.05.2026	07.08.2026
26		Montage Klapp-/Schiebläden OG	27.07.2026	04.08.2026
27		Montage Klapp-/Schiebläden EG inkl. Rinne	01.10.2026	20.10.2026
28		Beplankung Tapetentüren	19.01.2027	21.01.2027
29		021_Dach/Abdichtung	23.02.2026	12.10.2026
30		Abdichtung BoPla	23.02.2026	27.02.2026
31		Eindichten Grundleitungsanschlüsse	22.07.2026	23.07.2026
32		Eindichten Türen EG	03.08.2026	07.08.2026
33		Dachabdichtungsarbeiten Dach + Terrasse	19.03.2026	21.04.2026
36		Attikableche Dach	21.04.2026	28.04.2026
37		Attikableche Terrasse	22.05.2026	29.05.2026
38		Klempnerarbeiten Gebäude	03.08.2026	07.08.2026
39		Belag Dachterrasse	10.08.2026	14.08.2026
40		Retention + Dachbegrünung	19.08.2026	21.08.2026
41		Sekuranten	20.08.2026	21.08.2026
42		Klempnerarbeiten Vordächer + Unterstand	03.09.2026	12.10.2026
43		Gebäudehülle dicht	18.05.2026	18.05.2026
44		026_Fensterbauer	19.01.2026	18.01.2027
45		Werk- und Montageplanung	19.01.2026	12.03.2026
46		Prüfung durch Objektplanung	16.02.2026	19.03.2026
47		Fertigung Fenster/Türen	19.03.2026	30.04.2026
48		Montage Aussenfenster	04.05.2026	08.05.2026
49		Montage Aussentüren	11.05.2026	18.05.2026
50		Montage Fensterbänke	11.05.2026	18.05.2026
51	!!!	Montage Alutüre Außen WC	04.08.2026	04.08.2026
52		Türen einstellen, Restarbeiten	12.01.2027	18.01.2027
53		Technische Gebäudeausrüstung	27.10.2025	05.03.2027
54		UK PV-Anlage	24.08.2026	28.08.2026
55		TGA Rohinstallation	17.06.2026	31.07.2026
56		ELT	17.06.2026	29.07.2026
57		TGA	13.07.2026	31.07.2026
58		TGA -Förderanlagen	16.11.2026	04.12.2026
59		Bodenaufbauten + FBH	18.09.2026	22.10.2026
65		Fertigstellung TGA-Rohinstallation	22.10.2026	22.10.2026
66		TGA Feinmontage / Aufputzinstallation	01.02.2027	05.03.2027
67		Fertigstellung TGA Endmontage	01.02.2027	01.02.2027
68		Blitzschutz	27.10.2025	28.08.2026
69		Fundamenterder	27.10.2025	31.10.2025
70		Blitzschutz an Fassade runterführen	31.03.2026	08.04.2026
71		Anbindung Attikableche, Blitzschutz Dach	20.07.2026	31.07.2026
72		Anbindung Geländer Terrasse, Außentreppe	24.08.2026	28.08.2026
73	!!!	039_Ausbau Trocken	01.06.2026	19.02.2027
74		Trockenbau UK Wände	01.06.2026	24.06.2026
75		Trockenbau Wände schliessen	03.08.2026	28.08.2026
76		Trockenbau Decken inkl. Beplankung	31.08.2026	04.09.2026
77		Wände spachteln	20.11.2026	03.12.2026
78		Abhangdecken Akustiksegel	07.12.2026	18.12.2026
79		Innentüren - Zargen	20.11.2026	26.11.2026
80		Brandschutztüren	27.11.2026	03.12.2026
81		Innentüren - Türblätter	15.02.2027	19.02.2027
82		Ausbau Nass	11.09.2026	11.01.2027
83		025 Estrich	11.09.2026	19.11.2026
84		Schüttung OG	11.09.2026	17.09.2026
85		Estrich EG/OG	09.10.2026	22.10.2026
86		Sichtestrich EG	30.10.2026	19.11.2026
87		024 Fliesenarbeiten	27.11.2026	11.01.2027
88		Sanitärbereiche	27.11.2026	17.12.2026
89		TGA-Räume	18.12.2026	11.01.2027
90	!!!	031_Schlosserarbeiten	18.05.2026	22.09.2026
91		Planung + Freigabe	18.05.2026	06.08.2026
92		Fertigung	10.08.2026	04.09.2026
93	!!!	Blechverkleidung Brüstung Terrasse	24.08.2026	28.08.2026
94		Geländer Dachterrasse	31.08.2026	04.09.2026
95		Außentreppe	31.08.2026	04.09.2026
96		Treppengeländer Innen	17.08.2026	21.08.2026
97		Blechverkleidung Sockel	07.09.2026	22.09.2026
98		017_Stahlbauarbeiten	01.06.2026	12.11.2026
99		Planung + Freigabe	01.06.2026	21.07.2026
100		Fertigung	05.08.2026	25.08.2026
101	!!!	Vordach 1 - Stützen/Träger	27.08.2026	02.09.2026
102		Vordach 1 - Bekleidung	03.09.2026	07.09.2026
103		Vordach 2 - Stützen/Träger	08.09.2026	14.09.2026
104		Vordach 2 - Bekleidung	15.09.2026	17.09.2026
105		Gerüst Unterstand	18.09.2026	08.10.2026
106		Unterstand - Stützen/Träger	18.09.2026	01.10.2026
107		Unterstand - Bekleidung	02.10.2026	08.10.2026
108		Unterstand- Fassade + Schiebetor	30.10.2026	12.11.2026
109		003_Außenanlagen	10.09.2…	19.11.20…
110		Landschaftsbauanlagen	10.09.2026	05.11.2026
111		Eingangsbereich	10.09.2026	07.10.2026
112		Garten	09.10.2026	05.11.2026
113		Pflanzen	23.10.2026	19.11.2026
114		Asphaltarbeiten Baustraße	06.11.2026	12.11.2026
115		033_Baureinigung	07.09.2…	22.03.20…
116		Zwischenreinigung 1	07.09.2026	10.09.2026
117	!!!	Zwischenreinigung 2	20.11.2026	25.11.2026
118	!!!	Zwischenreinigung 3	26.01.2027	29.01.2027
119		Schlussreinigung	12.03.2027	22.03.2027
120		034_Maler - und Lackierarbeiten	04.12.2026	25.01.2027
121		036_Bodenbeläge	01.02.2027	26.02.2027
122		Kautschukbelag	01.02.2027	12.02.2027
123		Nadelfilzbelag	15.02.2027	16.02.2027
124		Sockelleisten	17.02.2027	25.02.2027
125		027_Tischler - Ausstattung/ Fensterbänke	23.11.2026	12.03.2027
126		Fensterbänke	17.02.2027	26.02.2027
127		Planung + Freigabe	23.11.2026	18.12.2026
128		Fertigung	04.01.2027	29.01.2027
129		Möblierung/feste Einbauten	26.02.2027	12.03.2027
130		Abnahme + Inbetriebnahme	22.03.2027	03.05.2027
131		Abnahme rechtsgeschäftlich	22.03.2027	29.03.2027
132		Mängelbeseitigung	22.03.2027	19.04.2027
133		Fertigstellung Gebäude inkl. Mängelbeseitigung	22.03.2027	22.03.2027
134		Abnahme öffentlich-rechtlich	19.04.2027	03.05.2027
135		Abnahme Prüf-Sachverständige	19.04.2027	26.04.2027
136		Abnahme Genehmigungsbehörden	26.04.2027	03.05.2027
137		Fertigstellungsanzeige	26.04.2027	26.04.2027
138	!!!	Inbetriebnahmen + Einzug	03.05.2027	21.05.2027
139		Inbetriebnahmen Stadt Limburg	03.05.2027	21.05.2027
140		Logistik - Stadt Limburg	03.05.2027	21.05.2027
