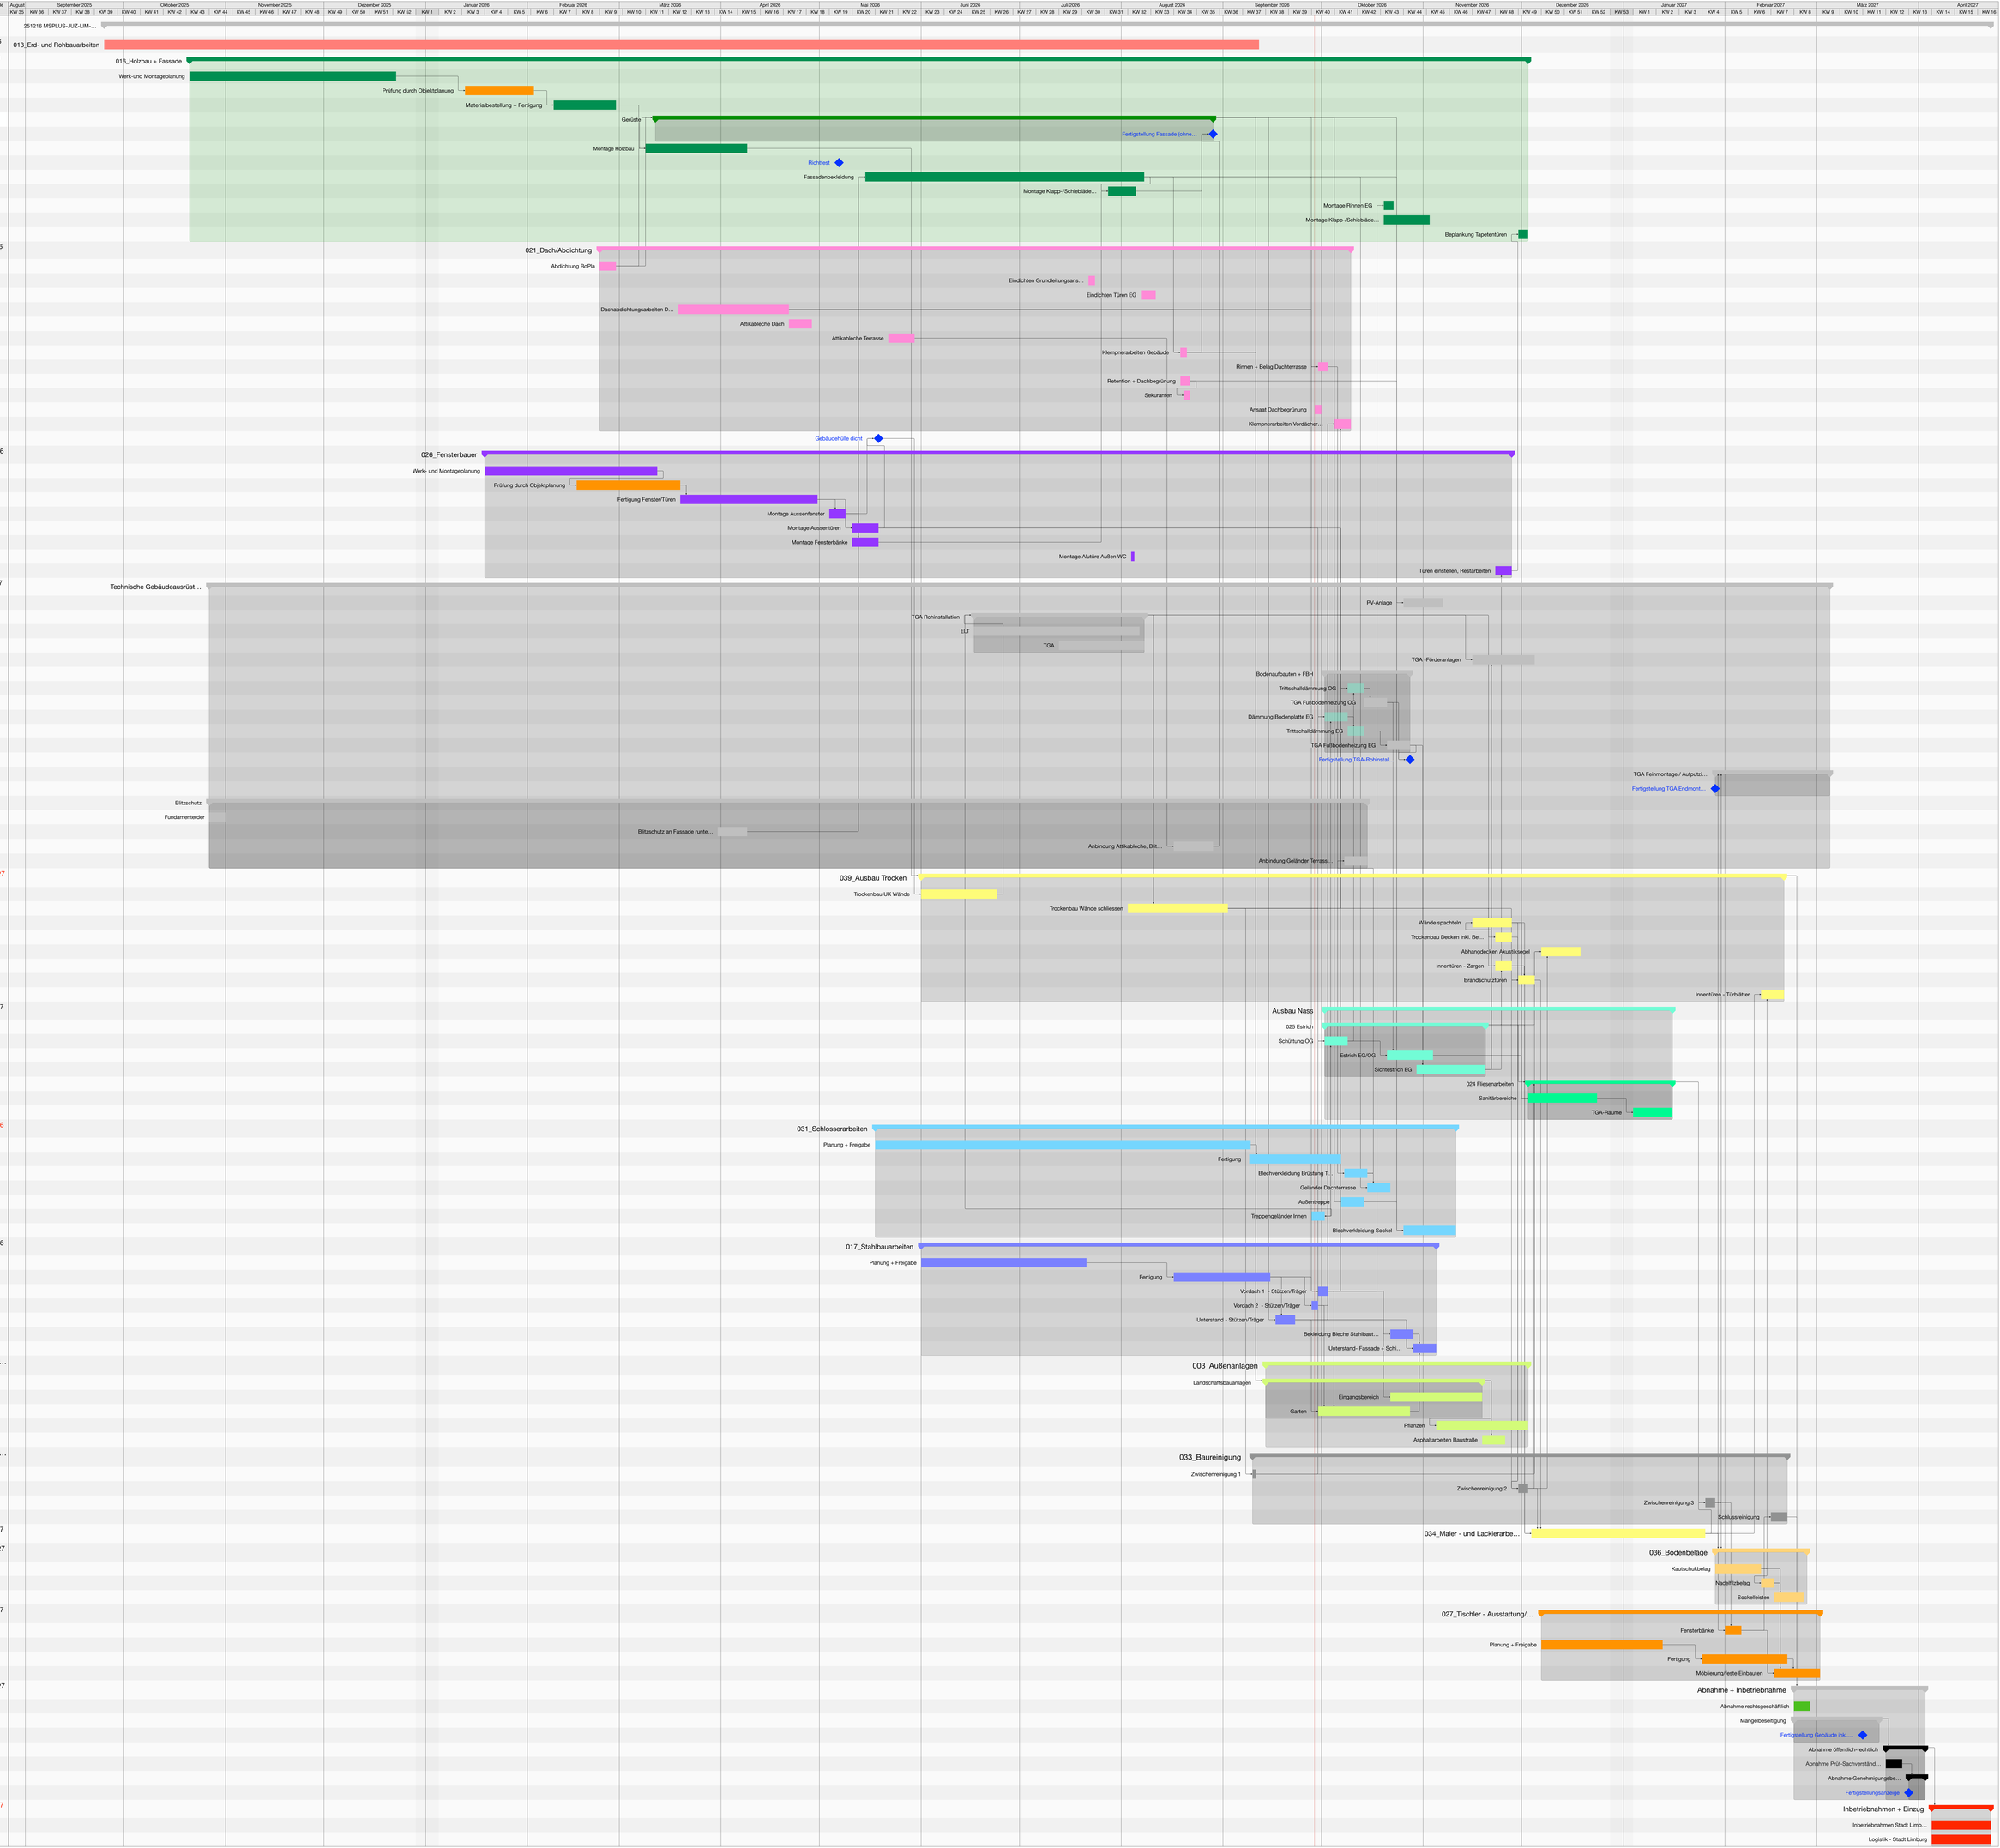#	Info	Titel	Erwarteter Start	Erwartetes Ende
0		251216 MSPLUS-JUIZ-LIM-Bauzeitenplan nach Gewerken_Meilensteine	25.09.2025	22.04.2027
1		013_Erd- und Rohbauarbeiten	25.09.2025	11.09.2026
13		016_Holzbau + Fassade	21.10.2025	02.12.2026
14		Werk- und Montageplanung	21.10.2025	22.12.2025
15		Prüfung durch Objektplanung	13.01.2026	02.02.2026
16		Materialbestellung + Fertigung	09.02.2026	27.02.2026
17		Gerüste	12.03.2026	28.08.2026
18		Fertigstellung Fassade (ohne Schiebeläden EG)	28.08.2026	28.08.2026
19		Montage Holzbau	09.03.2026	08.04.2026
25		Richtfest	06.05.2026	06.05.2026
26		Fassadenbekleidung	15.05.2026	07.08.2026
27		Montage Klapp-/Schiebläden OG	28.07.2026	05.08.2026
28		Montage Rinnen EG	20.10.2026	22.10.2026
29		Montage Klapp-/Schiebläden EG inkl. Rinne	20.10.2026	02.11.2026
30		Beplankung Tapetentüren	30.11.2026	02.12.2026
31		021_Dach/Abdichtung	23.02.2026	09.10.2026
32		Abdichtung BoPla	23.02.2026	27.02.2026
33		Eindichten Grundleitungsanschlüsse	22.07.2026	23.07.2026
34		Eindichten Türen EG	07.08.2026	11.08.2026
35		Dachabdichtungsarbeiten Dach + Terrasse	19.03.2026	21.04.2026
38		Attikableche Dach	21.04.2026	28.04.2026
39		Attikableche Terrasse	22.05.2026	29.05.2026
40		Klempnerarbeiten Gebäude	19.08.2026	20.08.2026
41		Rinnen + Belag Dachterrasse	30.09.2026	02.10.2026
42		Retention + Dachbegrünung	19.08.2026	21.08.2026
43		Sekuranten	20.08.2026	21.08.2026
44		Ansaat Dachbegrünung	29.09.2026	30.09.2026
45		Klempnerarbeiten Vordächer + Unterstand	05.10.2026	09.10.2026
46		Gebäudehülle dicht	18.05.2026	18.05.2026
47		026_Fensterbauer	19.01.2026	27.11.2026
48		Werk- und Montageplanung	19.01.2026	12.03.2026
49		Prüfung durch Objektplanung	16.02.2026	19.03.2026
50		Fertigung Fenster/Türen	19.03.2026	30.04.2026
51		Montage Aussenfenster	04.05.2026	08.05.2026
52		Montage Aussentüren	11.05.2026	18.05.2026
53		Montage Fensterbänke	11.05.2026	18.05.2026
54	!!!	Montage Alutüre Außen WC	04.08.2026	04.08.2026
55		Türen einstellen, Restarbeiten	23.11.2026	27.11.2026
56		Technische Gebäudeausrüstung	27.10.2025	04.03.2027
57		PV-Anlage	26.10.2026	06.11.2026
58		TGA Rohinstallation	17.06.2026	07.08.2026
59		ELT	17.06.2026	06.08.2026
60		TGA	13.07.2026	07.08.2026
61		TGA -Förderanlagen	16.11.2026	04.12.2026
62		Bodenaufbauten + FBH	02.10.2026	27.10.2026
63		Trittschalldämmung OG	09.10.2026	13.10.2026
64		TGA Fußbodenheizung OG	14.10.2026	20.10.2026
65		Dämmung Bodenplatte EG	02.10.2026	08.10.2026
66		Trittschalldämmung EG	09.10.2026	13.10.2026
67		TGA Fußbodenheizung EG	21.10.2026	27.10.2026
68		Fertigstellung TGA-Rohinstallation	27.10.2026	27.10.2026
69		TGA Feinmontage / Aufputzinstallation	29.01.2027	04.03.2027
70		Fertigstellung TGA Endmontage	29.01.2027	29.01.2027
71		Blitzschutz	27.10.2025	14.10.2026
72		Fundamenterder	27.10.2025	31.10.2025
73		Blitzschutz an Fassade runterführen	31.03.2026	08.04.2026
74		Anbindung Attikableche, Blitzschutz Dach	17.08.2026	28.08.2026
75		Anbindung Geländer Terrasse, Außentreppe	08.10.2026	14.10.2026
76	!!!	039_Ausbau Trocken	01.06.2026	18.02.2027
77		Trockenbau UK Wände	01.06.2026	24.06.2026
78		Trockenbau Wände schliessen	03.08.2026	02.09.2026
79		Wände spachteln	16.11.2026	27.11.2026
80		Trockenbau Decken inkl. Beplankung	23.11.2026	27.11.2026
81		Abhangdecken Akustiksegel	07.12.2026	18.12.2026
82		Innentüren - Zargen	23.11.2026	27.11.2026
83		Brandschutztüren	30.11.2026	04.12.2026
84		Innentüren - Türblätter	12.02.2027	18.02.2027
85		Ausbau Nass	02.10.2026	15.01.2027
86		025 Estrich	02.10.2026	19.11.2026
87		Schüttung OG	02.10.2026	08.10.2026
88		Estrich EG/OG	21.10.2026	03.11.2026
89		Sichtestrich EG	30.10.2026	19.11.2026
90		024 Fliesenarbeiten	03.12.2026	15.01.2027
91		Sanitärbereiche	03.12.2026	23.12.2026
92		TGA-Räume	04.01.2027	15.01.2027
93	!!!	031_Schlosserarbeiten	18.05.2026	10.11.2026
94		Planung + Freigabe	18.05.2026	09.09.2026
95		Fertigung	09.09.2026	06.10.2026
96		Blechverkleidung Brüstung Terrasse	08.10.2026	14.10.2026
97		Geländer Dachterrasse	15.10.2026	21.10.2026
98		Außentreppe	07.10.2026	13.10.2026
99		Treppengeländer Innen	28.09.2026	01.10.2026
100		Blechverkleidung Sockel	26.10.2026	10.11.2026
101		017_Stahlbauarbeiten	01.06.2026	04.11.2026
102		Planung + Freigabe	01.06.2026	21.07.2026
103		Fertigung	17.08.2026	15.09.2026
104		Vordach 1 - Stützen/Träger	30.09.2026	02.10.2026
105		Vordach 2 - Stützen/Träger	28.09.2026	29.09.2026
106		Unterstand - Stützen/Träger	17.09.2026	22.09.2026
107		Bekleidung Bleche Stahlbauten	22.10.2026	28.10.2026
108		Unterstand- Fassade + Schiebetor	29.10.2026	04.11.2026
109	!!!	003_Außenanlagen	14.09.2…	02.12.20…
110		Landschaftsbauanlagen	14.09.2026	18.11.2026
111		Eingangsbereich	22.10.2026	18.11.2026
112		Garten	30.09.2026	27.10.2026
113		Pflanzen	05.11.2026	02.12.2026
114		Asphaltarbeiten Baustraße	19.11.2026	25.11.2026
115		033_Baureinigung	10.09.2…	19.02.20…
116		Zwischenreinigung 1	10.09.2026	10.09.2026
117	!!!	Zwischenreinigung 2	30.11.2026	02.12.2026
118	!!!	Zwischenreinigung 3	26.01.2027	28.01.2027
119		Schlussreinigung	15.02.2027	19.02.2027
120		034_Maler - und Lackierarbeiten	04.12.2026	25.01.2027
121		036_Bodenbeläge	29.01.2027	25.02.2027
122		Kautschukbelag	29.01.2027	11.02.2027
123		Nadelfilzbelag	12.02.2027	15.02.2027
124		Sockelleisten	16.02.2027	24.02.2027
125		027_Tischler - Ausstattung/ Fensterbänke	07.12.2026	01.03.2027
126		Fensterbänke	01.02.2027	05.02.2027
127		Planung + Freigabe	07.12.2026	12.01.2027
128		Fertigung	25.01.2027	19.02.2027
129		Möblierung/feste Einbauten	16.02.2027	01.03.2027
130		Abnahme + Inbetriebnahme	22.02.2027	02.04.2027
131		Abnahme rechtsgeschäftlich	22.02.2027	26.02.2027
132		Mängelbeseitigung	22.02.2027	19.03.2027
133		Fertigstellung Gebäude inkl. Mängelbeseitigung	15.03.2027	15.03.2027
134		Abnahme öffentlich-rechtlich	22.03.2027	02.04.2027
135		Abnahme Prüf-Sachverständige	22.03.2027	26.03.2027
136		Abnahme Genehmigungsbehörden	29.03.2027	02.04.2027
137		Fertigstellungsanzeige	29.03.2027	29.03.2027
138	!!!	Inbetriebnahmen + Einzug	05.04.2027	22.04.2027
139		Inbetriebnahmen Stadt Limburg	05.04.2027	22.04.2027
140		Logistik - Stadt Limburg	05.04.2027	22.04.2027
