
| Nr. | | Geschoss | Vergabeeinheit | Vorgangsname | Anfang | Ende | Dauer | Vorgänger | % Abgeschlossen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | **Ausführungszeitraum Gesamtprojekt inkl. Inbetriebnahme und Umzug SKK** | **Fre 10.06.22** | **Don 21.06.29** | **1729 Tage?** | | 43% |
| 2 | ✓ | | V06 | **Rohbauarbeiten Hauptgebäude (Geb. 06)** | **Fre 26.08.22** | **Don 18.01.24** | **335 Tage** | | 100% |
| 12 | | | V06a | **Rohbauarbeiten Aufstockung Geb. 08, NEA u. Winkelstützwand** | **Fre 29.09.23** | **Die 13.07.27** | **922 Tage** | | 66% |
| 117 | | | | **Gebäudehülle (Geb. 06, Geb. 08 Aufstockung, Brückenbauwerk, Verbindungsgänge, NEA)** | **Mit 05.04.23** | **Mon 15.03.27** | **965 Tage** | | 62% |
| 235 | | | | **Feinterminplan _ Palliativbalkon** | **Fre 14.02.25** | **Mit 22.07.26** | **351,5 Tage** | | 27% |
| 264 | | | V08a/V08d | **Fassadenverkleidung Faser-Zement** | **Mon 02.10.23** | **Die 06.07.27** | **916 Tage** | | 50% |
| 301 | | | | **Stahlbau (Technikzentralen, Brückenbauwerk)** | **Die 30.05.23** | **Fre 20.08.27** | **1038 Tage** | | 43% |
| 328 | | | V06a | **Umbau im Bestand Haus 8** | **Mon 31.08.26** | **Fre 12.05.28** | **423 Tage** | | 0% |
| 350 | | | | **Innenausbau** | **Fre 10.06.22** | **Fre 26.05.28** | **1464 Tage?** | | 39% |
| 351 | | | | **Trockenbauarbeiten** | **Die 02.04.24** | **Die 14.09.27** | **852 Tage** | | 29% |
| 352 | ✓ | | V13 | **Vorbereitung** | **Die 02.04.24** | **Mon 24.06.24** | **57 Tage** | | 100% |
| 355 | | KG | V13/V13a/V13b | **Kellergeschoß** | **Mit 29.04.26** | **Mon 10.05.27** | **254,8 Tage** | | 2% |
| 362 | | SG | V13a/b | **Sockelgeschoß** | **Mon 09.03.26** | **Die 14.09.27** | **380 Tage** | | 8% |
| 371 | | EH | V13b | **Erdgeschoß** | **Mon 19.10.26** | **Die 17.08.27** | **205 Tage** | | 0% |
| 379 | | 1. OG | V13a/b | **1.Obergeschoß** | **Mon 09.03.26** | **Don 15.07.27** | **337 Tage** | | 6% |
| 388 | | 2. OG | V13/V13a/V13c | **2.Obergeschoß** | **Die 25.06.24** | **Mit 17.02.27** | **650 Tage** | | 63% |
| 389 | ✓ | 2. OG | V13 | Wände einseitig stellen | Die 25.06.24 | Fre 22.11.24 | 107 Tage | 354 | 100% |
| 390 | ✓ | 2. OG | V13 | Abstellung für Estrich | Mon 21.07.25 | Fre 01.08.25 | 10 Tage | 846AE | 100% |
| 391 | | 2. OG | V13a | Wände schliessen (Bäder) | Mon 09.03.26 | Fre 27.03.26 | 15 Tage | | 30% |
| 392 | | 2. OG | V13c | Wände umbauen/anpassen + schliessen | Mon 07.09.26 | Fre 02.10.26 | 20 Tage | 511EA-15 Tage | 90% |
| 393 | | 2. OG | V13c | Kritischer Meilenstein | Fre 02.10.26 | Fre 02.10.26 | 0 Tage | 392 | 0% |
| 394 | | 2. OG | V13c | **Decken** | **Mon 14.09.26** | **Mit 17.02.27** | **105 Tage** | | 0% |
| 395 | | 2. OG | V13c | **Unterkonstruktion + Fries (Flur)** | **Mon 14.09.26** | **Fre 09.10.26** | **20 Tage** | | 0% |
| 396 | | 2. OG | V13c | Brandabschnitt 3 | Mon 14.09.26 | Fre 25.09.26 | 10 Tage | 392AA+5 Tage | 0% |
| 397 | | 2. OG | V13c | Brandabschnitt 4 | Mon 28.09.26 | Fre 02.10.26 | 5 Tage | 396 | 0% |
| 398 | | 2. OG | V13c | Brandabschnitt 1 | Mon 05.10.26 | Fre 09.10.26 | 5 Tage | 397 | 0% |
| 399 | | 2. OG | V13c | Rasterdecke/Langfelddecke (Flur) | Mon 09.11.26 | Fre 04.12.26 | 20 Tage | 395EA+20 Tage;834 | 0% |
| 400 | | 2. OG | V13c | Unterkonstruktion + Fries | Mon 05.10.26 | Fre 23.10.26 | 15 Tage | 392 | 0% |
| 401 | | 2. OG | V13c | Rasterdecke/Langfelddecke | Don 28.01.27 | Mit 17.02.27 | 15 Tage | 400EA+60 Tage | 0% |
| 402 | | 3. OG | V13/V13a/V13c | **3.Obergeschoß** | **Mon 04.11.24** | **Fre 23.04.27** | **603 Tage** | | 30% |
| 413 | | 4. OG | V13/V13a/V13c | **4.Obergeschoß** | **Mon 11.11.24** | **Die 22.06.27** | **638 Tage** | | 37% |
| 424 | | 5. OG | V13/V13a/V13c | **5.Obergeschoß** | **Don 16.01.25** | **Die 03.08.27** | **629,5 Tage** | | 33% |
| 435 | | | V13a/c | **Treppenhäuser** | **Mit 08.04.26** | **Fre 25.09.26** | **120 Tage** | | 46% |
| 445 | | | V13b | **Aufstockung Geb. 08** | **Mon 19.10.26** | **Die 20.07.27** | **185 Tage** | | 0% |
| 449 | | Verbindu | V13b | **Verbindungsgang** | **Die 12.01.27** | **Mon 08.02.27** | **20 Tage** | | 0% |
| 451 | | Brücke | V13b/c | **Brückenbauwerk** | **Fre 14.05.27** | **Fre 11.06.27** | **20 Tage** | | 0% |
| 452 | | Brücke | V13b/c | Decken | Fre 14.05.27 | Fre 11.06.27 | 20 Tage | 857EA+40 Tage | 0% |
| 453 | | | | **TGA** | **Don 04.04.24** | **Don 24.02.28** | **960 Tage?** | | 47% |
| 454 | | | | **„V56 Energieversorgung", „V56b Erdarbeiten" und „V56c Netzersatzanlage"** | **Mon 01.07.24** | **Don 26.08.27** | **778 Tage** | | 53% |
| 473 | | | V55, V58, V57, V59 | **Elektroinstallation** | **Don 04.04.24** | **Don 24.02.28** | **960 Tage** | | 41% |
| 474 | | | V55, V58, V57, V59 | **Planung und Arbeitsvorbereitung** | **Mit 06.08.25** | **Die 21.10.25** | **53 Tage** | | 50% |
| 475 | | | V55, V58, V57, V59 | W+M-Planung | Mit 06.08.25 | Die 07.10.25 | 43 Tage | 476AE | 50% |
| 476 | | | V55, V58, V57, V59 | Arbeitsvorbereitung | Die 07.10.25 | Die 21.10.25 | 10 Tage | 496AE | 50% |
| 477 | | | V55, V58, V57 | **Montage** | **Don 04.04.24** | **Don 24.02.28** | **960 Tage** | | 41% |
| 478 | | | V55, V58, V57 | **Unterputzinstallationen** | **Don 04.04.24** | **Mit 17.03.27** | **725 Tage** | | 58% |



| Nr. | Geschoss | Vergabeeinheit | Vorgangsname | Anfang | Ende | Dauer | Vorgänger | % Abgeschlossen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | KG | V55, V58, V57 | Kellergeschoß (Trockenbau) | Don 25.02.27 | Mit 17.03.27 | 15 Tage | 507EE | 0% |
| 480 | KG | V55, V58, V57 | Kellergeschoß | Die 21.01.25 | Fre 09.05.25 | 30 Tage | 815AE | 95% |
| 481 | SG | V55, V58, V57 | Sockelgeschoß (Trockenbau) | Don 04.02.27 | Mit 17.03.27 | 30 Tage | 507EE | 0% |
| 482 | SG | V55, V58, V57 | Sockelgeschoß | Die 03.12.24 | Die 01.04.25 | 30 Tage | 816AE | 95% |
| 483 | EG | V55, V58, V57 | Erdgeschoß (Trockenbau) | Mon 16.11.26 | Don 07.01.27 | 30 Tage | 508EE | 0% |
| 484 | EG | V55, V58, V57 | Erdgeschoß | Mon 07.10.24 | Mon 18.11.24 | 30 Tage | 817AE | 95% |
| 485 | 1. OG | V55, V58, V57 | 1. Obergeschoß (Trockenbau) | Fre 23.10.26 | Fre 04.12.26 | 30 Tage | 509EE | 0% |
| 486 | 1. OG | V55, V58, V57 | 1.Obergeschoß | Fre 13.09.24 | Fre 25.10.24 | 30 Tage | 819AE | 95% |
| 487 | 2. OG | V55, V58, V57 | 2. Obergeschoß (Trockenbau) | Don 04.04.24 | Mon 01.09.25 | 30 Tage | 511EE | 90% |
| 488 | 2. OG | V55, V58, V57 | 2.Obergeschoß | Don 04.04.24 | Die 21.05.24 | 30 Tage | 820AE | 95% |
| 489 | 3. OG | V55, V58, V57 | 3. Obergeschoß (Trockenbau) | Don 21.08.25 | Mit 01.10.25 | 30 Tage | 512EE | 15% |
| 490 | 3. OG | V55, V58, V57 | 3. Obergeschoß | Fre 03.05.24 | Don 26.09.24 | 30 Tage | 821AE | 95% |
| 491 | 4. OG | V55, V58, V57 | 4. Obergeschoß (Trockenbau) | Fre 19.09.25 | Mon 03.11.25 | 30 Tage | 513EE | 15% |
| 492 | 4. OG | V55, V58, V57 | 4.Obergeschoß | Fre 16.08.24 | Fre 18.10.24 | 30 Tage | 822AE | 95% |
| 493 | 5. OG | V55, V58, V57 | 5. Obergeschoß Trockenbau) | Mon 20.10.25 | Mon 01.12.25 | 30 Tage | 514EE | 15% |
| 494 | 5. OG | V55, V58, V57 | 5.Obergeschoß | Fre 13.09.24 | Don 28.11.24 | 30 Tage | 823AE | 95% |
| 495 | | **V55** | **Trassenbau** | **Die 10.09.24** | **Don 13.05.27** | **653 Tage** | | **97%** |
| 505 | | **V55, V58, V57, V59** | **Kabelzug** | **Mon 06.01.25** | **Fre 02.04.27** | **552,8 Tage** | | **77%** |
| 516 | | **V55, V57, V58** | **Dosen zweite Seite, nach Fertigstellung Wände** | **Die 19.08.25** | **Fre 23.04.27** | **412 Tage** | | **8%** |
| 525 | | **V55, V59** | **Verteilungen/Technikräume/Endmontage** | **Mit 17.06.26** | **Don 04.11.27** | **350 Tage** | | **7%** |
| 534 | | **V55, V58, V57, V59** | **Endmontage Installation** | **Mon 07.12.26** | **Don 11.11.27** | **232 Tage** | | **0%** |
| 543 | | **V55, V58, V57, V59** | **Endmontage Steuerung einschl. Dokumentation** | **Don 28.01.27** | **Mon 21.02.28** | **267 Tage** | | **0%** |
| 552 | | **V55** | **Endmontage Beleuchtung** | **Mon 14.12.26** | **Don 14.10.27** | **207 Tage** | | **0%** |
| 561 | | **V57, V58** | **Endmontage BMA/EDV/Lichtruf** | **Don 28.01.27** | **Mon 03.01.28** | **232 Tage** | | **0%** |
| 570 | | | **SV-Abnahme SV und SiBe** | **Mit 25.08.27** | **Don 24.02.28** | **125 Tage** | | **0%** |
| 576 | | | **SV-Abnahme BMA** | **Fre 16.07.27** | **Mit 05.01.28** | **117 Tage** | | **0%** |
| 582 | | | **HLS Medien (Heizung, Lüftung, Sanitär, Med.Gase, Sprinkler, Rohrpost)** | **Die 23.07.24** | **Mon 21.02.28** | **882 Tage?** | | **50%** |
| 788 | **1. OG** | **V14** | **OP-Bereiche (1.OG)** | **Die 18.03.25** | **Don 30.09.27** | **629 Tage** | | **45%** |
| 814 | | **V12** | **Innenputzarbeiten** | **Die 21.05.24** | **Fre 16.10.26** | **595 Tage** | | **94%** |
| 828 | | **V17** | **Estricharbeiten** | **Fre 10.06.22** | **Mon 15.03.27** | **1165 Tage** | | **8%** |
| 862 | | **V16/V16a** | **Malerarbeiten** | **Fre 12.08.22** | **Don 23.09.27** | **1254 Tage** | | **6%** |
| 923 | | **V15** | **Fliesenarbeiten** | **Fre 10.06.22** | **Die 08.06.27** | **1222 Tage** | | **17%** |
| 944 | | **V15a** | **Innere Fensterbänke** | **Fre 14.06.24** | **Mit 27.01.27** | **642 Tage** | | **93%** |
| 960 | | **V18/V25/V16b** | **Bodenbelagsarbeiten // Hohlboden** | **Fre 29.11.24** | **Don 09.09.27** | **681 Tage?** | | **44%** |
| 1053 | | **V21** | **Metallbau- u. Brandschutzelemente** | **Mon 09.06.25** | **Don 26.08.27** | **549 Tage** | | **14%** |
| 1074 | | **V19** | **Tischlerarbeiten** | **Mon 08.09.25** | **Don 30.09.27** | **510 Tage** | | **27%** |
| 1135 | | **V22** | **Schlosserarbeiten** | **Mon 03.03.25** | **Mon 22.03.27** | **506 Tage** | | **51%** |
| 1173 | | **V40** | **Aufzüge** | **Mon 04.08.25** | **Mon 15.03.27** | **396 Tage** | | **35%** |
| 1184 | | **V26a/b** | **Baureinigung** | **Mon 30.11.26** | **Fre 26.05.28** | **367 Tage** | | **0%** |
| 1217 | | | **Medizintechnik** | **Die 26.05.26** | **Don 25.11.27** | **381 Tage** | | **7%** |
| 1302 | | | **Aussenanlagen** | **Don 11.03.27** | **Die 05.10.27** | **145 Tage** | | **0%** |
| 1310 | | | **Fertigstellungsprozess (Abnahme, Bauaufsicht, Mängelbeseitung)** | **Mon 15.03.27** | **Fre 12.05.28** | **291 Tage** | | **0%** |
| 1369 | | | **Betrieb Klinik einfahren** | **Mon 15.05.28** | **Don 16.11.28** | **130 Tage** | **1338;1357;1358** | **0%** |
| 1370 | | | **Umzug der Klinik** | **Fre 17.11.28** | **Fre 16.02.29** | **60 Tage** | **1369** | **0%** |

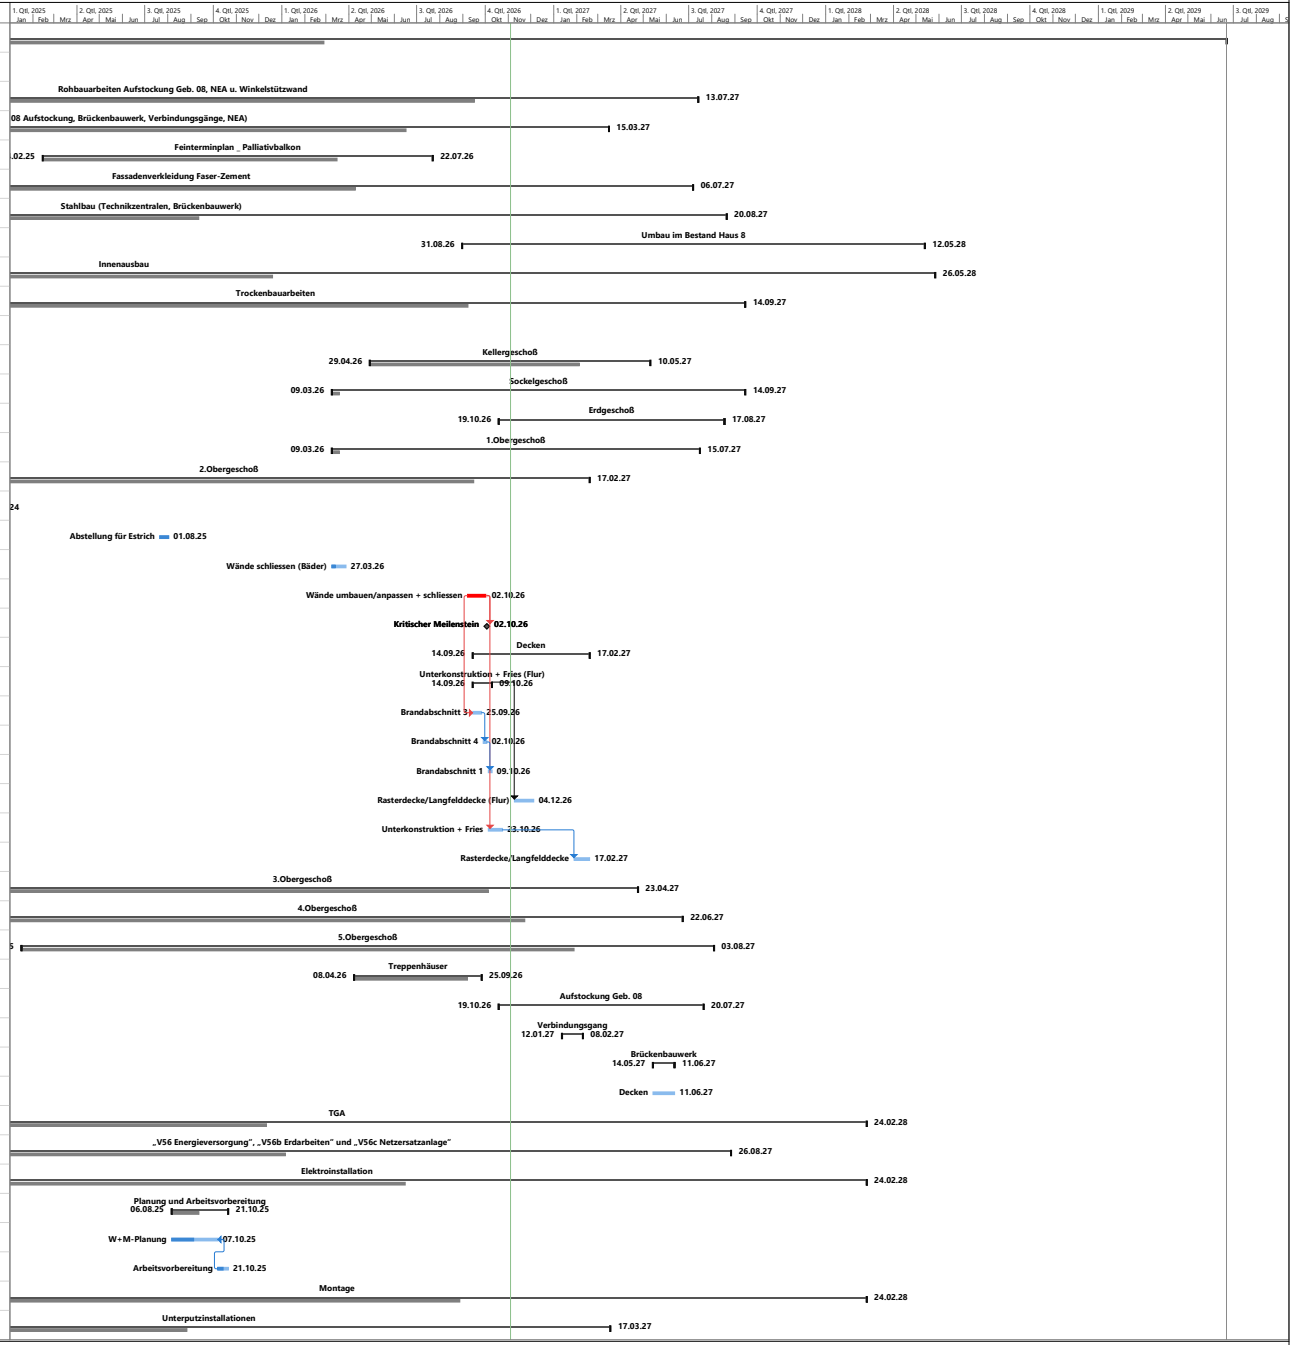
