
Angebotsterminplan Stand: Fre 16.10.26
EVS Bf Herzogenrath Gleis 10

Nr.	Vorgangsname	Notizen	Dauer	Anfang
1	**EVS Bf Herzogenrath Gleis 10**		**37 Tage**	**Mon 18.01.27**
2	**Bauausführung**	**Die angezeigten Termine (Datum) sind hier nur beispielhaft gewählt.**	**37 Tage**	**Mon 18.01.27**
3	Baubeginn		0 Tage	Mon 18.01.27
4	Vorbereitende Arbeiten (Einmessen, Suchschachtungen, Kampfmittelsondierung etc.) für Mast 15-27eN und 16-1cN	Sperrung Gleis 9+10, SG 328	2 Tage	Mon 18.01.27
5	Herstellung der Gründungen Mast 15-27eN und 16-1cN (Ortbeton)	Sperrung Gleis 9+10, SG 328	3 Tage	Mit 20.01.27
6	Montage Mehrgleisausleger (10 Stck)	Sperrung Gleis 9+10, SG 328	10 Tage	Don 04.02.27
7	Masten stellen 15-27eN und 16-1cN, Erdung	Sperrung Gleis 9+10, SG 328	1 Tag	Mit 17.02.27
8	Montage Ausleger und Anbauteile, Montage Mehrgleisausleger Mast 16-1cN, Hängesäule tauschen 16-14e	Sperrung Gleis 9+10, SG 328, für Tausch Hängesäule 1 Schicht WV 75/78 SG 308	5 Tage	Don 18.02.27
9	Kettenwerksmontage	Sperrung Gleis 9+10+44+WV75/78/81, SG 328+308+18	5 Tage	Don 25.02.27
10	Rückbau Streckentrenner WV 75/78 und Neubau Streckentrenner Höhe Mast 16-14d (2 Stck)	Sperrung Gleis 9+10+WV75/78, SG 328+308	3 Tage	Don 04.03.27
11	Abnahme	Sperrung Gleis 9+10+WV75/78/81, SG 328+308	1 Tag	Die 09.03.27

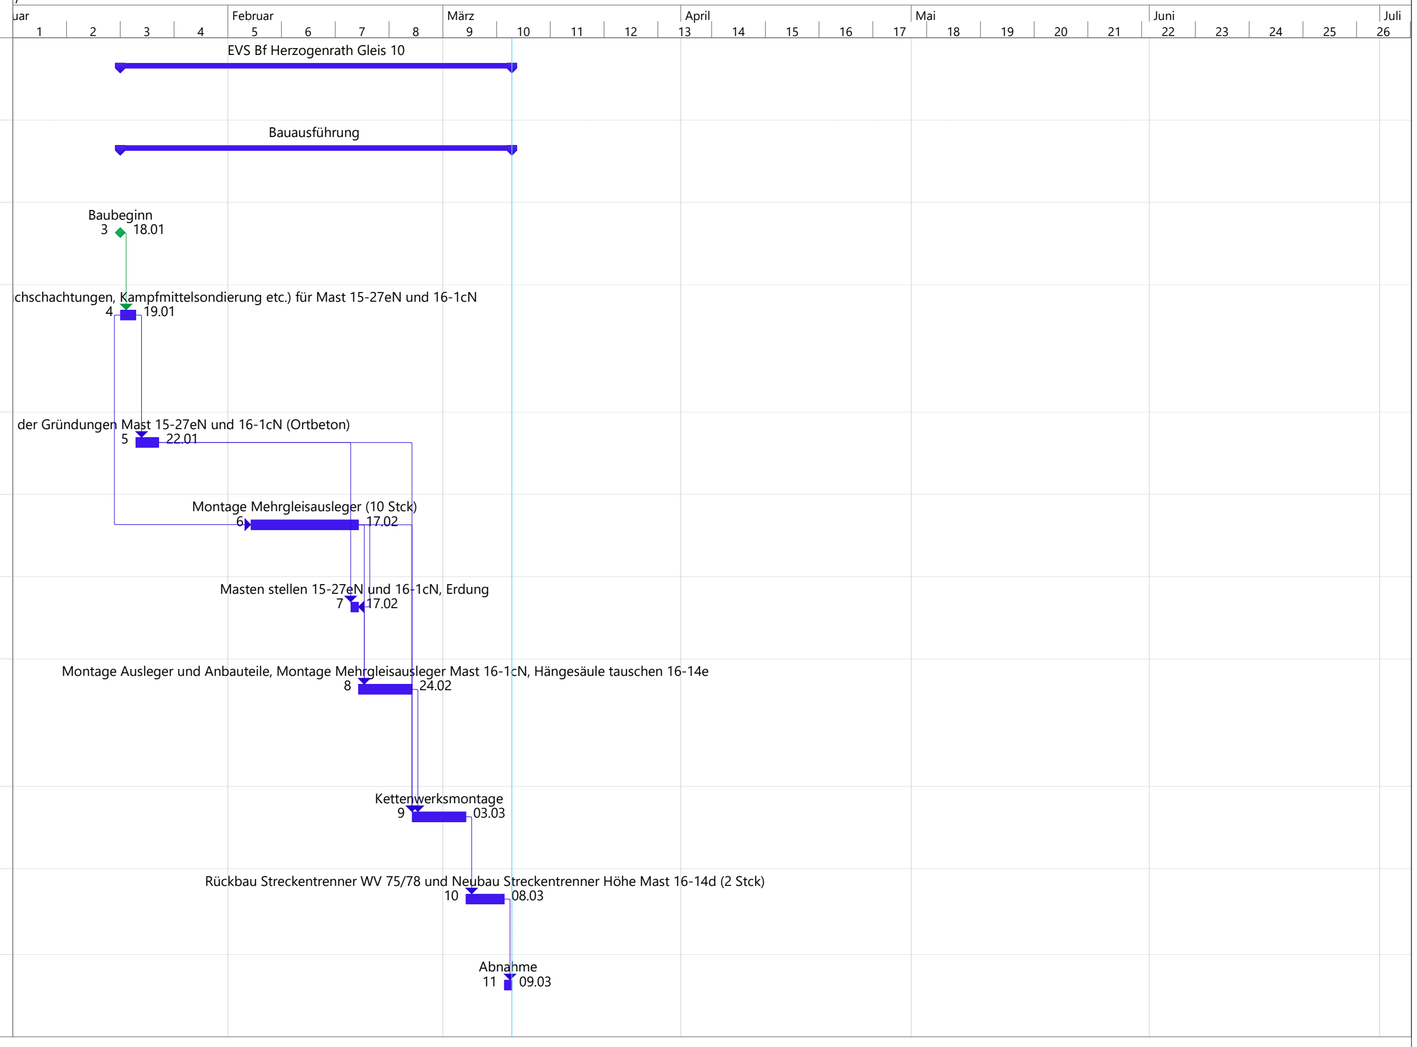

Projekt: Vorlagenterminplan O
Datum: Fre 16.10.26

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Stichtag | Gleissperrungen und Abschaltungen
Unterbrechung | Sammelvorgang | Externe Vorgänge | In Arbeit
