
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Erweiterung Förderzentrum Kaltenkirchen**	**440 Tage**	**Mon 11.08.25**	**Mon 10.05.27**
2	**Rohbau**	**220 Tage**	**Mon 11.08.25**	**Fre 12.06.26**
3	Erdgeschoss	175 Tage	Mon 11.08.25	Fre 10.04.26
4	Obergechsoss	30 Tage	Mon 13.04.26	Fre 22.05.26
5	Attika	15 Tage	Mon 25.05.26	Fre 12.06.26
6	**Hülle**	**97 Tage**	**Don 19.03.26**	**Fre 31.07.26**
7	Verblender	58 Tage	Mit 08.04.26	Fre 26.06.26
8	Vorwand-Montagesystem EG	7 Tage	Don 19.03.26	Fre 27.03.26
9	Vorwand-Montagesystem OG Teil 1	4 Tage	Mon 11.05.26	Don 14.05.26
10	Vorwand-Montagesystem OG Teil 2	4 Tage	Mon 25.05.26	Don 28.05.26
11	Fenstermontage EG	15 Tage	Mon 15.06.26	Fre 03.07.26
12	Fenstermontage OG	15 Tage	Mon 06.07.26	Fre 24.07.26
13	Dachabdichtung	20 Tage	Mon 15.06.26	Fre 10.07.26
14	Abdeckungen / Blecharbeiten	15 Tage	Mon 13.07.26	Fre 31.07.26
15	**Ausbau**	**185 Tage**	**Mon 22.06.26**	**Fre 26.03.27**
16	Putz EG und OG	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26
17	Trockenbau EG Wände 1 seitig	10 Tage	Mon 22.06.26	Fre 03.07.26
18	Trockenbau OG Wände 1 seitig	10 Tage	Mon 29.06.26	Fre 10.07.26
19	TGA-ELT Rohinstallation	50 Tage	Mon 06.07.26	Fre 11.09.26
20	Trockenbau EG Wände 2 seitig	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26
21	Trockenbau OG Wände 2 seitig	10 Tage	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26
22	Montage Innentüren	15 Tage	Mon 10.08.26	Fre 28.08.26
23	Aufzugsbau	20 Tage	Mon 17.08.26	Fre 11.09.26
24	Estrichabstellungen Schlosser	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26
25	Estrichdämmung EG	5 Tage	Mon 31.08.26	Fre 04.09.26
26	Heizleitungsverlegung EG	10 Tage	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26
27	Estrich EG	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26
28	Estrichdämmung OG	5 Tage	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26
29	Heizleitungsverlegung OG	10 Tage	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26
30	Estrich OG	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26
31	Mobiltrennwände UK	5 Tage	Mon 21.09.26	Mon 28.09.26
32	Abhangdecken EG	20 Tage	Mon 05.10.26	Fre 30.10.26
33	Abhangdecken OG	20 Tage	Mon 28.09.26	Fre 23.10.26
34	Zargenmontage	20 Tage	Mon 28.09.26	Fre 23.10.26
35	Fliesen- und Betonwerkstein EG	20 Tage	Mon 02.11.26	Fre 27.11.26
36	Fliesen- und Betonwerkstein OG	20 Tage	Mon 26.10.26	Fre 20.11.26
37	Malerarbeiten 1. Anstrich	25 Tage	Mon 30.11.26	Fre 22.01.27
38	Bodenbelagsarbeiten	20 Tage	Mon 14.12.26	Fre 29.01.27
39	TGA-ELT Endinstallation	30 Tage	Mon 18.01.27	Fre 26.02.27
40	Mobiltrennwände	15 Tage	Mon 01.02.27	Fre 19.02.27
41	Tischlerarbeiten Endmontage	10 Tage	Mon 01.02.27	Fre 12.02.27
42	Geländer	20 Tage	Mon 25.01.27	Fre 19.02.27
43	Malerarbeiten 2. Anstrich	20 Tage	Mon 01.03.27	Fre 26.03.27
44	Schließanlage	5 Tage	Mon 22.02.27	Fre 26.02.27
45	**Übergabe**	**40 Tage**	**Mon 15.03.27**	**Mon 10.05.27**
46	Bauendreinigung	15 Tage	Mon 15.03.27	Fre 02.04.27
47	Vorbegehung zur Abnahme	10 Tage	Mon 29.03.27	Fre 09.04.27
48	Mangelbeseitigung	10 Tage	Mon 05.04.27	Fre 16.04.27
49	Abnhame und Inbetriebnahme	15 Tage	Mon 19.04.27	Fre 07.05.27
50	Nutzungsaufnahme	0 Tage	Mon 10.05.27	Mon 10.05.27

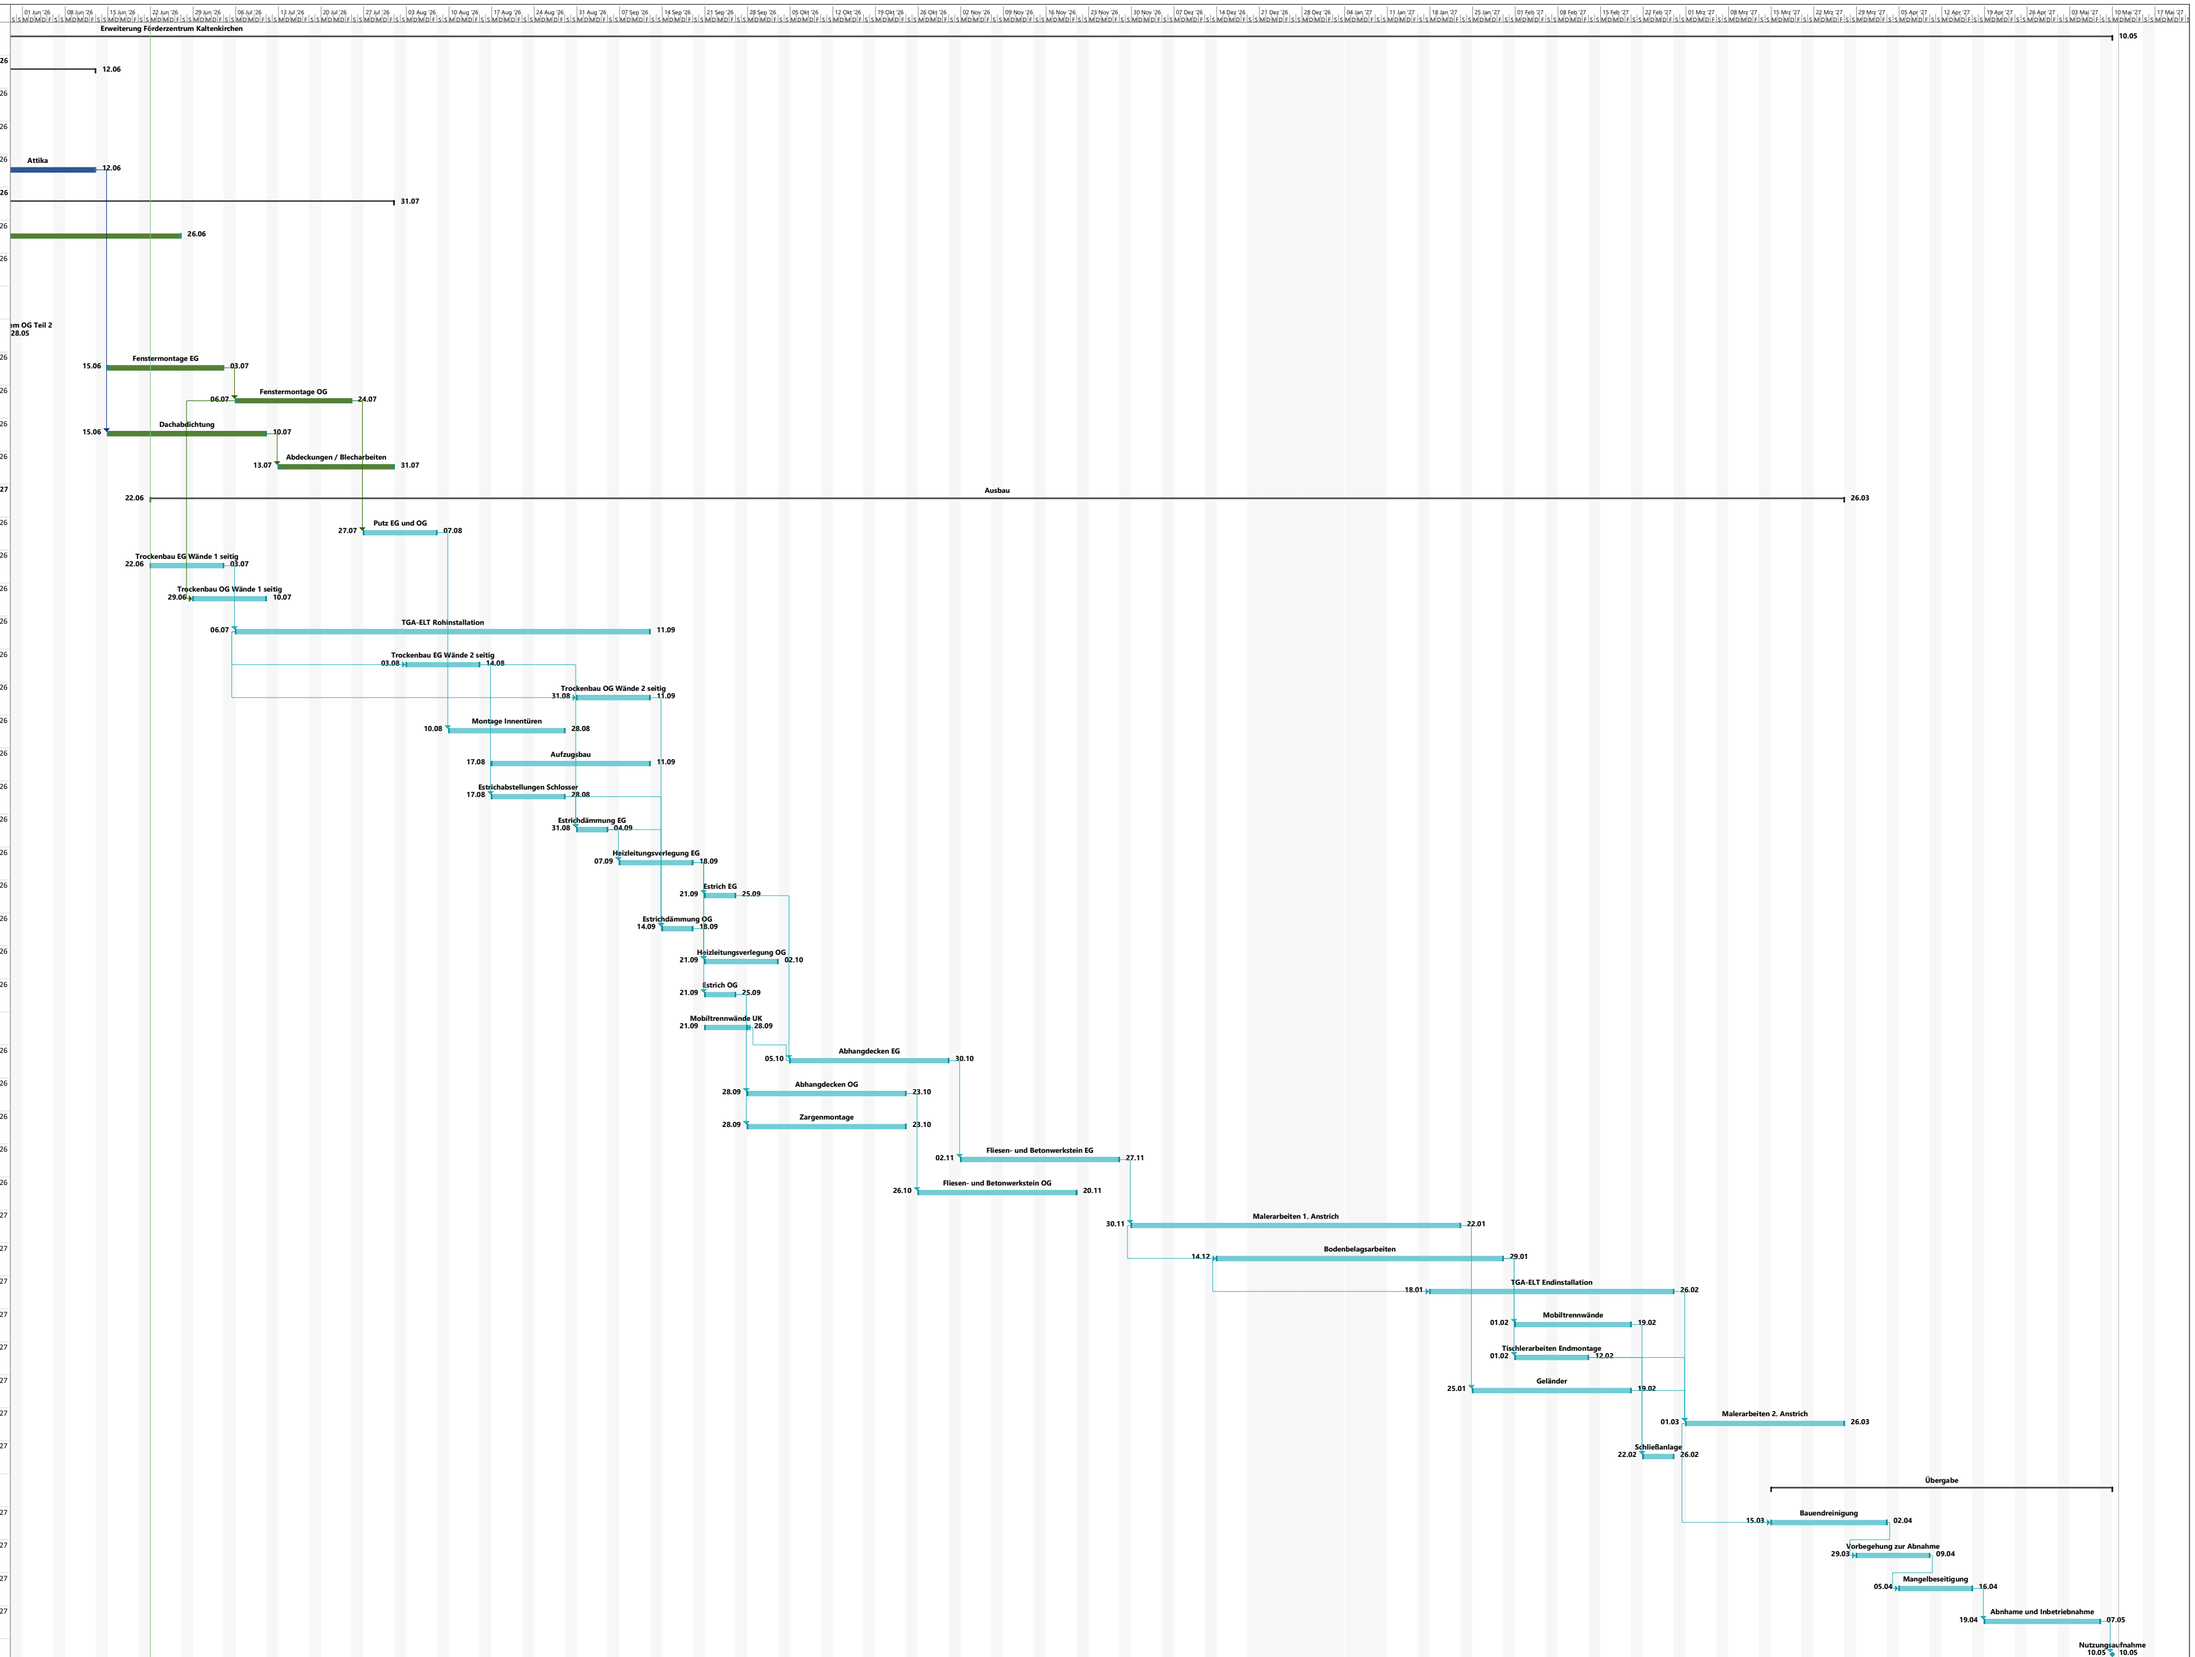

Projekt: Detailterminplan 2606
Datum: Mon 22.06.26

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt
