Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1	**Ostalb-Klinikum Aalen**	**450 Tage?**	**Fr 19.09.25**	**Mo 28.06.27**		
2	Freigabe der Grundrisse Machbarkeit	0 Tage	Fr 19.09.25	Fr 19.09.25		
3	Leistungsphase 1+2	31 Tage	Fr 19.09.25	Fr 31.10.25		
4	Leistungsphase 3	63 Tage	Mo 03.11.25	Fr 13.02.26	3	
5	Einreichung Förderantrag light	0 Tage	Fr 28.11.25	Fr 28.11.25		
6	Bauantrag	25 Tage	Mo 17.11.25	Fr 19.12.25		
7	Baugenehmigung	0 Tage	Mo 27.04.26	Mo 27.04.26	6EA+60 Tage	
8	**Funktionalausschreibung 2-stufig**	**167 Tage?**	**Mo 08.12.25**	**Do 13.08.26**		
9	Vorabinformation Step 1	11 Tage	Mo 08.12.25	Mi 07.01.26		
10	Step1 Veröffentlichung	11 Tage?	Di 13.01.26	Di 27.01.26	9	
11	Auswertung und Einspruchsfrist	21 Tage	Mi 28.01.26	Mi 25.02.26	10	
12	Step 2 Versand LV	60 Tage	Do 26.02.26	Mi 20.05.26	11	
13	Auswertung Vergabegespräche	40 Tage	Do 21.05.26	Mi 15.07.26	12	
14	Betriebsausschusssitzung	0 Tage	Di 21.07.26	Di 21.07.26		
15	Einspruchsfrist	13 Tage?	Di 28.07.26	Do 13.08.26		
16	Vergabe an GU frühestens	0 Tage	Do 13.08.26	Do 13.08.26		
17	**LPH5 Fundamenttisch + Anbindungen**	**350 Tage?**	**Do 06.11.25**	**Fr 26.03.27**		
18	LPh5 + Statik	105 Tage	Do 06.11.25	Fr 17.04.26		
19	Prüfstatik	30 Tage?	Mo 20.04.26	Fr 29.05.26	18	
20	Ausschreibung	65 Tage?	Mo 20.04.26	Fr 17.07.26	18	
21	Vergaben	34 Tage?	Di 30.06.26	Fr 14.08.26	20EA-14 Tage	
22	Bauausführung Anbindungen an den Bestand	160 Tage?	Mo 17.08.26	Fr 26.03.27	21	
23	**OP-im Modulbau**	**221 Tage?**	**Mo 24.08.26**	**Mo 28.06.27**		
24	Vergabe GU	11 Tage	Mo 24.08.26	Mo 07.09.26		
25	Planung GU	65 Tage?	Di 08.09.26	Mo 07.12.26	24	
26	Fertigung GU	65 Tage	Di 08.12.26	Mo 08.03.27	25	
27	Übergabe Statik GU	0 Tage	Mo 21.09.26	Mo 21.09.26		
28	Anpassung Statik Fundamente	13 Tage?	Di 13.10.26	Do 29.10.26	25EA-40 Tage	
29	Prüfstatik	19 Tage	Fr 30.10.26	Mi 25.11.26	28	
30	Baumeister Fundamente + Tisch	70 Tage	Do 26.11.26	Mi 03.03.27	29	
31	Lieferung Module	3 Tage	Di 09.03.27	Do 11.03.27	26	
32	Ausbau Module	55 Tage	Fr 12.03.27	Do 27.05.27	31	
33	Außenanlagen	15 Tage	Fr 28.05.27	Do 17.06.27	32	
34	Abnahme/Übergaben/Schulungen	22 Tage	Fr 28.05.27	Mo 28.06.27	32	
35	Regelbetrieb OP	0 Tage	Mo 28.06.27	Mo 28.06.27	34	

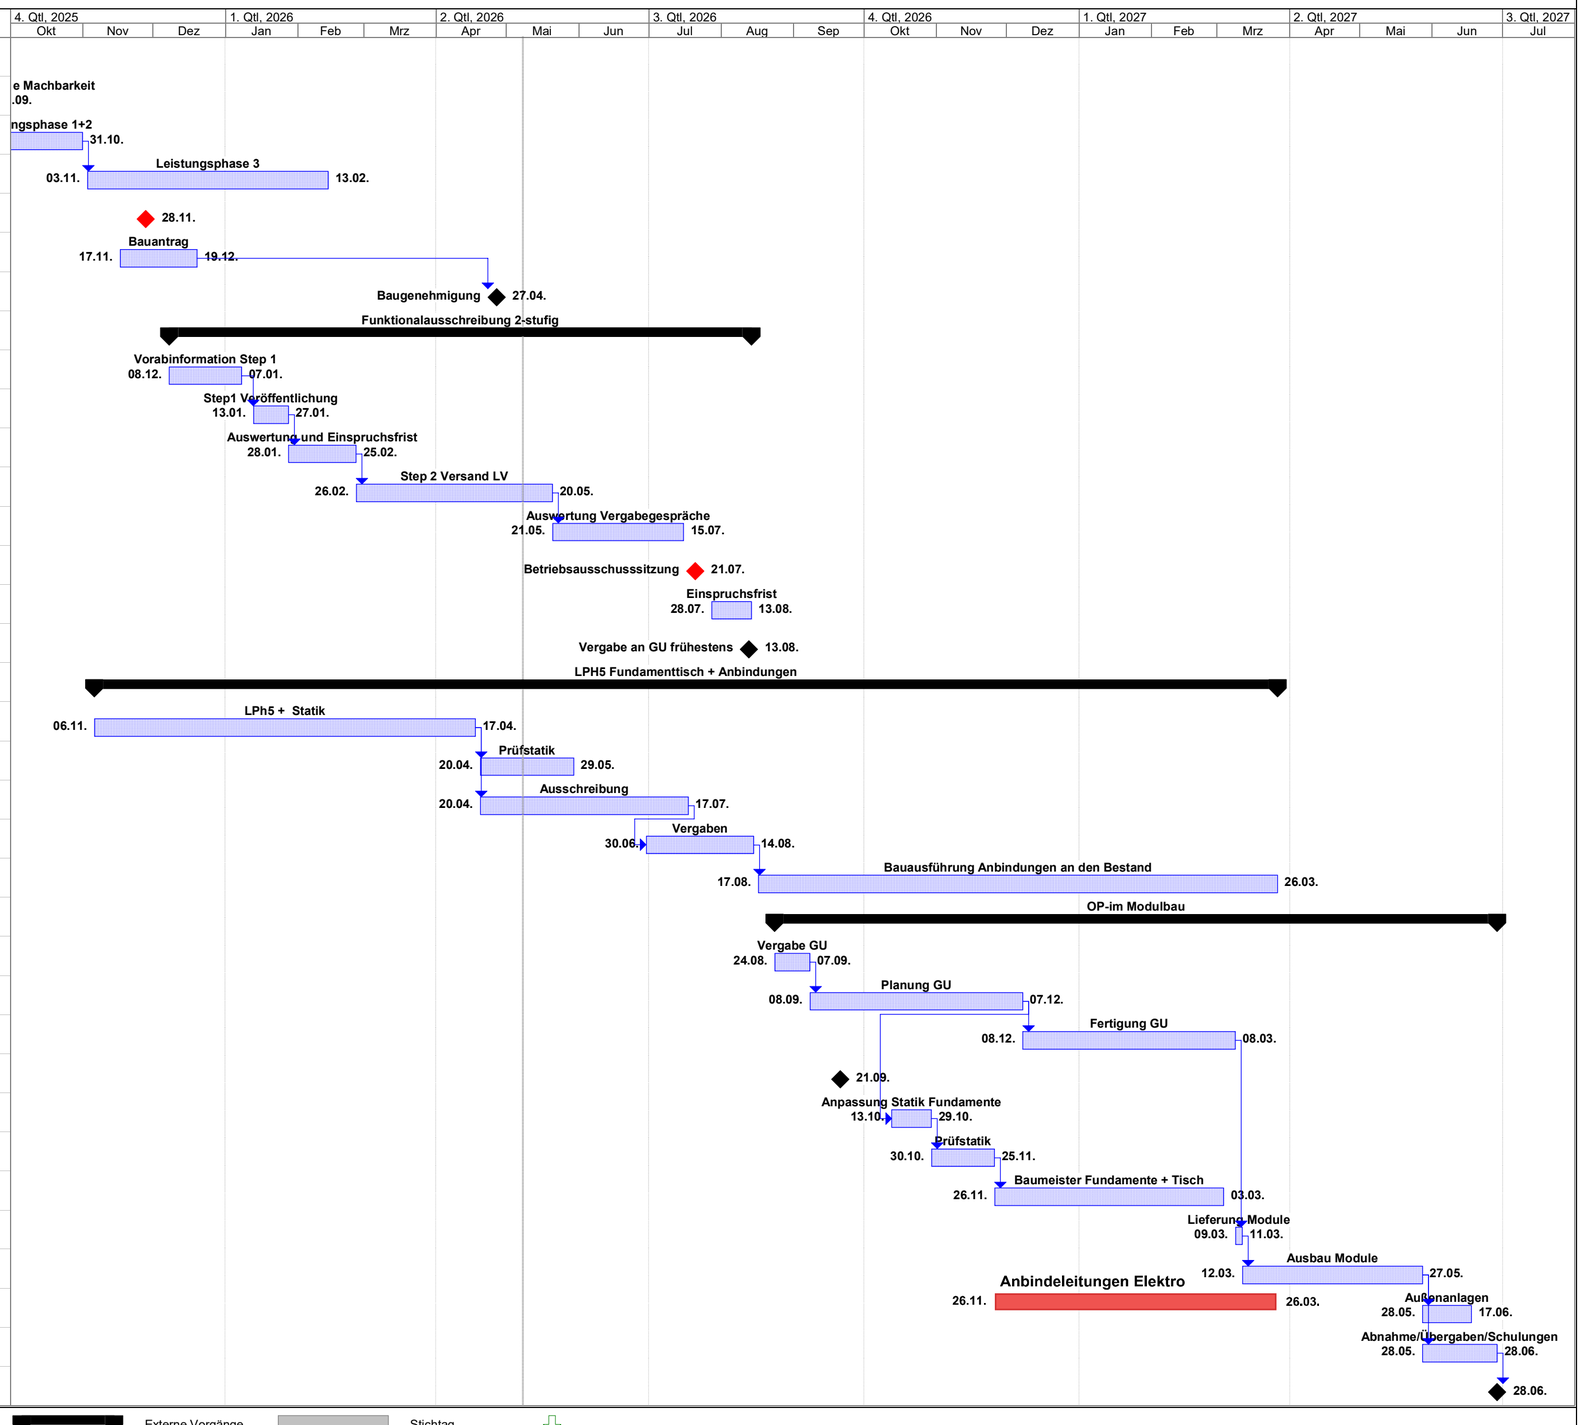

Projekt: 2010-62-74 OAK Aalen
Datum: Fr 08.05.26

Vorgang | In Arbeit | Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Stichtag
Unterbrechung | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Externer Meilenstein
