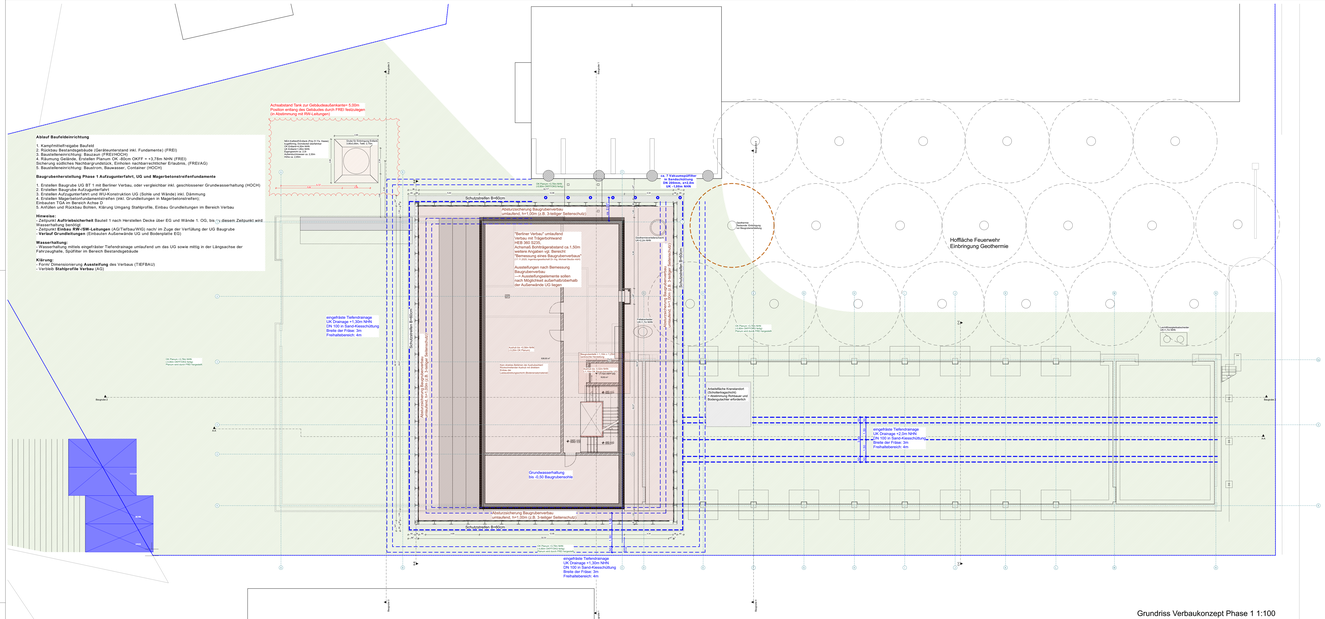

Ablauf Baufeldeinrichtung

1. Kampfmittelfreigabe Baufeld
2. Rückbau Bestandsgebäude (Gerätewärmehaus) inkl. Fundamente(-) (FREI)
3. Herstellung Baustellenzufahrt (Schotterrasen)
4. Räumung Gebäude, Einrichten Planum OK-30cm OKFF = +3,75m NHN (FREI)
Sicherung südliches Nachbargrundstück, Einhalten nachbarrechtlicher Erlaubnis, (FREIAG)
5. Baustellencontainer(ung), Baukran, Bauaufzug, Container (HOCH)

Baugrubenherstellung Phase 1 Aufzugsortefahrt, UG und Magerbetonstreifenfundamente

1. Erstellen Baugrube (AS BT 1 mit Berliner Verbau, oder vergleichbar inkl. geschlossener Grundwasserhaltung (HOCH)
2. Erstellen Bohrpfahlwand (HOCH)
3. Erstellen Aufzugsortefahrt und WU-Konstruktion UG (Sohle und Wände) inkl. Dämmung
4. Herstellung Magerbetonstreifen Aufzugsortefahrt (inkl. Grundeinfügen in Magerbetonstreifen)
Einbauen TGA in Bereich Achse D
5. Anfüllen und Rückbau Bohlen, Räumg Umgang Stahlprofile, Einbau Grundeinfügen im Bereich Verbau

Hinweise:
- Zeitpunkt **Aufrieb/sicherheit** Bauteil 1 nach Herstellen Decke über EG und Wände 1. OG, bis (-) dessen Zeitpunkt wird **Verbau** entfernt
- Zeitpunkt **Einbau RW-/SW-Leitungen** (AG/Tiefbau/WIS) nach im Zuge der Verfüllung der UG Baugrube
- **Verlauf Grundeinfügungen** (Einbauten Außenwände UG und Bodenplatte EG)

Wasserhaltung:
- Wasserhaltung mittels eingefräster Tafelwandsage umlaufend um das UG sowie mittig in der Längsachse der Aufzugsgrube, Spülfilter im Bereich Bestandsgebäude

Klärung:
- Genaue Dimensionierung **Aussteifung** des Verbaus (TEFBAU)
- Verteilt **Stahlprofile Verbau** (AG)

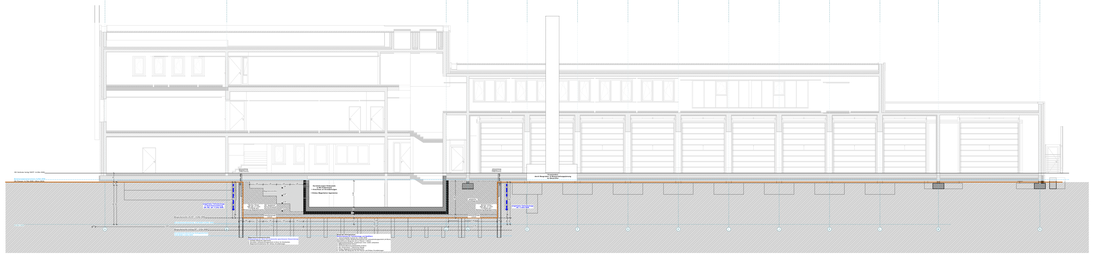
Achsmaß HEB 300 (Profilmitte)
Achsmaß Bohrpfahl
Achsmaß Bohrtiegelanker
