Projektnummer: 1561

Bauzeitenplan

Aufstockung Anbau Aicher-Scholl-Schule Bad Saulgau

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer
2	**Ausführung**	159at	Mo, 24.08.26	Mo, 19.04.27	
2.1	Baubeginn	1at	Mo, 24.08.26	Mo, 24.08.26	
2.2	Bauzeit	143at	Di, 15.09.26	Mo, 19.04.27	bgi
3	Gerüstbau	137at	Mi, 26.08.26	Do, 18.03.27	
3.1	Aufbau Gerüst	3at	Mi, 26.08.26	Fr, 28.08.26	
3.2	Gerüst Standzeit	63at	Mi, 02.12.26	Fr, 12.03.27	
3.3	Gerüst Abbau	4at	Mo, 15.03.27	Do, 18.03.27	
4	Rohbauarbeiten	70at	Di, 14.07.26	Mo, 19.10.26	
4.1	Auftragsvergabe	1at	Di, 14.07.26	Di, 14.07.26	
4.2	Planung Fertigteilwände und -Decken	15at	Mi, 15.07.26	Di, 04.08.26	Rohbauer
4.3	Prüfung Fertigteilpläne	6at	Mi, 05.08.26	Mi, 12.08.26	bgi
4.4	Produktion Fertigteile	17at	Do, 13.08.26	Fr, 04.09.26	Rohbauer
4.5	Baustelleneinrichtung / Rohbau	5at	Mo, 24.08.26	Fr, 28.08.26	
4.6	Aussenwände stellen	10at	Mo, 07.09.26	Fr, 18.09.26	
4.7	Innenstützen	3at	Mo, 21.09.26	Mi, 23.09.26	
4.8	Filigrandecke verlegen und betonieren	10at	Do, 24.09.26	Mi, 07.10.26	
4.9	Attika Ortbeton	5at	Do, 08.10.26	Mi, 14.10.26	
4.10	Löcher Giebelwand Altbau vergrössern, neue Öffnung Dachspitz inkl. provis. Schliessen	3at	Do, 15.10.26	Mo, 19.10.26	
5	Zimmererarbeiten	43at	Mo, 31.08.26	Mi, 28.10.26	
5.1	Rückbau Ortgang Altbau	2at	Mo, 31.08.26	Di, 01.09.26	
5.2	Anpassarbeiten Übergang Altbau	15at	Do, 08.10.26	Mi, 28.10.26	Zimmerer
6	Flachdachabdichtung	128at	Mo, 31.08.26	Mi, 10.03.27	
6.1	Rückbau Attika und Bereich Innenstützen, provisorische Abdichtung an Rohbaukörper	3at	Mo, 31.08.26	Mi, 02.09.26	
6.2	Stempel für Abspriessung Decke in vorh. Dachaufbau einbauen	1at	Do, 03.09.26	Do, 03.09.26	
6.3	Dachabdichtung neu inkl Attika	14at	Do, 22.10.26	Di, 10.11.26	
6.4	Rückbau Dachaufbau alt Decke über OG	7at	Mi, 11.11.26	Do, 19.11.26	
6.5	Attikaverwahrung	3at	Mo, 15.02.27	Mi, 17.02.27	
6.6	Aufbau Dachgeländer	2at	Do, 18.02.27	Fr, 19.02.27	
6.7	Kiesbelag einbringen	3at	Mo, 08.03.27	Mi, 10.03.27	
7	Fenster	94at	Fr, 16.10.26	Mi, 10.03.27	
7.1	Werkstattplanung	10at	Fr, 16.10.26	Do, 29.10.26	
7.2	Lieferzeit / Produktion Fenster	15at	Fr, 30.10.26	Do, 19.11.26	
7.3	Einbau Fenster	3at	Fr, 20.11.26	Di, 24.11.26	
7.4	Einbau Passfelder / Paneele	2at	Mi, 09.12.26	Do, 10.12.26	
7.5	Innenfenstersimse	3at	Mo, 08.03.27	Mi, 10.03.27	
8	Sonnenschutz	60at	Mi, 25.11.26	Di, 02.03.27	
8.1	Montage Raffstorekästen	3at	Mi, 25.11.26	Fr, 27.11.26	
8.2	Montage Behang	2at	Mo, 01.03.27	Di, 02.03.27	
9	WDVS	103kt	Mo, 30.11.26	Fr, 12.03.27	
9.1	Dämmung Raffstorekästen	3at	Mo, 30.11.26	Mi, 02.12.26	
9.2	WDVS inkl. Gewebespachtelung	7at	Do, 03.12.26	Fr, 11.12.26	
9.3	Trockungszeit	12kt	Sa, 12.12.26	Mi, 23.12.26	
9.4	Wartezeit temperaturbedingt	39kt	Do, 24.12.26	So, 31.01.27	
9.5	Oberputz	10at	Mo, 01.02.27	Fr, 12.02.27	
9.6	Trocknungszeit	10at	Mo, 15.02.27	Fr, 26.02.27	
9.7	Anstrich Fassade komplett inkl. Reinigung und Renovierungsanstrich Bestandsfassade	10at	Mo, 01.03.27	Fr, 12.03.27	
10	Trockenbau	58at	Mi, 25.11.26	Fr, 26.02.27	
10.1	Innenwände stellen, einseitig beplankt	5at	Mi, 25.11.26	Di, 01.12.26	
10.2	Beplankung Innenwände	10at	Do, 07.01.27	Mi, 20.01.27	
10.3	Innenputz	5at	Fr, 27.11.26	Do, 03.12.26	
10.4	Trockenbau abgehängte Decken Unterkonstruktion	5at	Mo, 08.02.27	Fr, 12.02.27	
10.5	abgehängte Decken Beplankung inkl. Q2	5at	Mo, 22.02.27	Fr, 26.02.27	
11	Estrich	29kt	Do, 21.01.27	Do, 18.02.27	
11.1	Einbau Ausgleichsdämmung	2at	Do, 21.01.27	Fr, 22.01.27	
11.2	Einbau Estrich	5at	Mo, 25.01.27	Fr, 29.01.27	
11.3	Pause	5at	Mo, 01.02.27	Fr, 05.02.27	
11.4	Estrich Trocknungszeit	20kt	Sa, 30.01.27	Do, 18.02.27	
12	Innentüren	32at	Mo, 25.01.27	Di, 09.03.27	
12.1	Innentüren Lieferzeit	30at	Mo, 25.01.27	Fr, 05.03.27	
12.2	Innentüren Einbau inkl. zweiteilige Zargen	2at	Mo, 08.03.27	Di, 09.03.27	
13	Malerarbeiten	20at	Mo, 08.02.27	Fr, 05.03.27	
13.1	Spachtelarbeiten	5at	Mo, 08.02.27	Fr, 12.02.27	
13.2	Wände tapezieren	5at	Mo, 15.02.27	Fr, 19.02.27	
13.3	Anstrich Wand + Decke	10at	Mo, 22.02.27	Fr, 05.03.27	
14	Bodenbelagsarbeiten	7at	Mo, 08.03.27	Di, 16.03.27	
14.1	Einbau Kautschukbelag	5at	Mo, 08.03.27	Fr, 12.03.27	
14.2	Sockelleisten montieren	2at	Mo, 15.03.27	Di, 16.03.27	
15	Fliesenlegearbeiten	16at	Fr, 19.02.27	Fr, 12.03.27	
15.1	Wandfliesen WC und Spritzschutz Miniküchen	5at	Fr, 19.02.27	Do, 25.02.27	
15.2	Bodenfliesen inkl. Abdichtung	5at	Mo, 08.03.27	Fr, 12.03.27	
16	Elektro	73at	Mi, 02.12.26	Di, 30.03.27	
16.1	Einlegearbeiten Elektro Innenwände	5at	Mi, 02.12.26	Di, 08.12.26	
16.2	Einlegearbeiten Elektro Decken	5at	Mo, 15.02.27	Fr, 19.02.27	
16.3	Fertiginstallation Elektro	10at	Mo, 15.03.27	Di, 30.03.27	
16.4	Unterkonstruktion PV-Anlage	10at	Mo, 22.02.27	Fr, 05.03.27	
16.5	PV-Module inkl. Fertiginstallation	7at	Do, 11.03.27	Fr, 19.03.27	
17	Sanitär	73at	Mi, 02.12.26	Di, 30.03.27	
17.1	Rohinstallation Sanitär	16at	Mi, 02.12.26	Mi, 23.12.26	
17.2	Fertiginstallation Sanitär	10at	Mo, 15.03.27	Di, 30.03.27	
18	Heizung	75at	Mi, 25.11.26	Di, 23.03.27	
18.1	Rohinstallation Heizung	2at	Mi, 25.11.26	Do, 26.11.26	
18.2	Fertiginstallation Heizung	5at	Mi, 17.03.27	Di, 23.03.27	
19	Lüftung	25at	Mo, 15.02.27	Fr, 19.03.27	
19.1	Rohinstallation Lüftung	2at	Mo, 15.02.27	Di, 16.02.27	
19.2	Fertiginstallation Lüftung	5at	Mo, 15.03.27	Fr, 19.03.27	
20	Wiederherstellung Aussenanlage	10at	Fr, 12.03.27	Do, 25.03.27	
21	Baureinigung	4at	Mi, 31.03.27	Mo, 05.04.27	
22	Möblierung	5at	Di, 06.04.27	Mo, 12.04.27	
23	Abnahmen	5at	Di, 13.04.27	Mo, 19.04.27	
24	Fertigstellung / Übergabe	1at	Di, 20.04.27	Di, 20.04.27	

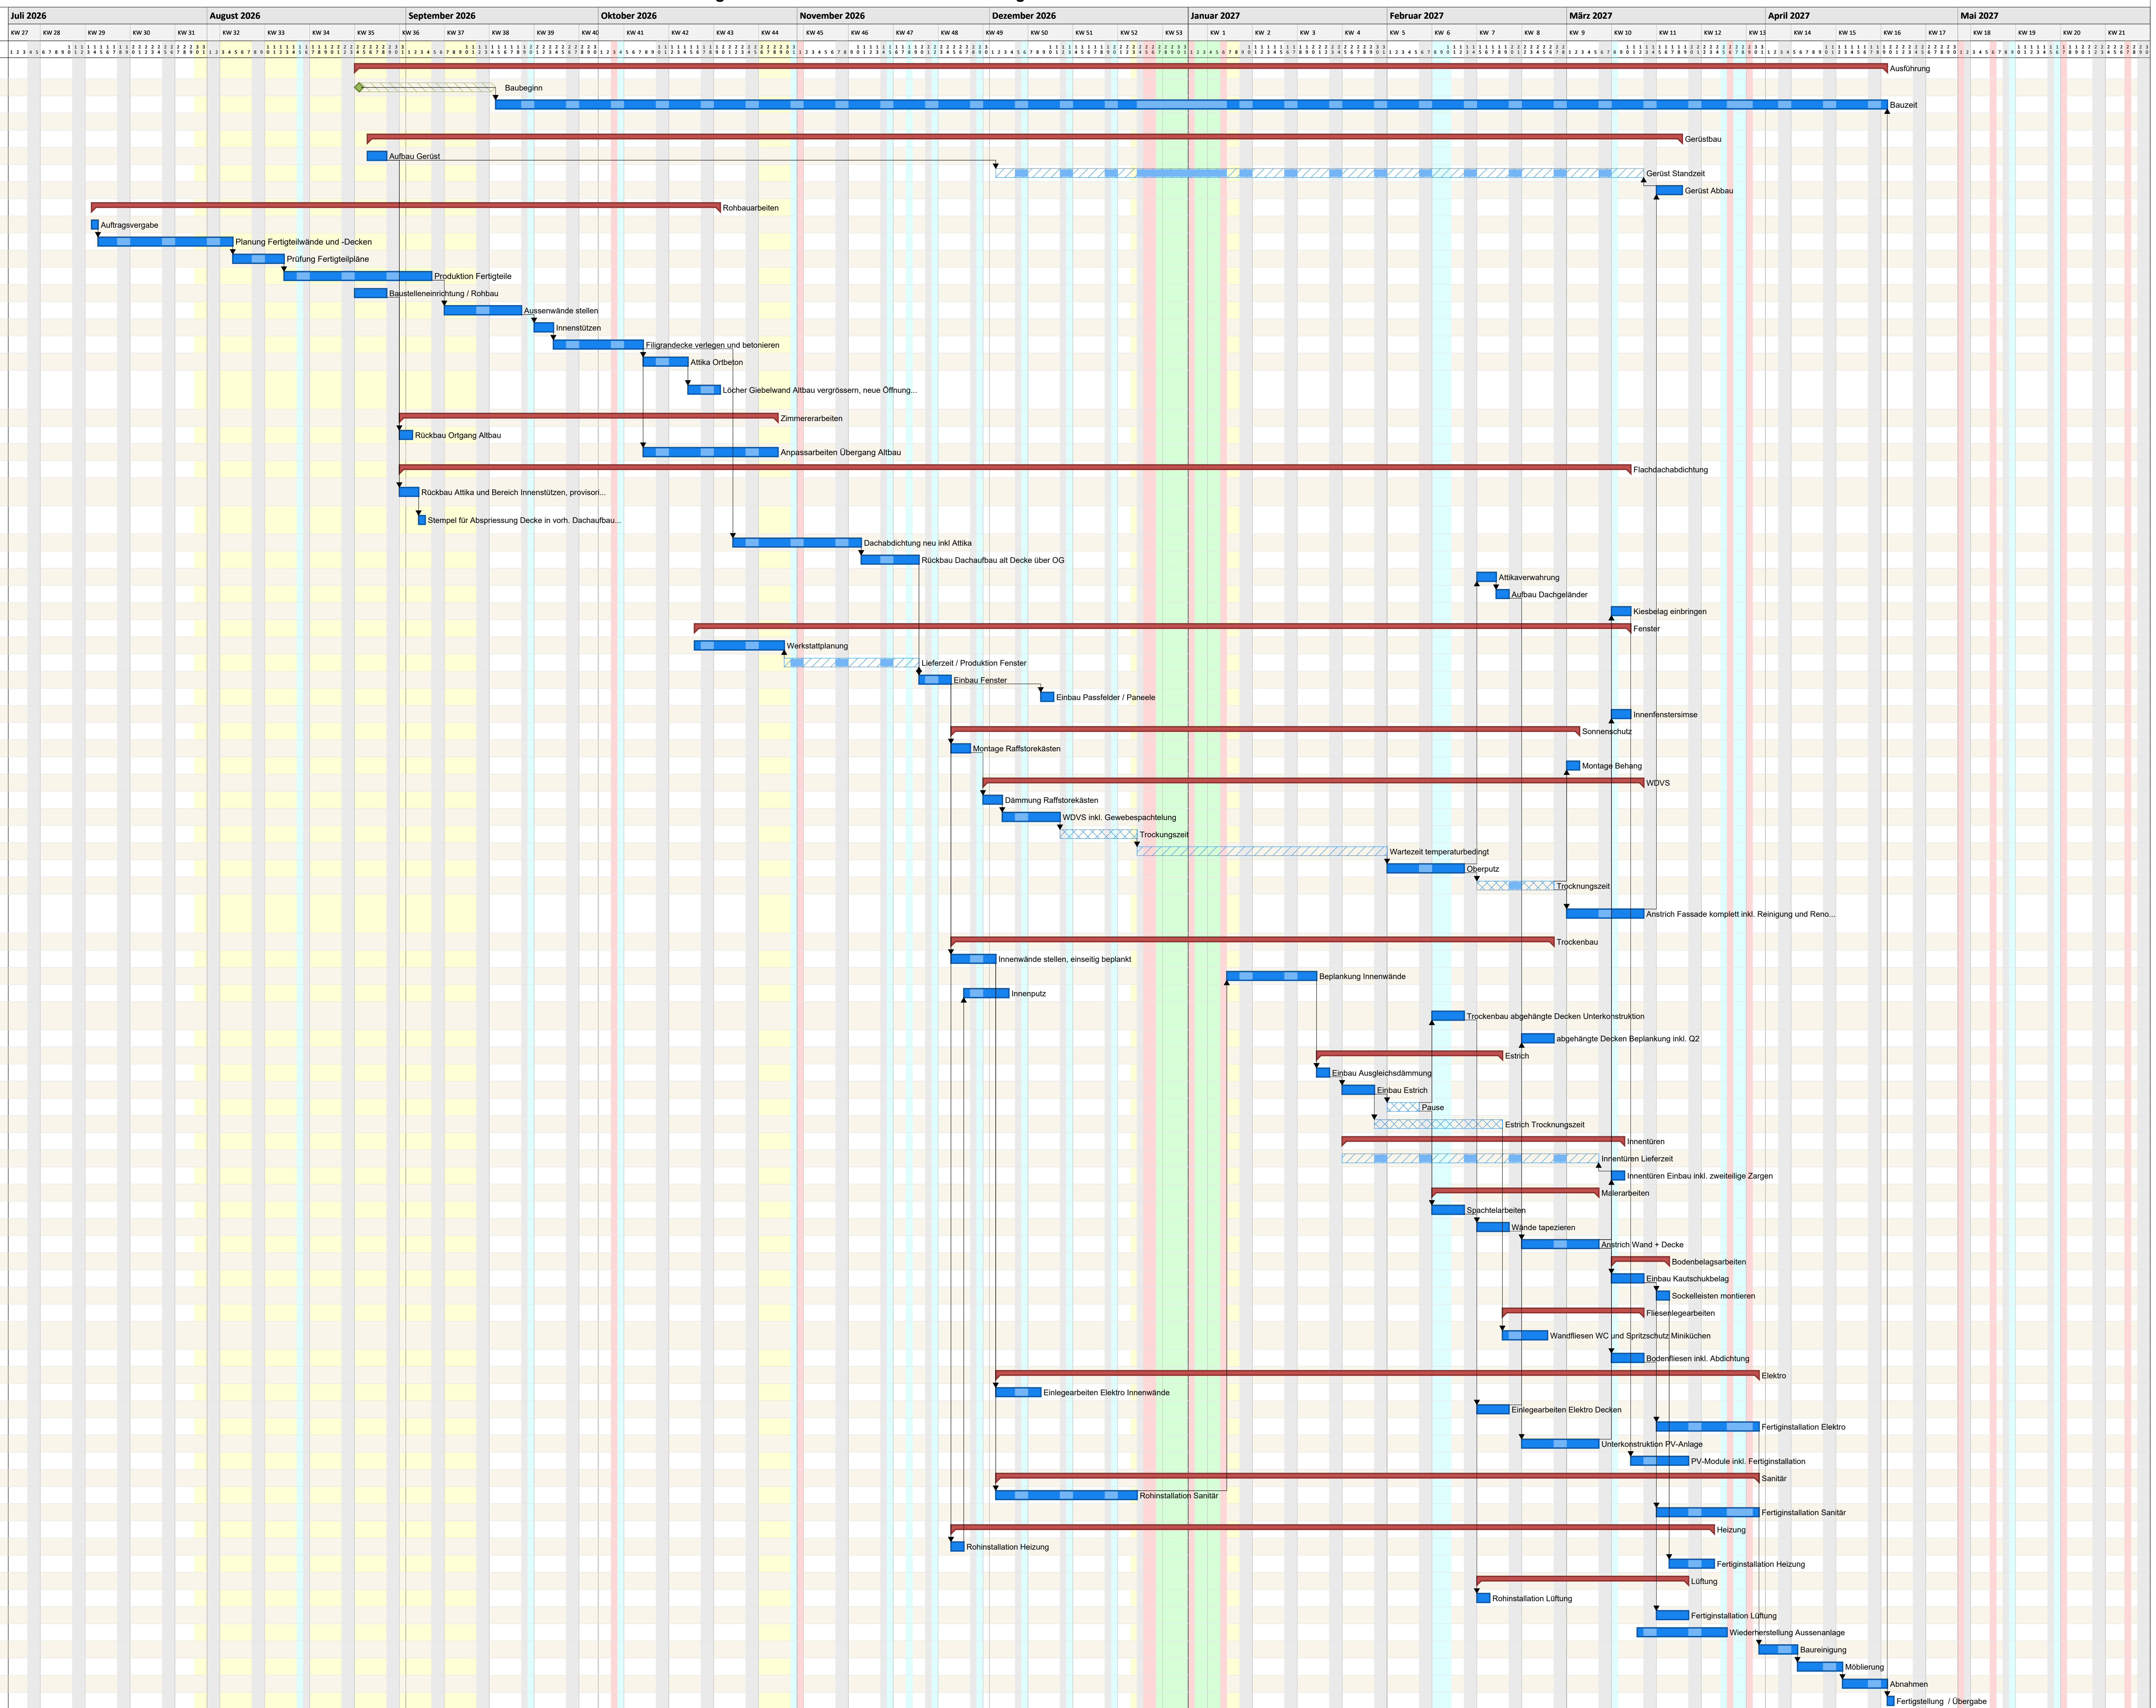

Projektzeitrahmen von Di, 01.07.25 bis Mi, 30.06.27
Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
Druckdatum: 30.03.2026 13:10
Filter:
Bearbeiter: Gabriele Hilbert

erstellt mit pro-Plan 2025 (pro-Plan 2025) Serien Nr.: PPL25-ADC2E57F6DF4 Lizenz für Bgi Böhler Großhardt GmbH & Co. KG, Überlingen

Hochbildstrasse 7
Überlingen
Tel. +49 7551 9498690
Fax +49 7551 9498699
e-Mail: info@bgi-gmbh.de
