KRH Gehrden Umbau Zentrale Notaufnahme

| ID | Vorgangsname | Start | Duration | Finish | Zuständigkeit | Verschiebung Tage | Neuer Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tag der Arbeit | Fri 01.05.26 | 1 dy | Fri 01.05.26 | | 0 dys | Fri 01.05.26 |
| 2 | Christi Himmelfahrt | Thu 14.05.26 | 1 dy | Thu 14.05.26 | | 0 dys | Thu 14.05.26 |
| 3 | Pfingstmontag | Mon 25.05.26 | 1 dy | Mon 25.05.26 | | 0 dys | Mon 25.05.26 |
| 4 | Pfingstferien | Tue 26.05.26 | 1 dy | Tue 26.05.26 | | 0 dys | Tue 26.05.26 |
| 5 | Sommerferien | Thu 02.07.26 | 30 dys | Wed 12.08.26 | | 0 dys | Thu 02.07.26 |
| 6 | Tag der Deutschen Einheit | Sat 03.10.26 | 1 dy | Sat 03.10.26 | | 0 dys | Sat 03.10.26 |
| 7 | Herbstferien | Mon 12.10.26 | 10 dys | Sat 24.10.26 | | 0 dys | Mon 12.10.26 |
| 8 | Winterferien | Thu 24.12.26 | 13 dys? | Sat 09.01.27 | | 0 dys | Thu 24.12.26 |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | **ZNA Gehrden** | **Mon 27.04.26** | **171 dys?** | **Fri 18.12.26** | | **0 dys** | **NA** |
| 11 | **Öffentliche Ausschreibung** | **Mon 27.04.26** | **40 dys?** | **Fri 19.06.26** | | **0 dys** | **NA** |
| 19 | **Vorlauf Firmen** | **Mon 22.06.26** | **10 dys?** | **Fri 03.07.26** | | **0 dys** | **Mon 02.12.24** |
| 22 | **Bauphase BA1** | **Mon 29.06.26** | **57 dys?** | **Tue 15.09.26** | | **0 dys** | **Mon 02.12.24** |
| 23 | BA1 Staubschutz | Mon 29.06.26 | 2 dys? | Tue 30.06.26 | | 0 dys | Mon 29.06.26 |
| 24 | BA1 Rückbau alter Deckeninstallation | Wed 01.07.26 | 8 dys? | Fri 10.07.26 | | 0 dys | Wed 01.07.26 |
| 25 | BA1 Rückbau Bodenbeläge/Estrich | Mon 13.07.26 | 5 dys? | Fri 17.07.26 | | 0 dys | Mon 13.07.26 |
| 26 | BA1 Anpassung Raumstruktur | Mon 20.07.26 | 5 dys? | Fri 24.07.26 | | 0 dys | Mon 20.07.26 |
| 27 | BA1 TGA Grundinstallation | Mon 20.07.26 | 15 dys? | Fri 14.08.26 | | 0 dys | Mon 20.07.26 |
| 28 | BA1 neuer Estrich (mit Beschleuniger) | Mon 27.07.26 | 10 dys? | Fri 07.08.26 | | 0 dys | Mon 27.07.26 |
| 29 | BA1 Fertigstellung Raumstruktur Oberflächen Wand/Decke | Mon 10.08.26 | 5 dys? | Fri 14.08.26 | | 0 dys | Mon 10.08.26 |
| 30 | BA1 Maler | Mon 17.08.26 | 5 dys? | Fri 21.08.26 | | 0 dys | Mon 17.08.26 |
| 31 | BA1 Bodenbelag | Mon 24.08.26 | 10 dys? | Fri 04.09.26 | | 0 dys | Mon 24.08.26 |
| 32 | BA1 Grundreinigung | Mon 07.09.26 | 1 dy? | Mon 07.09.26 | | 0 dys | Mon 07.09.26 |
| 33 | BA1 TGA Feininstallation | Wed 02.09.26 | 10 dys? | Tue 15.09.26 | | 0 dys | Wed 02.09.26 |
| 34 | BA1 Möbelinstallation | Wed 09.09.26 | 3 dys? | Fri 11.09.26 | | 0 dys | Wed 09.09.26 |
| 35 | BA1 Hygienereinigung | Mon 14.09.26 | 2 dys? | Tue 15.09.26 | | 0 dys | Mon 14.09.26 |
| 36 | BA1 Nutzerübergabe | Tue 15.09.26 | 0 dys? | Tue 15.09.26 | | 0 dys | Tue 15.09.26 |
| 37 | | | | | | | |
| 38 | **Bauphase BA2** | **Thu 17.09.26** | **60 dys?** | **Tue 08.12.26** | | **0 dys** | **Mon 02.12.24** |
| 39 | BA2 Staubschutz / Rückbau Staubschutz BA1 | Thu 17.09.26 | 2 dys? | Fri 18.09.26 | | 0 dys | Thu 17.09.26 |
| 40 | BA2 Rückbau alter Deckeninstallation | Mon 21.09.26 | 5 dys? | Fri 25.09.26 | | 0 dys | Mon 21.09.26 |
| 41 | BA2 Rückbau Bodenbeläge/Estrich | Mon 28.09.26 | 5 dys? | Fri 02.10.26 | | 0 dys | Mon 28.09.26 |
| 42 | BA2 Anpassung Raumstruktur | Mon 05.10.26 | 10 dys? | Fri 16.10.26 | | 0 dys | Mon 05.10.26 |
| 43 | BA2 TGA Grundinstallation | Mon 12.10.26 | 15 dys? | Fri 06.11.26 | | 0 dys | Mon 12.10.26 |
| 44 | BA2 neuer Estrich (mit Beschleuniger) | Mon 19.10.26 | 10 dys? | Fri 30.10.26 | | 0 dys | Mon 19.10.26 |
| 45 | BA2 Fertigstellung Raumstruktur Oberflächen Wand/Decke | Mon 02.11.26 | 5 dys? | Fri 06.11.26 | | 0 dys | Mon 02.11.26 |
| 46 | BA2 Maler | Mon 09.11.26 | 5 dys? | Fri 13.11.26 | | 0 dys | Mon 09.11.26 |
| 47 | BA2 Bodenbelag | Mon 16.11.26 | 10 dys? | Fri 27.11.26 | | 0 dys | Mon 16.11.26 |
| 48 | BA2 Grundreinigung | Mon 30.11.26 | 1 dy? | Mon 30.11.26 | | 0 dys | Mon 30.11.26 |
| 49 | BA2 TGA Feininstallation | Wed 25.11.26 | 10 dys? | Tue 08.12.26 | | 0 dys | Wed 25.11.26 |
| 50 | BA2 Möbelinstallation | Tue 01.12.26 | 4 dys? | Fri 04.12.26 | | 0 dys | Tue 01.12.26 |
| 51 | BA2 Hygienereinigung | Mon 07.12.26 | 2 dys? | Tue 08.12.26 | | 0 dys | Mon 07.12.26 |
| 52 | | | | | | | |
| 53 | Abnahme Gewerke | Wed 09.12.26 | 3 dys? | Fri 11.12.26 | | 0 dys | Wed 09.12.26 |
| 54 | Mängelbeseitigung | Mon 14.12.26 | 5 dys? | Fri 18.12.26 | | 0 dys | Mon 14.12.26 |
| 55 | | | | | | | |
| 56 | BA2 Nutzerübergabe | Fri 18.12.26 | 0 dys? | Fri 18.12.26 | | 0 dys | Fri 18.12.26 |

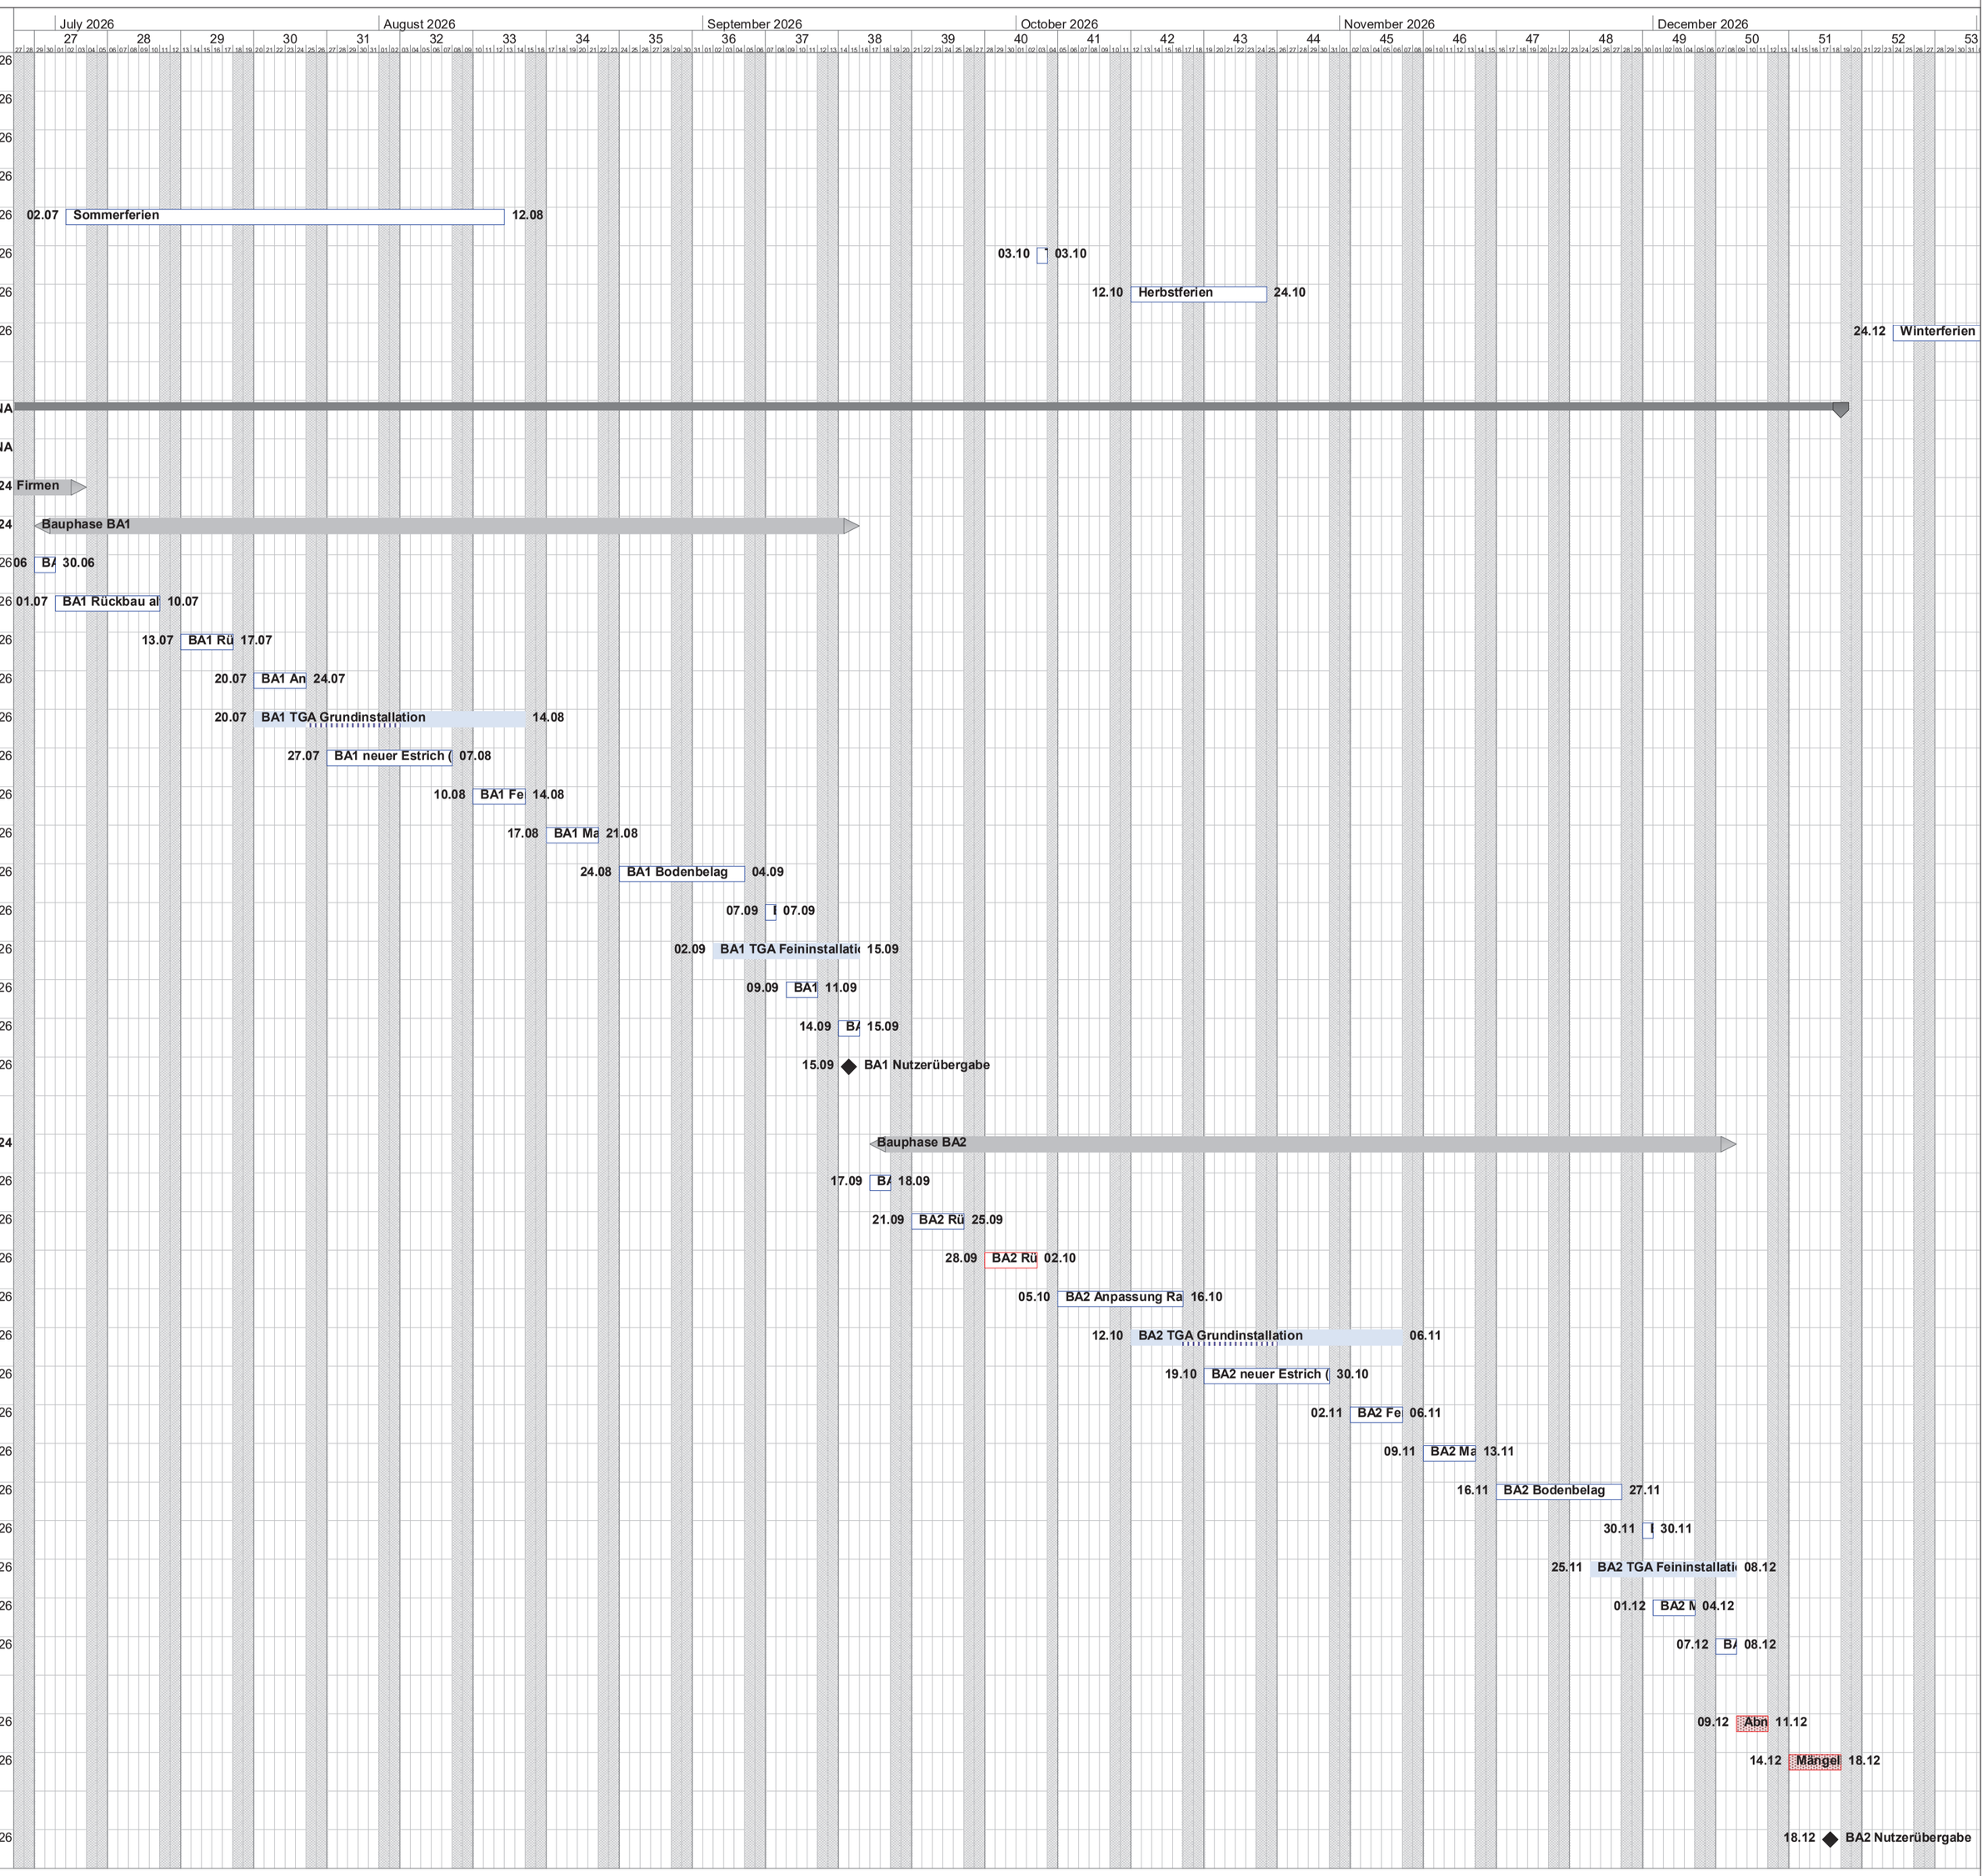


Projekt: Bauzeitenplan ZNA Gehr
Datum: Thu 07.05.26

Vorgang | Sammelvorgang | Externer Meilenstein | Baufirmen | Inactive Milestone | Manual Task | Manual Summary | External Tasks | Stichtag
Unterbrechung | Projektsammelvorgang | Bauherr | Fachplaner | Inactive Milestone | Duration-only | Start-only | External Milestone
Meilenstein | Externe Vorgänge | Architekt | Inactive Task | Inactive Summary | Manual Summary Rollup | Finish-only | In Arbeit
