ANDREAS ROSENMANN
FIRMA MUSTERMANN GMBH & CO KG
Obstleitung 102 a D - 39092 Schwaan
Tel.: +49 (0)1 23 / 45 67 - 0 Fax: +49 (0)189 - 73 15 1-02
eMail: info@mustermann.de

22.02 Sporthalle Friedrich-Franz-Gymnasium PCH - Sanierung

Nr.	Vorgg	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Einschränkungsdatum
1		**22_02 Sporthalle Friedrich-Franz-Gymnasium PCH - "Sanierung Fliesenbereich/Toilettenbereich"**	**435 Tage**	**Mon 08.09.25**	**Mi 24.05.27**		
2		**Planung**	**45 Tage**	**Mon 23.02.26**	**Do 29.04.26**		**NV**
3		**LPH 8 LT. Vorbereitung/Abhaltung der Vergabe**	**15 Tage**	**Fre 01.05.26**	**Fre 05.04.27**		**NV**
4		**Architekt**	**232 Tage**	**Do 01.05.26**	**Fre 05.04.27**		**NV**
5		**TGA -Elektro**	**51 Tage**	**Fre 02.01.26**	**Mon 31.03.26**		**NV**
6		**TGA - HLS**	**80 Tage**	**Fre 02.01.26**	**Mon 27.04.26**		**NV**
7		**LPH 2 - Vorplanung**	**45 Tage**	**Mon 23.02.26**	**Do 29.04.26**		**NV**
8		**Baugutachten/Bauantrag**	**1 Tag**	**Mon 08.09.25**	**Mon 08.09.25**		**Mon 08.09.25**
9		**Bauantrag**	**440 Tage**	**Do 09.09.25**	**Mon 31.05.27**		**NV**
10		**Los 01.1 - Baustelleneinrichtung**	**395 Tage**	**Do 09.09.25**	**Don 15.04.27**		**NV**
11		Los 01.1 - Baustelleneinrichtung	15 Tage	Do 09.09.25	Mon 29.09.25	48	NV
12		Los 01.1 - Baustelleneinrichtung vorhalten	380 Tage	Do 30.09.25	Don 15.04.27	11	NV
13		**Los 01.2 - Abbrucharbeiten**	**195 Tage**	**Mon 29.09.25**	**Fre 10.07.26**		**NV**
14		Entkernung Allgemein (INr/F8 usw.)	145 Tage	Mon 29.09.25	Fre 26.06.26	5;10;X-1 Tag	NV
15		Rückbau Estrich + Bodenguß Sporthalle	90 Tage	Mon 02.03.26	Fre 10.07.26	16;6;A	NV
16		Rückbau Eischichtdeckung Gebäudeteil	20 Tage	Mon 02.03.26	Mon 30.03.26		Mon 02.03.26
17		Rückbau metallene Dachkappen auf Sozialtrakt	5 Tage	Don 02.07.26	Don 09.07.26	13;14;E-1 Tag	NV
18		**Los 02 - Erweiterartarbe Rohbau + Rückbau**	**216 Tage**	**Mon 13.04.26**	**Mon 22.02.27**		**NV**
19		Rückbau Anbau "SWK" Achse 1-3	10 Tage	Mon 13.04.26	Fre 24.04.26	56	Mon 13.04.26
20		Rückbau Anbau Achse 21-22	12 Tage	Mon 20.04.26	Mit 06.05.26	59;X-1 Tage	NV
21		Rückbau Windfang Sozialtrakt	4 Tage	Mon 27.04.26	Don 30.04.26	59;A+10 Tage	NV
22		**Ab 1**	**48 Tage**	**Mon 11.05.26**	**Fre 17.07.26**		**NV**
23		**Kegelbahn Achse 1-3/N**	**48 Tage**	**Mon 11.05.26**	**Fre 17.07.26**		**NV**
24		Erstellung Außenwand Kegelbahn Achse 1/N	48 Tage	Mon 11.05.26	Fre 17.07.26		Mon 11.05.26
25		**Sporthalle**	**48 Tage**	**Mon 11.05.26**	**Fre 17.07.26**		**NV**
26		Erstellung Außenwand Sporthalle (Stützen) Achse 1/F-N	48 Tage	Mon 11.05.26	Fre 17.07.26	60;64AA	NV
27		Erstellung Außenwand Sporthalle (Stützen) Achse 21/F-N	43 Tage	Die 19.05.26	Fre 17.07.26	66AA+5 Tage	NV
28		**Ab 2**	**45 Tage**	**Mon 06.07.26**	**Fre 04.09.26**		**NV**
29		**Kegelbahn Achse 21/N-S2**	**45 Tage**	**Mon 06.07.26**	**Fre 04.09.26**		**NV**
30		Werkplanung/Produktion Stahlbau + Montage	20 Tage	Mon 06.07.26	Fre 31.07.26	73AA-5 Tage	NV
31		Erstellung Außenwand Kegelbahn Achse 21/N-S2	25 Tage	Mon 03.08.26	Fre 04.09.26	70	NV
32		**Sozialtrakt**	**7 Tage**	**Mon 13.07.26**	**Die 21.07.26**		**NV**
33		Rückbau/Erneuerung/Abdichtung Außenwand Sozialtrakt Achse 3/N1-E	7 Tage	Mon 13.07.26	Die 21.07.26	66E4-5 Tage;E5A-5	NV
34		Rückbau/Erneuerung/Abdichtung Außenwand Sozialtrakt Achse 2/N1-E	7 Tage	Mon 13.07.26	Die 21.07.26	73E4-10 Tage;E5A-5	NV
35		**Ab 3**	**53 Tage**	**Mon 20.07.26**	**Mit 30.09.26**		**NV**
36		**Sozialtrakt**	**53 Tage**	**Mon 20.07.26**	**Mit 30.09.26**		**NV**
37		Bodenaushub/Planum	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26	74E4-2 Tage	NV
38		ENBAU HAUSENTWÄHRUNGEN / MEDIENPARTN (ELEKTRO, INTERNET, TW) + FERNWÄRME parallel Erdeu-Arbeiten Sozialtrakt Ost	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26	205A4	NV
39		Streifen- und Einzelfundamente	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26	77;240EA-5 Tage	NV
40		Sauberkeitsschicht (größer als wie 07.08 möglich!)	5 Tage	Mon 24.08.26	Fre 28.08.26	79EA+10 Tage	NV
41		Dämmung, Bewehrung, Bodenplatte	8 Tage	Mon 31.08.26	Mit 09.09.26	80	NV
42		Innen- Anbinde/Ostseite/Ringbalken	10 Tage	Don 17.09.26	Mit 30.09.26	84EA-5 Tage	NV
43		Wandöffnungen Sozialtrakt Herstellen/Schließen	10 Tage	Don 17.09.26	Mit 30.09.26	84AA+5 Tage	NV
44		Außenwand neu Achse 3+21/N1-E	10 Tage	Don 10.09.26	Mit 23.09.26	83	NV
45		Fensteraugurbarten (innen)	10 Tage	Don 10.09.26	Mit 23.09.26	83E1+5 Tage	NV
46		**Sporthalle**	**Do 17.09.26**	**Mit 14.10.26**			**NV**
47		Außenarbeiten (Tür- und Fensteröffnungen, schließen/herstellen)	20 Tage	Do 17.09.26	Mit 14.10.26	84E4-5 Tage	NV
48		**Ab 4**	**48 Tage**	**Mon 27.07.26**	**Mit 30.09.26**		**NV**
49		**Anbau Achse A0-A1**	**48 Tage**	**Mon 27.07.26**	**Mit 30.09.26**		**NV**
50		Bodenaushub/Planum	3 Tage	Mon 27.07.26	Mit 29.07.26	77	NV
51		Gründung (Streifenfundamente)	5 Tage	Mon 24.08.26	Fre 28.08.26	92;6A-5 Tage	NV
52		Gründung (Sauberkeitsschicht+Dämmung+Bodenplatte)	10 Tage	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26	90A+22 Tage;DA	NV
53		Anbinde/Stützen/Ringbalken	10 Tage	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26	92	NV
54		Bodenaugurbarten (innen)	3 Tage	Mon 28.09.26	Mit 30.09.26	87	NV
55		**Ab 5**	**116 Tage**	**Don 03.09.26**	**Mon 22.02.27**		**NV**
56		**Sporthalle**	**116 Tage**	**Don 03.09.26**	**Mon 22.02.27**		**NV**
57		Wandöffnungen Halle Herstellen/Schließen (ESI)	20 Tage	Don 03.09.26	Mit 30.09.26	82AA-20 Tage;E6A-5	NV
58		Fensteröffnung teilweise schließen	4 Tage	Mon 09.11.26	Don 12.11.26	153	NV
59		Stahlbau Sportgerüte	15 Tage	Die 26.01.27	Mon 15.02.27	192	NV
60		Gründungsarbarten Sportgerüte	15 Tage	Die 02.02.27	Mon 22.02.27	96EA-10 Tage	NV
61		**Los 03 - Gerüst**	**230 Tage**	**Don 09.07.26**	**Don 10.06.27**		**NV**
62		Gerüste innen Sporthalle, verschieben nach Bedarf	200 Tage	Don 30.08.26	Don 10.06.27	57AA-10 Tage	NV
63		Gerüste Halle, verschieben nach Bedarf	200 Tage	Don 09.07.26	Die 27.04.27		Don 09.07.26
64		Gerüste Sozialtrakt, verschieben nach Bedarf	120 Tage	Don 24.09.26	Fre 19.03.27	84	NV
65		**Los 04.1 - Zimmermannsarbeiten**	**62 Tage**	**Don 20.08.26**	**Fre 13.11.26**		**NV**
66		**Sozialtrakt**	**5 Tage**	**Don 24.09.26**	**Mi 30.09.26**		**NV**
67		Attika	5 Tage	Don 24.09.26	Mit 30.09.26	84	NV
68		**Anbau**	**35 Tage**	**Mon 26.09.26**	**Fre 13.11.26**		**NV**
69		Fachdachkonstruktion + Attika	15 Tage	Mon 26.09.26	Fre 16.10.26	93	NV
70		Unterdecke Vordach	5 Tage	Mon 09.11.26	Fre 13.11.26	120	NV
71		**Sporthalle**	**25 Tage**	**Don 20.08.26**	**Mit 23.09.26**		**NV**
72		Rückbau Sandwichplatten	20 Tage	Don 20.08.26	Mit 16.09.26	67;84EA-25 Tage	Mon 11.05.26
73		Einbau Dachkonstruktion Pfetten+OSB	25 Tage	Don 20.08.26	Mit 23.09.26	111AA	NV
74		**Los 04.2 - Dachdecker**	**195 Tage**	**Fre 07.07.26**	**Mit 31.04.27**		**NV**
75		**Sporthalle**	**195 Tage**	**Fre 07.07.26**	**Mit 31.04.27**		**NV**
76		Außenwand Kegelbahn Achse 1-3/N	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26	66EA+10 Tage	Mon 11.05.26
77		Außenwand Kegelbahn Achse 21/N-S2	5 Tage	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26	71	Mon 11.05.26
78		**Anbau**	**131 Tage**	**Don 08.10.26**	**Mit 21.04.27**		**NV**
79		**Aufmaß + Werkplanung**	7 Tage	Don 08.10.26	Mon 19.10.26	120AE	NV
80		Abdichtung + Dämmung + Entwässerung	15 Tage	Mon 19.10.26	Fre 06.11.26	109	NV
81		Entwässerung (Fallrohre usw.)	5 Tage	Don 15.04.27	Mit 21.04.27	139	NV
82		**Sozialtrakt**	**81 Tage**	**Fre 10.07.26**	**Fre 30.10.26**		**NV**
83		Dampfsperre (Notabdichtung)	3 Tage	Fre 10.07.26	Die 14.07.26		Fre 10.07.26
84		Dampfsperre fertigstellen	5 Tage	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26	109	NV
85		**Aufmaß + Werkplanung**	**5 Tage**	**Mon 05.10.26**	**Mon 12.10.26**	**126AE**	NV
86		Abdichtung + Dämmung + Entwässerung	15 Tage	Mon 12.10.26	Fre 30.10.26	107;116A+5 Tage	NV
87		**Sporthalle**	**157 Tage**	**Mit 02.09.26**	**Mit 21.04.27**		**NV**
88		Aufmaß + Werkplanung	3 Tag	Mit 02.09.26	Mit 02.09.26	113EE-15 Tage	NV
89		Abdichtung + Dämmung	30 Tage	Don 03.09.26	Mit 14.10.26	128	NV
90		Entwässerung (Fallrohre usw.)	5 Tage	Don 15.04.27	Mit 21.04.27	137	NV
91		**Los 04.3 - Fassade**	**25 Tage**	**Don 19.11.26**	**Mit 23.12.26**		**NV**
92		Unterkonstruktionsbodenplatten	20 Tage	Don 19.11.26	Mit 16.12.26	165A-10 Tage;10	NV
93		UK+Fassadenplatten	20 Tage	Don 19.11.26	Mit 16.12.26	165A-10 Tage;10	NV
94		**Los 05 - WDVS, Außenputz**	**129 Tage**	**Mon 05.10.26**	**Mit 14.04.27**		**NV**
95		Kegelbahn Achse 1-3/N	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26	64EA+30 Tage;10	NV
96		Kegelbahn Achse 21/N-S2	10 Tage	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26	71EA+15 Tage;11	NV
97		Sporthalle (Giebel + Kegelbahn)	35 Tage	Die 23.02.27	Mit 14.04.27	154EA+15 Tage;6	NV
98		Sporthalle (Sozialtrakt)	35 Tage	Die 23.02.27	Mit 14.04.27	154EA+15 Tage;1	NV
99		Sozialtrakt/Anbau	35 Tage	Die 23.02.27	Mit 14.04.27	120EA+30 Tage;1	NV
100		**Los 06 - Innenputz**	**25 Tage**	**Mon 30.11.26**	**Don 12.01.27**		**NV**
101		Sporthalle	10 Tage	Die 01.12.26	Mon 14.12.26	154	NV
102		Sozialtrakt+ Anbau	25 Tage	Mon 30.11.26	Don 12.01.27	158;188EA-20 Tag	NV
103		**Los 07 - Fliesen und Plattenarbeiten**	**30 Tage**	**Mit 03.02.27**	**Don 22.04.27**		**NV**
104		Sozialtrakt + Anbau	30 Tage	Mit 03.02.27	Don 22.04.27	148;182;225	NV
105		**Los 08 - Estrich**	**40 Tage**	**Mit 13.01.27**	**Die 09.03.27**		**NV**
106		**Sozialtrakt + Anbau**	**40 Tage**	**Mit 13.01.27**	**Die 09.03.27**		**NV**
107		Dämmung + Estrich (einschl. Unterbrechung Eiba)	25 Tage	Mit 13.01.27	Die 16.02.27	163AA+10 Tage;142	NV
108		Trocknung	15 Tage	Mit 17.02.27	Die 09.03.27	147	NV
109		**Los 09 - Außentreppen und Türen, Metallgrundelemente + Sonnenschutz**	**51 Tage**	**Mon 21.09.26**	**Mon 30.11.26**		**NV**
110		**Sporthalle - Vergleasung**	**51 Tage**	**Mon 21.09.26**	**Mon 30.11.26**		**NV**
111		Aufmaß	2 Tage	Mon 21.09.26	Die 22.09.26	113EA-3 Tage	NV
112		Werkplanung + Lieferzeit	30 Tage	Mit 23.09.26	Die 03.11.26	111	NV
113		Rückbau Copilith Verglasung	3 Tage	Mit 04.11.26	Fre 06.11.26	112	NV
114		Einbau/Montage	12 Tage	Fre 13.11.26	Mon 30.11.26	98	NV
115		**Sozialtrakt + Anbau (Fenster + Außentüren)**	**42 Tage**	**Don 22.09.26**	**Mit 18.11.26**		**NV**
116		Aufmaß	2 Tage	Don 22.09.26	Mit 23.09.26	56EA-5 Tage;84EA	NV
117		Werkplanung + Lieferzeit	30 Tage	Don 24.09.26	Mit 04.11.26	156	NV
118		Einbau/Montage	10 Tage	Don 05.11.26	Mit 18.11.26	117	NV
119		**Los 10 - Sportboden**	**35 Tage**	**Don 22.04.27**	**Fre 11.06.27**		**NV**
120		Abdichtung	5 Tage	Don 22.04.27	Mit 28.04.27	170EA-15 Tage	NV
121		Dämmung + Sportbodenheizung	15 Tage	Don 29.04.27	Fre 21.05.27	160	NV
122		Sportbodenbelag	10 Tage	Mon 24.05.27	Fre 04.06.27	161	NV
123		Sportbodenfertigstellung + Linierung	5 Tage	Mon 07.06.27	Fre 11.06.27	162	NV
124		**Los 11 - Prallwand (Tore/Türen)**	**136 Tage**	**Don 01.10.26**	**Fre 21.05.27**		**NV**
125		**Sporthalle**	**136 Tage**	**Don 01.10.26**	**Fre 21.05.27**		**NV**
126		**Einbauelemente**	**131 Tage**	**Don 01.10.26**	**Don 15.05.27**		**NV**
127		Aufmaß	3 Tag	Don 01.10.26	Don 01.10.26	97;87EA-15 Tage	NV
128		Werkplanung	10 Tage	Fre 02.10.26	Don 15.10.26	127	NV
129		**Lieferzeit**	**125 Tage**	**Fre 16.10.26**	**Mit 21.04.27**	**128**	NV
130		Einbau/Montage	15 Tage	Don 22.04.27	Don 15.05.27	152;169	NV
131		**Prallwand**	**136 Tage**	**Don 01.10.26**	**Fre 21.05.27**		**NV**
132		Aufmaß	3 Tag	Don 01.10.26	Don 01.10.26	167AA	NV
133		Lieferzeit /Produktion	60 Tage	Die 26.01.27	Don 22.04.27	174AE	NV
134		Einbau	20 Tage	Don 22.04.27	Fre 21.05.27	170EA-15 Tage	NV
135		**Los 12 Ballwurfsatz**	**5 Tage**	**Mit 03.02.27**	**Die 09.02.27**		**NV**
136		Wiedereinbau / Montage	5 Tage	Mit 03.02.27	Die 09.02.27	233	NV
137		**Los 13 - Maler+ Tapezierarbeiten**	**46 Tage**	**Don 23.03.27**	**Mon 31.05.27**		**NV**
138		Sporthalle	20 Tage	Don 23.03.27	Don 22.04.27	174AE	NV
139		Sozialtrakt	25 Tage	Fre 23.04.27	Mon 31.05.27	184;144;142	NV
140		**Los 14 - Bodenbelagsarbeiten**	**35 Tage**	**Die 23.02.27**	**Mon 14.04.27**		**NV**
141		Sozialtrakt	20 Tage	Die 23.02.27	Mon 14.04.27	178EA-10 Tage	NV
142		**Los 15 - Trockenbau**	**65 Tage**	**Mon 09.11.26**	**Don 10.02.27**		**NV**
143		Innenwände (Ost- und Endmontage), seitlich versetzt	40 Tage	Mon 09.11.26	Don 12.01.27	92EA+5 Tage;120	NV
144		Decken (Vor- und Endmontage), seitlich versetzt	20 Tage	Mit 20.01.27	Die 16.02.27	233EA-10 Tage	NV
145		**Los 16 - Tischlerarbeiten (Innentüren)**	86 Tage	Mon 09.11.26	Mit 17.03.27		NV
146		**Sozialtrakt + Anbau**	**86 Tage**	**Mon 09.11.26**	**Mit 17.03.27**		**NV**
147		Aufmaß /Lieferzeit	25 Tage	Mon 09.11.26	Mon 14.12.26	168AE	NV
148		Zargen Einbau/Montage	10 Tage	Mon 14.12.26	Die 05.01.27	233EA-10 Tage;91	NV
149		Türblatt Einbau/Montage	30 Tage	Mit 06.01.27	Mit 17.03.27	148;145;148	NV
150		**Los 17 - Raumschließung**	**5 Tage**	**Die 23.02.27**	**Mon 21.06.27**	**191**	NV
151		**Los 18.1 - Sportgeräte**	**97 Tage**	**Fre 23.02.27**	**Fre 11.06.27**		**NV**
152		Aufmaß /ggf. Werkplanung	2 Tage	Fre 23.02.27	Die 26.01.27	174AE-60 Tage	NV
153		Lieferzeiten	35 Tage	Die 26.01.27	Mon 15.03.27	192	NV
154		Montage	20 Tage	Fre 14.05.27	Fre 11.06.27	193;95;146A-5 T	NV
155		**Los 18.2 - Turnwerkung**	**65 Tage**	**Don 01.10.26**	**Fre 08.01.27**		**NV**
156		Aufmaß /ggf. Werkplanung	2 Tage	Don 01.10.26	Fre 02.10.26	129EA-10 Tage	NV
157		Lieferzeit Produktion	60 Tage	Mon 05.10.26	Don 05.01.27	196	NV
158		Montage / Einbau	3 Tage	Mit 06.01.27	Fre 08.01.27	197	NV
159		**Los 19 - Außenanlagen**	**30 Tage**	**Mit 17.03.27**	**Don 29.04.27**		**NV**
160		Außenanlagen komplett (MITTERLING)	30 Tage	Mit 17.03.27	Don 29.04.27	118;E+5 Tage;23	NV
161		**Los 20 - Holzbinderversiegelung**	15 Tage	Don 15.10.26	Mit 04.11.26		NV
162		Holzbinderversiegelung Sporthalle	15 Tage	Don 15.10.26	Mit 04.11.26	129	NV
163		**TGA - HLS (begleitend)**	**202 Tage**	**Don 09.07.26**	**Don 29.04.27**		**NV**
164		**Hausanschlüsse**	**10 Tage**	**Mon 27.07.26**	**Fre 31.07.26**		**NV**
165		Hausanschlüsse TW + Elektro + Medien (Telefon, Internet usw.)	5 Tage	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26	240AA	NV
166		Prüfung + Freigabe Mitte-Planung Fernwärme	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26	207	NV
167		Beschaffung / Lieferung Fernwärmeübergabestat	30 Tage	Mon 24.08.26	Mon 05.10.26	208AE	NV
168		Montage Fernwärmeübergabestation	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26	93EA+5 Tage	NV
169		Trinkwasseranschluss	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26	91;208AA	NV
170		Inbetriebnahme + Einweisung Hausanschlüsse	5 Tage	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26	209	NV
171		**Los 20 - Heizung**	**76 Tage**	**Mon 26.10.26**	**Mit 17.02.27**		**NV**
172		Montageplanung	10 Tage	Mon 26.10.26	Mon 09.11.26	211AE	NV
173		Prüfung + Freigabe Montageplanung	5 Tage	Mon 09.11.26	Mon 16.11.26	214AE	NV
174		Beschaffung / Lieferung	30 Tage	Mon 16.11.26	Mit 06.01.27	215AE	NV
175		Vorbereitung (HKV)	10 Tage	Mit 06.01.27	Mit 20.01.27	216AE	NV
176		Fußbodenheizung (Sozialtrakt) verlegen	10 Tage	Mit 20.01.27	Die 02.02.27	147AA+5 Tage	NV
177		Inbetriebnahme Fußbodenheizung	4 Tage	Mit 03.02.27	Mon 08.02.27	216	NV
178		Einweisung Betreiber Heizung	2 Tage	Die 16.02.27	Mit 17.02.27	217;5A+5 Tage	NV
179		**Los 21 - Sanitär**	**108 Tage**	**Don 27.09.26**	**Don 24.02.27**		**NV**
180		**Installat + Sanitärtrakt**	**108 Tage**	**Don 27.09.26**	**Don 24.02.27**		**NV**
181		Montageplanung Sanitär	10 Tage	Don 27.09.26	Mon 11.09.26	211AE	NV
182		Prüfung + Freigabe Montageplanung	5 Tage	Mon 21.09.26	Mon 28.09.26	213AE	NV
183		Beschaffung / Lieferung Sanitär + Installationsel	30 Tage	Mon 28.09.26	Mon 09.11.26	214AE	NV
184		Montage Installationselemente (GG-Wände)	15 Tage	Mon 09.11.26	Fre 27.11.26	183AA	NV
185		Leitungsverlegung	20 Tage	Mon 16.11.26	Fre 11.12.26	224AA+5 Tage	NV
186		Montage Sanitärelemente	30 Tage	Mit 03.01.27	Fre 21.04.27	224;176AE	NV
187		Inbetriebnahme	5 Tage	Fre 23.04.27	Don 29.04.27	226	NV
188		**Los 22 - Lüftung**	**70 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Don 02.02.27**		**NV**
189		**Sozialtrakt**	**70 Tage**	**Mon 19.10.26**	**Don 02.02.27**		**NV**
190		Montageplanung Lüftung (Sozialtrakt und Sporthalle)	10 Tage	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26	231	NV
191		Prüfung + Freigabe Montageplanung Lüftung	5 Tage	Mon 19.10.26	Mon 26.10.26	232AE	NV
192		Beschaffung / Lieferung Lüftung	40 Tage	Mon 26.10.26	Mon 21.12.26	233AE	NV
193		Montage / Arbeitsvorbereitung Lüftung	25 Tage	Mon 21.12.26	Die 02.02.27	234;183EA-10 Tage	NV
194		**Sporthalle**	**27 Tage**	**Don 05.11.26**	**Fre 11.12.26**		**NV**
195		Montage / Arbeitsvorbereitung (AO-A1) Lüftung	25 Tage	Don 05.11.26	Mit 09.12.26	202	NV
196		Inbetriebnahme + Einweisung Betreiber Lüftu	2 Tage	Don 10.12.26	Fre 11.12.26	235	NV
197		**Los 24 - Elektroinstallationsarbeiten**	236 Tage	Don 09.07.26	Mon 29.04.27		NV
198		Grundleitungen Außerhalb Gebäude	25 Tage	Don 09.07.26	Mit 12.08.26	241AA+10 Tage	NV
199		Alle Grundleitungen im Außenbereich verschließen	5 Tage	Don 09.07.26	Mit 15.07.26	198AA	NV
200		Grundleitungen Sozialtrakt	5 Tage	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26	77	NV
201		Grundleitungen Sanitärtrakt	5 Tage	Don 30.07.26	Mit 05.08.26	90	NV
202		Inbetriebnahme Erweiterung	5 Tage	Don 08.04.27	Mit 14.04.27	241;223EA-10 Tag	NV
203		Einweisung Betreiber Erweiterung	3 Tage	Don 15.04.27	Mon 19.04.27	242	NV
204		Los 25 - WC - Trennwände	5 Tage	Fre 09.04.27	Fre 16.04.27	179;4A-5 Tage	NV
205		Los 27 - Dämmarbeiten	15 Tage	Mit 03.02.27	Die 23.02.27	233;235	NV
206		**TGA - Elektro (begleitend)**	**216 Tage**	**Don 16.07.26**	**Fre 26.03.27**		**NV**
207		Los 23 - Elektro (begleitend)	130 Tage	Don 28.09.26	Don 08.04.27	93	NV
208		**Sporthalle**	**130 Tage**	**Don 28.09.26**	**Don 08.04.27**		**NV**
209		Grundleitungen	20 Tage	Don 30.07.26	Mit 12.08.26	198AA+5 Tage	NV
210		Hauseinführung	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26	205	NV
211		Elektro Anschluss (innen)	5 Tage	Don 12.10.26	Fre 16.10.26	208	NV
212		**Sozialtrakt / Anbau**	**177 Tage**	**Don 06.08.26**	**Fre 23.04.27**		**NV**
213		Leitungen	35 Tage	Mit 11.01.27	Don 01.03.27	142;183AA	NV
214		Montage	10 Tage	Fre 09.04.27	Fre 23.04.27	174AE	NV
215		Erdungsarbeiten Sozialtrakt (Streifenfundament)	15 Tage	Don 06.08.26	Mit 26.08.26	78EA-2 Tage	NV
216		Erdungsarbeiten Sozialtrakt (Vollmaschine)	3 Tage	Don 03.09.26	Mon 07.09.26	81EA-5 Tage	NV
217		Erdungsarbeiten Anbau (Streifenfundament)	5 Tage	Mon 31.08.26	Fre 04.09.26	91	NV
218		Erdungsarbeiten Anbau (Vollschneidwalze)	3 Tage	Mon 07.09.26	Mit 09.09.26	92EA-5 Tage	NV
219		**Sporthalle**	**151 Tage**	**Don 15.10.26**	**Fre 28.05.27**		**NV**
220		Leitungen	30 Tage	Don 15.10.26	Mit 25.11.26	129	NV
221		Montage (Decke)	20 Tage	Don 01.11.26	Mit 02.12.26	208	NV
222		Montage (Wände)	15 Tage	Fre 07.05.27	Fre 28.05.27	218EA-10 Tage	NV
223		**Bauherrenabnahme**	**1 Tag**	**Do 22.06.27**	**Do 22.06.27**		**NV**
224		**Abschlussbesprechung vor Fördermittelantrag**	**1 Tag**	**Mi 04.08.27**	**Mi 04.08.27**	**222EA+30 Tage**	**NV**
225		**Erste Bauherrenabnahme (Mahnungsfrist/Dokumentation usw.)**	**1 Tag**	**Mi 04.08.27**	**Mi 04.08.27**	**224AA**	**NV**
226		**Sommerferien bis Ende**	**31 Tage**	**Mon 27.07.26**	**Sam 29.08.26**		NV
227		**Sommerferien NV 2025**	**31 Tage**	**Mon 28.07.25**	**Sam 06.09.25**		NV
228		**Sommerferien NV 2026**	**31 Tage**	**Mon 13.07.26**	**Sam 22.08.26**		NV
229		**Sommerferien NV 2027**	**31 Tage**	**Mon 05.07.27**	**Sam 14.08.27**		NV

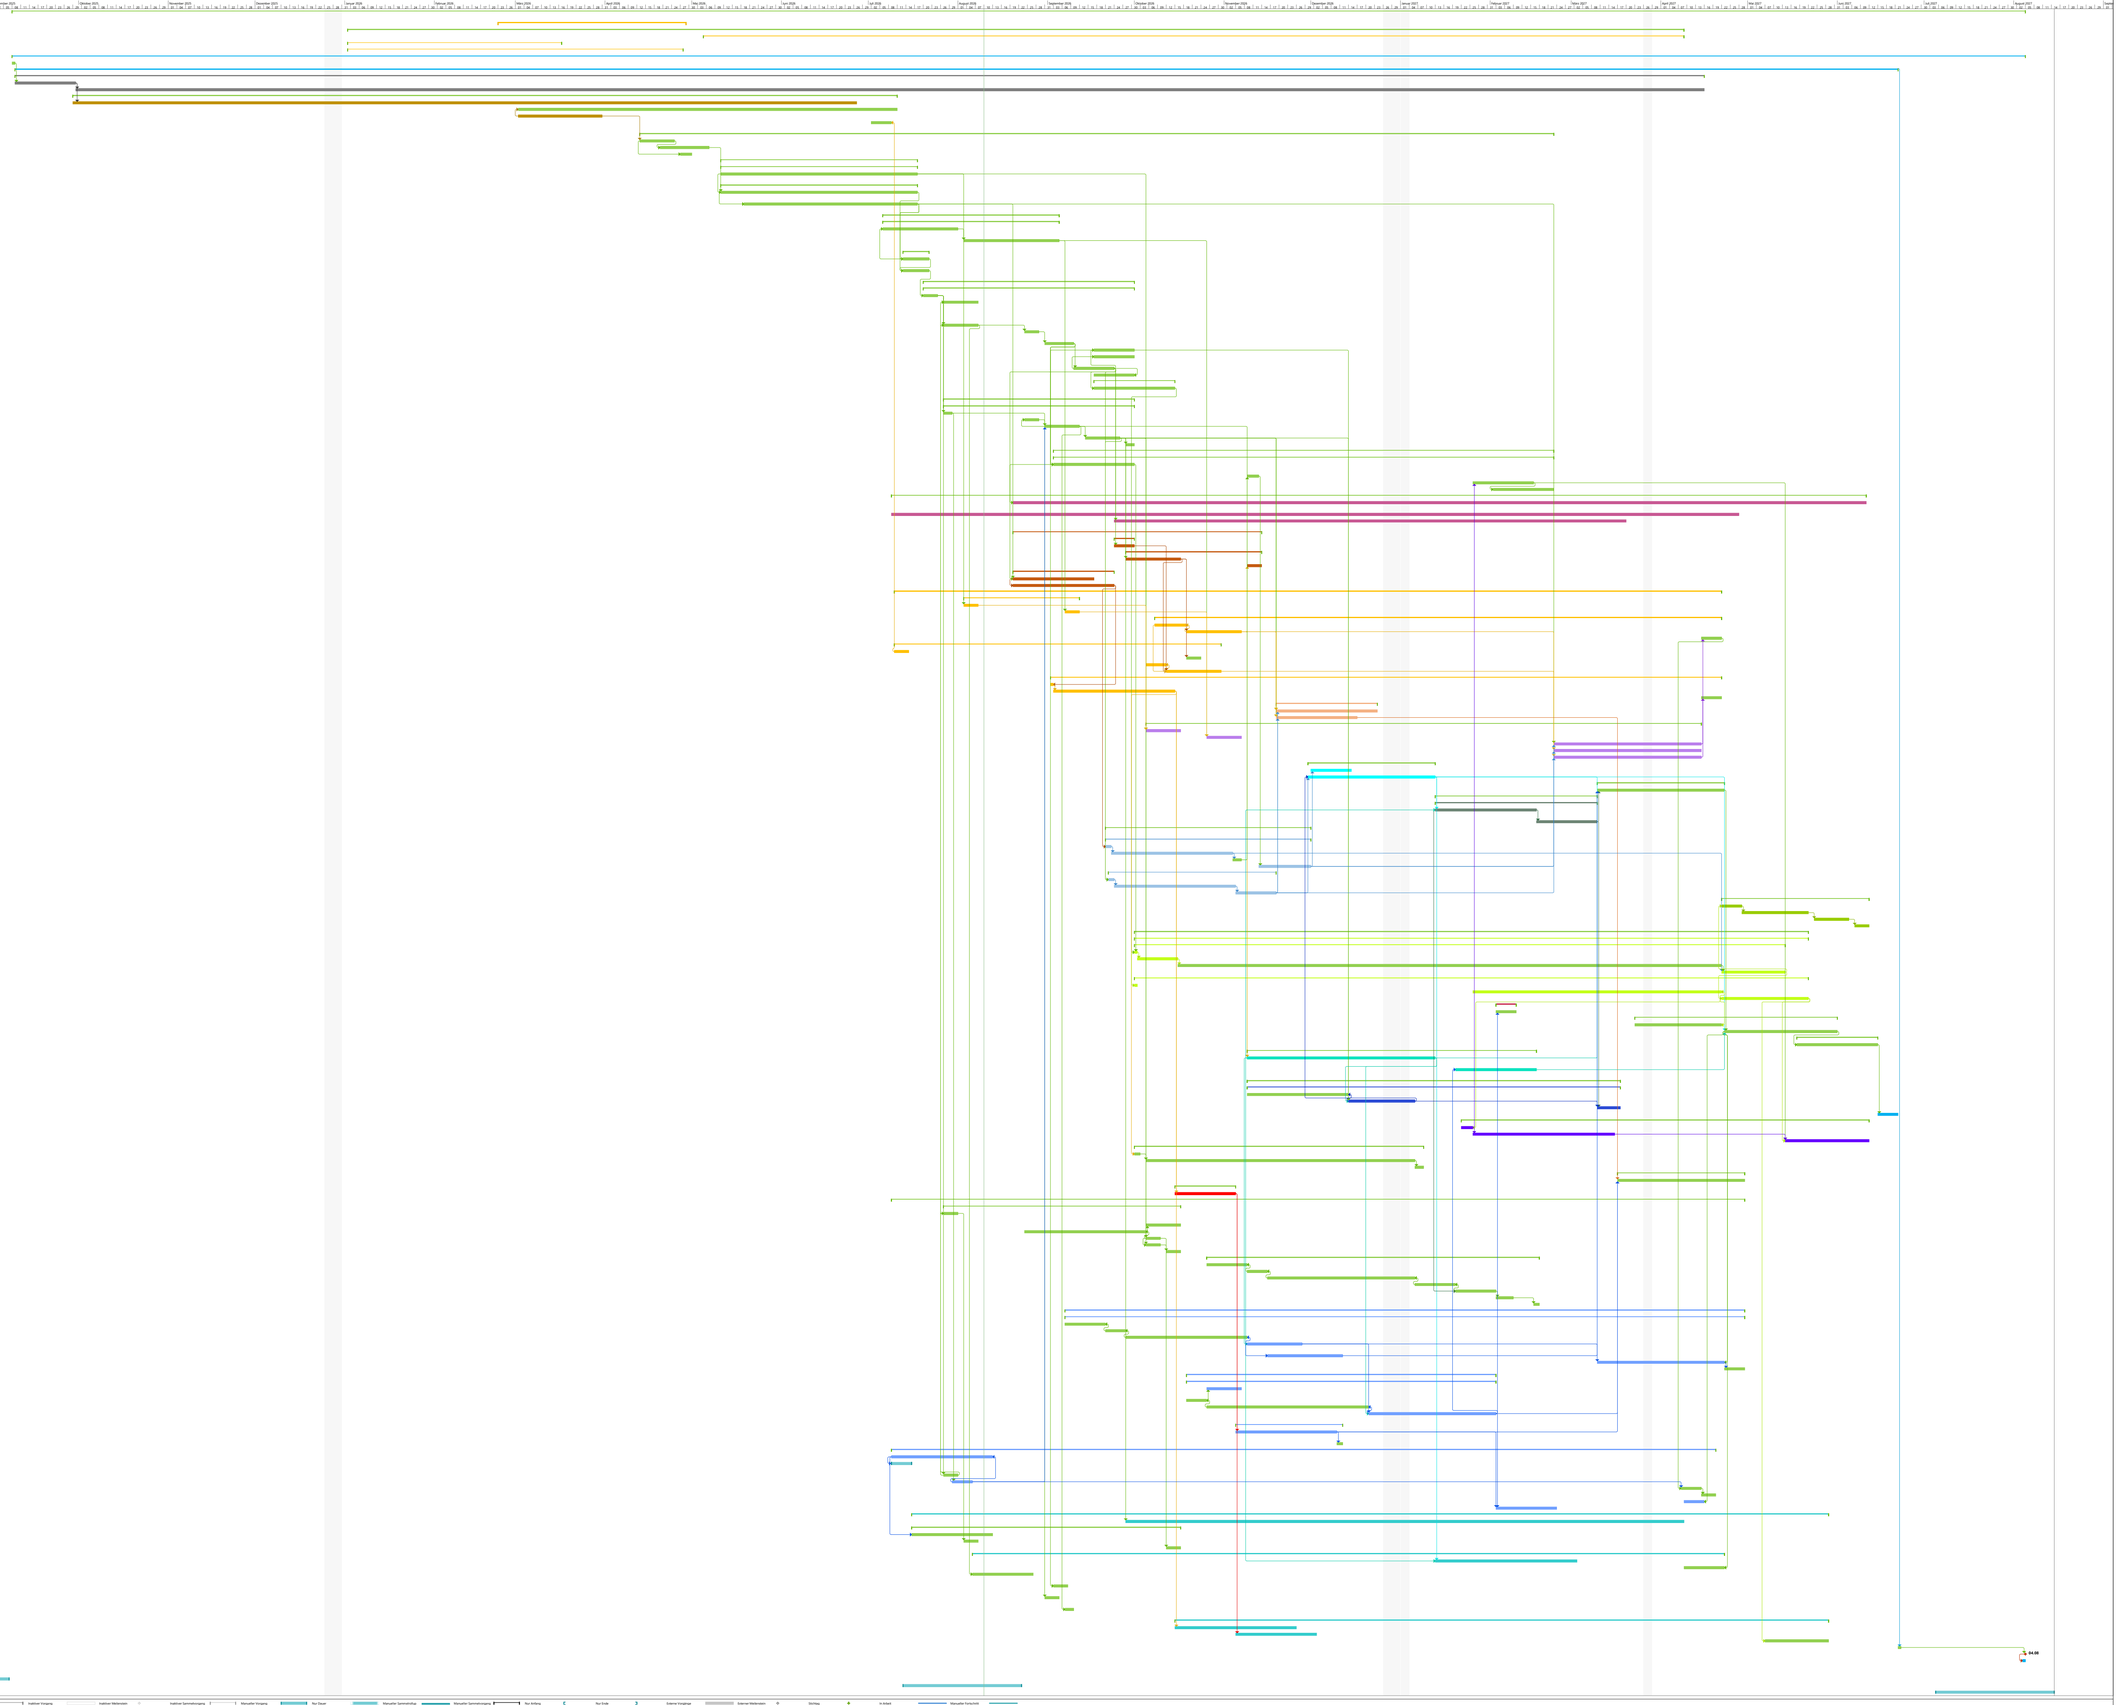

Projekt: 22 04 25_Projektablauf
Datum: Mon 15.08.26

Vorgang | Umsetzung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Inaktiver Projektsammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externer Vorgang | Externer Meilenstein | Stichtag | Ist-Arbeit | Manuelle Fortschritt
