Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**ES-Bau / Vorentwurfsplanung**	**109 Tage**	**Mon 20.02.23**	**Don 20.07.23**
20	**EW-Bau / Entwurfsplanung**	**240 Tage**	**Don 20.07.23**	**Don 20.06.24**
40	**Genehmigungsplanung / Bauantrag**	**125 Tage**	**Fre 12.04.24**	**Don 03.10.24**
46	**Ausführungsplanung**	**270 Tage**	**Mon 22.01.24**	**Fre 31.01.25**
72	**Ausschreibung & Vergabe**	**300 Tage**	**Don 12.09.24**	**Die 04.11.25**
78	**Bauzeit**	**3043 Tage**	**Mon 03.02.25**	**Die 30.09.36**
79	**SCHULNEUBAU - 1.BAUABSCHNITT**	0 Tage	Mon 03.02.25	Mon 03.02.25
80	**1.Bauabschnitt Phase I - Rückbau**	**40 Tage**	**Mon 03.02.25**	**Fre 28.03.25**
87	**1.Bauabschnitt Phase II - Rohbau & Hülle**	**111 Tage**	**Mon 31.03.25**	**Fre 29.08.25**
105	**Zimmermann**	**170 Tage?**	**Mon 28.04.25**	**Don 18.12.25**
120	**Dacharbeiten**	**75 Tage**	**Mon 17.11.25**	**Fre 27.02.26**
121	Notabdichtung & Einbauteile Teil 1 - parall zum Fortschl	10 Tage	Mon 17.11.25	Fre 28.11.25
122	Notabdichtung & Einbauteile Teil 2 - parall zum Fortschrit	10 Tage	Mon 08.12.25	Fre 19.12.25
123	Dachdämmung & Unterlage	50 Tage	Mon 24.11.25	Fre 30.01.26
124	2. Abdichtungsebene / Oberlage	40 Tage	Mon 05.01.26	Fre 27.02.26
125	WEIHNACHTEN & NEUJAHR 2025	10 Tage	Mon 22.12.25	Fre 02.01.26
126	**Fenster & Sonnenschutz**	**196 Tage**	**Mon 02.06.25**	**Fre 27.02.26**
127	Werkplanung	10 Tage	Mon 02.06.25	Fre 13.06.25
128	Prüfung Werkplanung	10 Tage	Mon 16.06.25	Fre 27.06.25
129	Produktion / Bestellzeit	60 Tage	Mon 07.07.25	Fre 26.09.25
130	Montage Fenster EG	10 Tage	Mon 29.09.25	Fre 10.10.25
131	Montage Fenster OG	10 Tage	Mon 08.12.25	Fre 19.12.25
132	Montage Sonnenschutz (6 Wochen nach Aufmaß)	10 Tage	Mon 16.02.26	Fre 27.02.26
133	Winterbaubeheizung KG 400 (Montage)	0 Tage	Fre 10.10.25	Fre 10.10.25
134	**1.Bauabschnitt Phase III - Innenausbau I**	**225 Tage**	**Mon 05.01.26**	**Fre 13.11.26**
135	Trockenbau - Anlegen UK Wände & Decken	135 Tage	Mon 05.01.26	Fre 10.07.26
136	Rohinstallation TGA HS, MSR	70 Tage	Mon 09.02.26	Fre 15.05.26
137	Rohinstallation Elektro	50 Tage	Mon 06.04.26	Fre 12.06.26
138	Lüftung - WMP & Bestellzeit	30 Tage	Mon 16.02.26	Fre 27.03.26
139	Lüftung Installation Erd- & Obergeschoss	80 Tage	Mon 09.03.26	Fre 26.06.26
140	Lüftung Installation Kellergeschoss	10 Tage	Mon 29.06.26	Fre 10.07.26
141	Schließen Trockenbau - Wände & Decken	80 Tage	Mon 20.04.26	Fre 07.08.26
142	Feininstallation TGA: HS, ELT, MSR	50 Tage	Mon 15.06.26	Fre 21.08.26
143	Zimmermann Einblasdämmung AW	15 Tage	Mon 05.01.26	Fre 23.01.26
144	Zimmermann Außenwandbekleidung	30 Tage	Mon 26.01.26	Fre 06.03.26
145	Fensterbänke - Montage (innen)	15 Tage	Mon 09.03.26	Fre 27.03.26
146	Metallbau - Werk- & Montageplanung Außen & Innentü	5 Tage	Mon 02.02.26	Fre 06.02.26
147	Metallbau - Werk- & Montageplanung Prüfung	5 Tage	Mon 09.02.26	Fre 13.02.26
148	Metallbau - Bestellzeiten	50 Tage	Mon 16.02.26	Fre 24.04.26
149	Metallbau - Montage	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26
150	Estrich KG	5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26
151	Estrich OG	10 Tage	Mon 08.06.26	Fre 19.06.26
152	Estrich EG	10 Tage	Mon 22.06.26	Fre 03.07.26
153	Schlosser - Werk- & Montageplanung	10 Tage	Mon 02.03.26	Fre 13.03.26
154	Schlosser - WMP - Prüfung	10 Tage	Mon 16.03.26	Fre 27.03.26
155	Schlosser - Produktions & Bestellzeit	30 Tage	Mon 30.03.26	Fre 08.05.26
156	Schlosser - Treppen inkl. Geländer	17 Tage	Mon 11.05.26	Die 02.06.26
157	Tischler - Werk- & Montageplanung Türzargen & Alutü	10 Tage	Mon 02.02.26	Fre 13.02.26
158	Tischler - Werk- & Montageplanung Prüfung	5 Tage	Mon 16.02.26	Fre 20.02.26
159	Tischler - Bestellzeiten	90 Tage	Mon 23.02.26	Fre 26.06.26
160	Tischler - Zargenmontage - EG & OG + Stahlblechtürm	15 Tage	Mon 29.06.26	Fre 17.07.26
161	Tischler Wandbekleidung HPL & 3-S-Platte	30 Tage	Mon 13.07.26	Fre 21.08.26
162	WC-Trennwandanlage - Aufmaß inkl Werk&Montagepl	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26
163	Bestellzeit	30 Tage	Mon 28.09.26	Fre 06.11.26
164	WC-Trennwandmontage	5 Tage	Mon 09.11.26	Fre 13.11.26
165	**1.Bauabschnitt Phase IV - Außenbereich**	**185 Tage**	**Mon 05.01.26**	**Fre 18.09.26**
166	Fassade (Zimmermann)	100 Tage	Mon 05.01.26	Fre 22.05.26
167	Dachdecker Attikaabdeckung	10 Tage	Mon 11.05.26	Fre 22.05.26
168	Gerüst - Demontage	10 Tage	Mon 18.05.26	Fre 29.05.26
169	Außenanlagen 1.Bauabschnitt (nur im Bereich Schulneubau + Zugänge Treppenräume) +	80 Tage	Mon 01.06.26	Fre 18.09.26
170	**1.Bauabschnitt Phase V - Innenausbau II**	**120 Tage**	**Mon 25.05.26**	**Fre 06.11.26**
171	Malerarbeiten	70 Tage	Mon 25.05.26	Fre 28.08.26
172	Fliesenarbeiten	25 Tage	Mon 17.08.26	Fre 18.09.26
173	Bodenbelagsarbeiten	30 Tage	Mon 21.09.26	Fre 30.10.26
174	Maler Nacharbeiten	10 Tage	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26
175	Endinstallation TGA HLS, ELT, MSR	60 Tage	Mon 27.07.26	Fre 16.10.26
176	Schließanlage	5 Tage	Mon 19.10.26	Fre 23.10.26
177	Baureinigung	5 Tage	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26
178	**Abnahmen & Übergaben -1.BA**	**70 Tage**	**Mon 02.11.26**	**Fre 05.02.27**
179	Abnahmen & Übergaben	20 Tage	Mon 02.11.26	Fre 27.11.26
180	Mängelbeseitigung	20 Tage	Mon 30.11.26	Fre 25.12.26
181	Inbetriebnahme	20 Tage	Mon 28.12.26	Fre 22.01.27
182	Betriebserlaubnis	0 Tage	Fre 22.01.27	Fre 22.01.27
183	Umzug	10 Tage	Mon 25.01.27	Fre 05.02.27
184	2026 Sommerferien MV	30 Tage	Mon 13.07.26	Fre 21.08.26
185	FOYER - 2.BAUABSCHNITT	370 Tage	Mon 02.03.26	Fre 30.07.27
186	**2. Bauabschnitt Phase I Rohbau & Hülle**	**320 Tage**	**Mon 15.09.25**	**Fre 04.12.26**
187	Rückbau Werkstatt Hausmeister + Rückbau Fluchttrep	20 Tage	Mon 15.09.25	Fre 10.10.25
188	Erdarbeiten	25 Tage	Mon 13.10.25	Fre 14.11.25
189	Feinplanunm / Sauberkeitsschicht	5 Tage	Mon 02.03.26	Fre 06.03.26
190	Einzelfundamente	10 Tage	Mon 09.03.26	Fre 20.03.26
191	Schalung Sohle	5 Tage	Mon 23.03.26	Fre 27.03.26
192	Dämmung & Erder (Blitzschutz)	5 Tage	Mon 30.03.26	Fre 03.04.26
193	Monierarbeiten + Betonage EG - Sohle	5 Tage	Mon 06.04.26	Fre 10.04.26
194	Gerüststellung Aufzug	5 Tage	Mon 13.04.26	Fre 17.04.26
195	Aufzugsschacht	20 Tage	Mon 13.04.26	Fre 08.05.26
196	Stahlbau - Werk- & Montageplanung -Skelettkonstrukti	20 Tage	Mon 04.05.26	Fre 29.05.26
197	Stahlbau- Werk- & Montageplanung Prüfung	10 Tage	Mon 01.06.26	Fre 12.06.26
198	Stahlbau - Bestell & Produktionzeiten	30 Tage	Mon 15.06.26	Fre 24.07.26
199	Gerüststellung Stahlbau	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26
200	Stahlbau Montage - Skelettkonstruktion inkl. Brandsch	20 Tage	Mon 27.07.26	Fre 21.08.26
201	Stahlbetonbau Decke über EG (Steg + Treppenauflage	30 Tage	Mon 24.08.26	Fre 02.10.26
202	Zimmermann - Dachkonstruktion - Foyer	15 Tage	Mon 24.08.26	Fre 11.09.26
203	Fenstermontage - Foyer OG	1 Tag	Mon 05.10.26	Mon 05.10.26
204	Fensterbankmontage innen	1 Tag	Die 06.10.26	Die 06.10.26
205	Notabdichtung Foyer	5 Tage	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26
206	Zimmermann - Fassade	30 Tage	Mon 21.09.26	Fre 30.10.26
207	Dachdämmung inkl. Dachrand	20 Tage	Mon 21.09.26	Fre 16.10.26
208	1. & 2. Abdichtungsebene	15 Tage	Mon 19.10.26	Fre 06.11.26
209	Pfosten-Riegel-Fassade - WMP	10 Tage	Mon 04.05.26	Fre 15.05.26
210	Pfosten-Riegel-Fassade - WMP - Prüfung	10 Tage	Mon 18.05.26	Fre 29.05.26
211	Pfosten-Riegel-Fassade - WMP - Bestellzeit	40 Tage	Mon 24.08.26	Fre 16.10.26
212	Pfosten-Riegel-Fassade - WMP - Montage	10 Tage	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26
213	Schlosser - Produktions- & Bestellzeit	30 Tage	Mon 05.10.26	Fre 13.11.26
214	Schlosser - Geländer	15 Tage	Mon 16.11.26	Fre 04.12.26
215	Sonnenschutz Montage PRF	1 Tag	Mon 02.11.26	Mon 02.11.26
216	Zimmermann - Faserzementplattenfassade - Aufzugss	10 Tage	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26
217	Tischler Arbeiten im Bestand WMP Feuerabschlüsse F	10 Tage	Mon 23.03.26	Fre 03.04.26
218	Tischler - Werk- & Montageplanung Prüfung	10 Tage	Mon 06.04.26	Fre 17.04.26
219	Tischler - Bestellzeiten	60 Tage	Mon 20.04.26	Fre 10.07.26
220	Tischler - Tür & Fenstermontage im Bestand	30 Tage	Mon 13.07.26	Fre 21.08.26
221	**2.Bauabschnitt Phase II - Innenausbau**	**170 Tage**	**Mon 02.11.26**	**Fre 25.06.27**
222	Estrich inkl. Fußbodenheizung	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26
223	Trockenbau - Anlegen UK Decke	16 Tage	Mon 16.11.26	Mon 07.12.26
224	Treppenbelag Sitztreppe	5 Tage	Die 08.12.26	Mon 14.12.26
225	Rohinstallation TGA HLS, ELT, MSR	25 Tage	Mon 16.11.26	Fre 18.12.26
226	Rückbau Haus 2 & Haus 5 nach Umzug ins neue Schu	20 Tage	Mon 08.02.27	Fre 05.03.27
227	WEIHNACHTEN & NEUJAHR 2026	15 Tage	Mon 21.12.26	Fre 08.01.27
228	Aufzugsmontage	15 Tage	Mon 16.11.26	Fre 04.12.26
229	Schließen Trockenbau - Decke	20 Tage	Mon 07.12.26	Fre 01.01.27
230	Fallrohrmontage / Entwässerung finalisieren	3 Tage	Mon 04.01.27	Mit 06.01.27
231	Rückbau Rüstung / Rückbau Rollgerüst	5 Tage	Don 07.01.27	Mit 13.01.27
232	Feininstallation TGA HLS, ELT, MSR	25 Tage	Mon 07.12.26	Fre 08.01.27
233	Fliesen Foyer	20 Tage	Mon 23.11.26	Fre 18.12.26
234	Bodenbelag - Linoleum im Obergeschoss	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26
235	Endinstallation TGA HLS, ELT, MSR	15 Tage	Mon 11.01.27	Fre 29.01.27
236	Rückbau Fluchttreppe	2 Tage	Mon 01.02.27	Die 02.02.27
237	Außenanlagen 2.Bauabschnitt	120 Tage	Mon 11.01.27	Fre 25.06.27
238	**Abnahmen & Übergaben -2.BA**	**55 Tage**	**Mon 01.02.27**	**Fre 16.04.27**
239	Abnahmen & Übergaben	15 Tage	Mon 01.02.27	Fre 19.02.27
240	Mängelbeseitigung	15 Tage	Mon 22.02.27	Fre 12.03.27
241	Inbetriebnahme	15 Tage	Mon 15.03.27	Fre 02.04.27
242	Umzug	10 Tage	Mon 05.04.27	Fre 16.04.27
243	2027 Schulferien Sommer MV	30 Tage	Mon 05.07.27	Fre 13.08.27

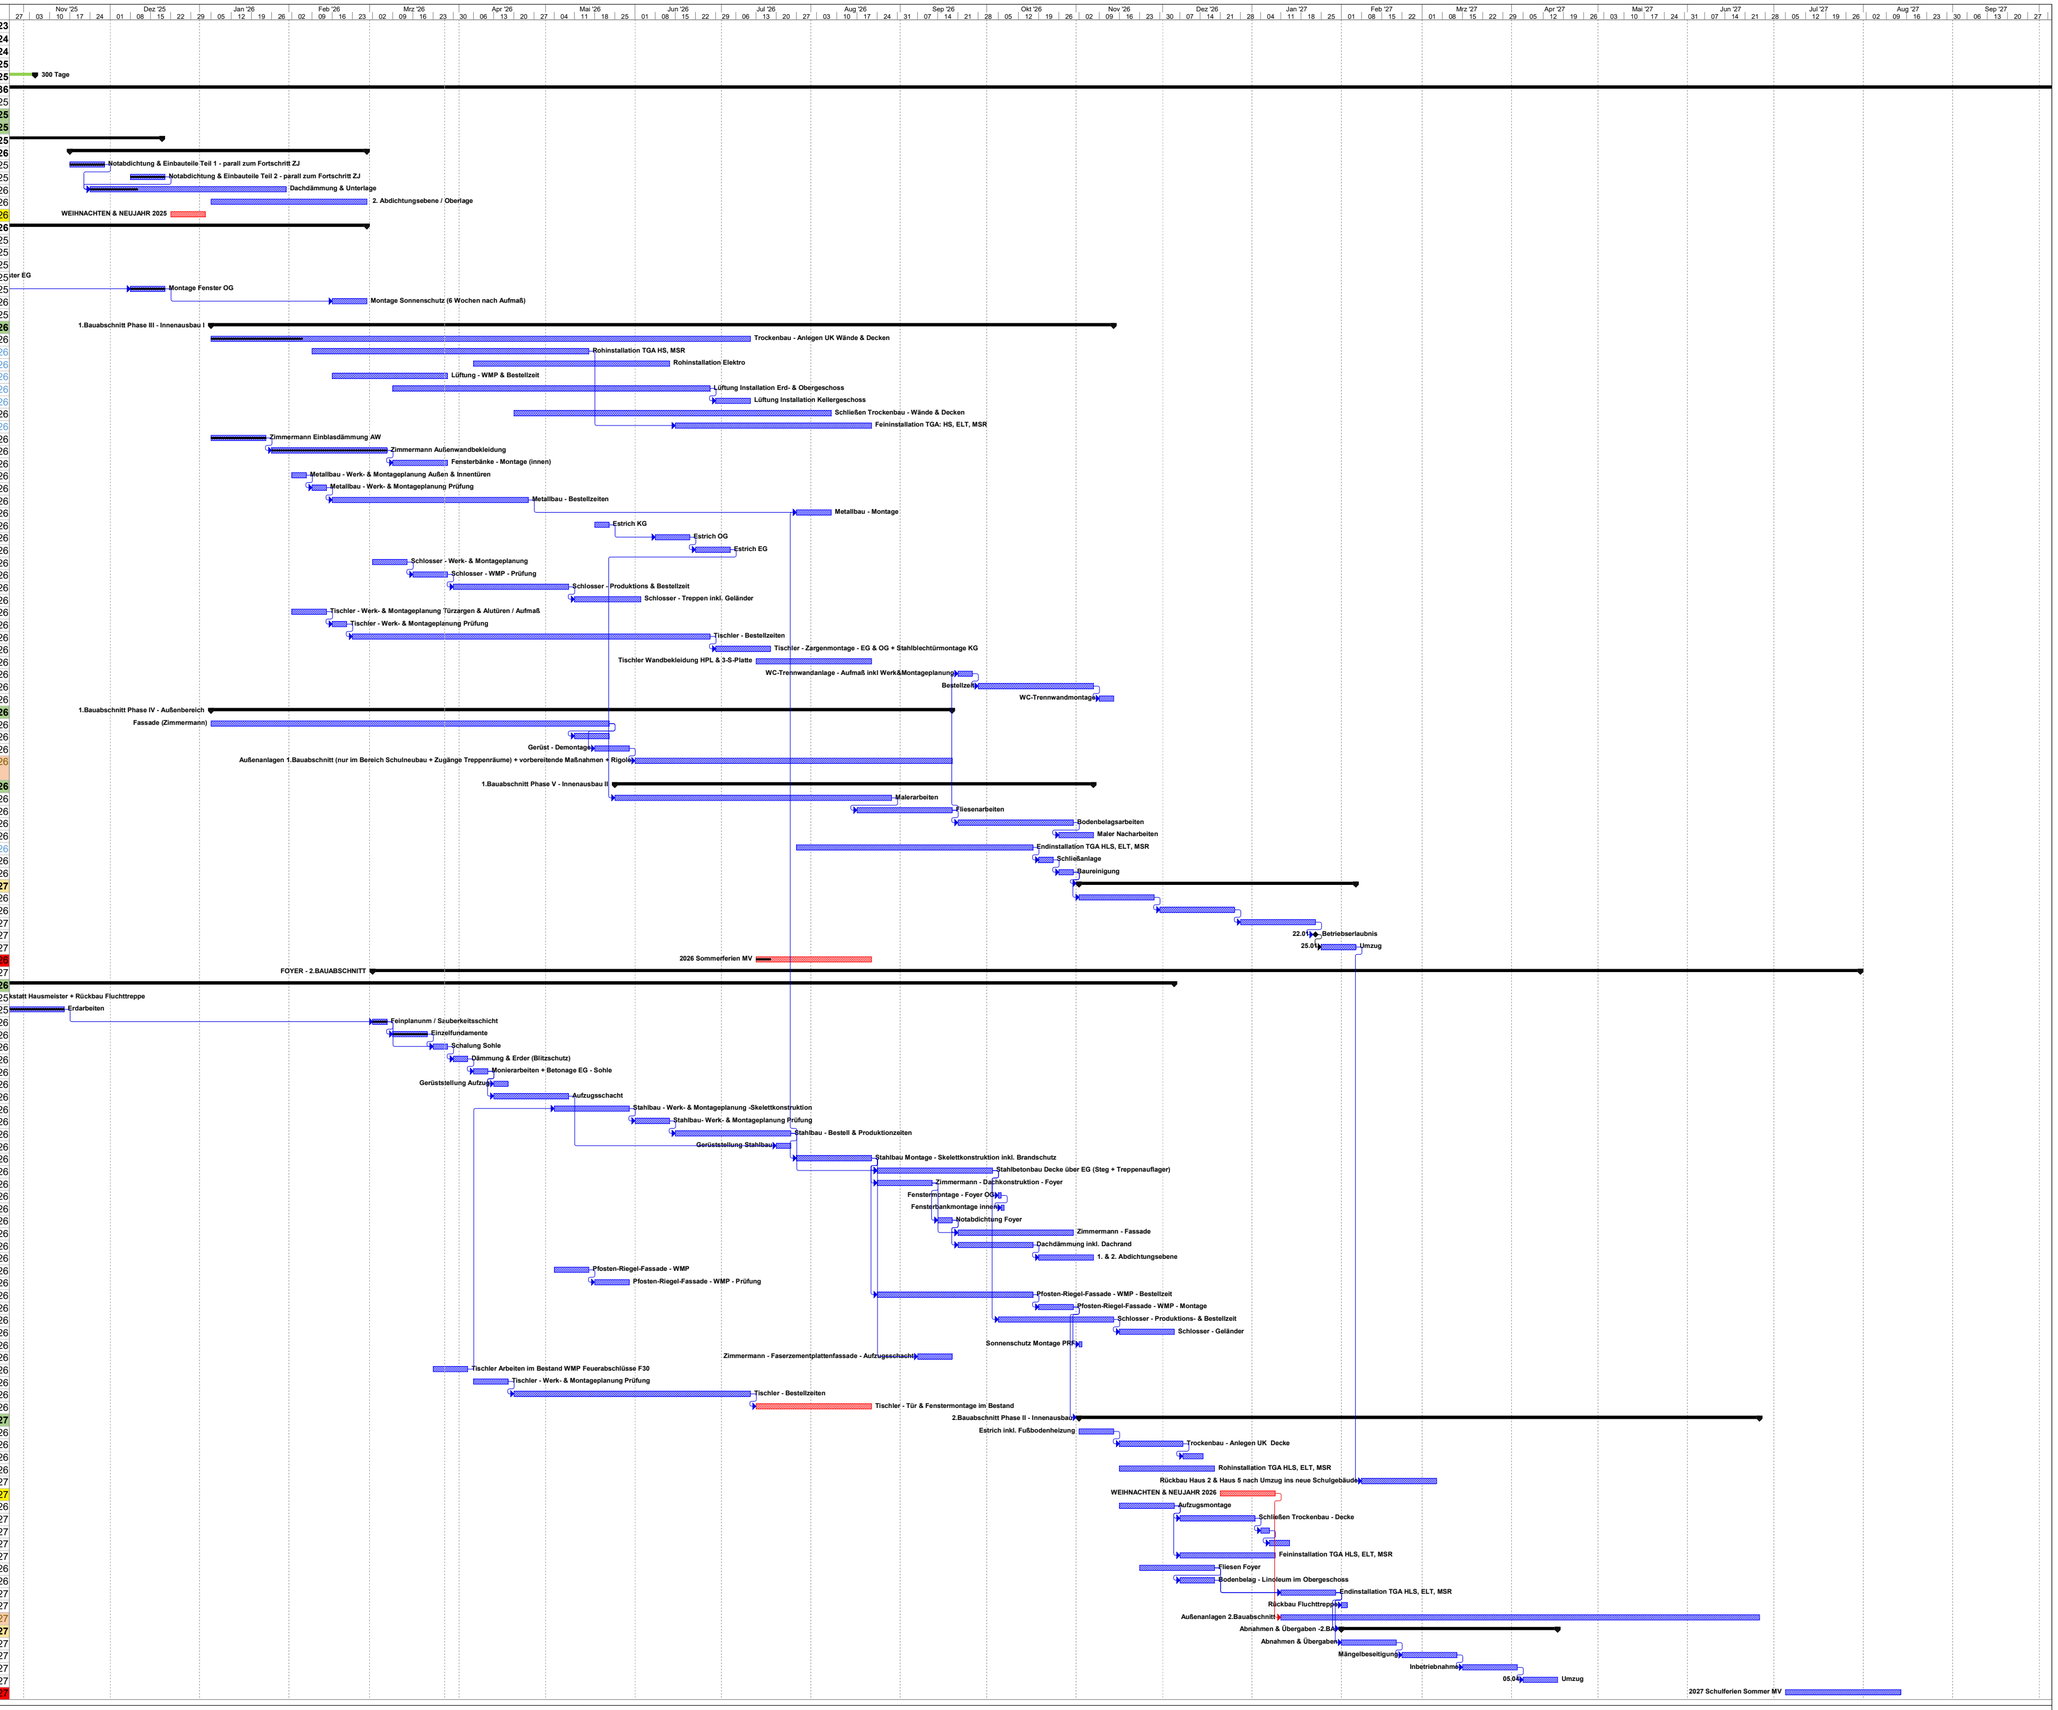

Projekt: Vorlage_Projektplan_ES_EW
Datum: Fre 27.03.26

Vorgang · Unterbrechung · Meilenstein · Sammelvorgang · Projektsammelvorgang · Externe Vorgänge · Externer Meilenstein · Inaktiv Vorgang · Inaktiver Meilenstein · Inaktiver Sammelvorgang · Manueller Vorgang · Nur Dauer · Manueller Sammelvorgang · Manueller Sammelvorgang · Nur Anfang · Nur Ende · In Arbeit · Stichtag
