Nr.	Vorg.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1		**LRA LWL Parkplatz mit Carportanlage Hau s A**	**186 Tage**	**Fre 07.08.26**	**Fre 23.04.27**	
2		**Los 01 Tiefbauarbeiten**	**141 Tage**	**Fre 07.08.26**	**Fre 19.02.27**	
3		**Ausschreibung**	**29 Tage**	**Fre 07.08.26**	**Mit 16.09.26**	
4		Ausschreibungsunterlagen fertig	1 Tag	Fre 07.08.26	Fre 07.08.26	
5		Versand KSM	5 Tage	Mon 10.08.26	Fre 14.08.26	4
6		Angebotsfrist	3 Wochen	Mon 17.08.26	Fre 04.09.26	5
7		Prüfung Angebote	1,6 Wochen	Mon 07.09.26	Mit 16.09.26	6
8		**Auftragsvergabe**	**17 Tage**	**Don 17.09.26**	**Fre 09.10.26**	
9		VV Vorlage	1 Tag	Don 17.09.26	Don 17.09.26	7
10		VV Beschluss	1 Tag	Die 29.09.26	Die 29.09.26	
11		Auftrag	8 Tage	Mit 30.09.26	Fre 09.10.26	10
12		**Ausführungszeitraum**	**85 Tage**	**Mon 26.10.26**	**Fre 19.02.27**	
13		1.BA Carportfläche	8 Wochen	Mon 26.10.26	Fre 18.12.26	11EA+2 Wochen
14		Jahreswechsel	16 Tage	Mon 21.12.26	Son 10.01.27	
15		2.BA Zufahrt + Parkplätze + Zaun	6 Wochen	Mon 11.01.27	Fre 19.02.27	14;54
16		3.BA Zuwegung und Außentreppen	4 Wochen	Mon 23.11.26	Fre 18.12.26	13EE
17		**Los 02 Elektro**	**179 Tage**	**Fre 07.08.26**	**Mit 14.04.27**	
18		**Ausschreibung**	**31 Tage**	**Fre 07.08.26**	**Fre 18.09.26**	
19		Ausschreibungsunterlagen fertig	1 Tag	Fre 07.08.26	Fre 07.08.26	
20		Versand KSM	5 Tage	Mon 10.08.26	Fre 14.08.26	19
21		Angebotsfrist	3 Wochen	Mon 17.08.26	Fre 04.09.26	20
22		Prüfung Angebote	2 Wochen	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26	21
23		**Auftragsvergabe**	**10 Tage**	**Mon 21.09.26**	**Fre 02.10.26**	
24		Auftrag	2 Wochen	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26	22
25		**Ausführungszeitraum**	**123 Tage**	**Mon 26.10.26**	**Mit 14.04.27**	**24EA+2 Wochen**
26		Vorrabeiten u.a. Umsetzung Verteilerkasten etc.	2 Tage	Mon 26.10.26	Die 27.10.26	13AA
27		Fundamenterder	2 Tage	Mit 16.12.26	Don 17.12.26	53EA-3 Tage
28		Installationen Carport	3 Tage	Mon 12.04.27	Mit 14.04.27	42
29		Beleuchtungsanlage Parkplätze	2 Wochen	Mon 08.02.27	Fre 19.02.27	15EE
30		**Los 04 Carportanlage**	**186 Tage**	**Fre 07.08.26**	**Fre 23.04.27**	
31		**Ausschreibung**	**31 Tage**	**Fre 07.08.26**	**Fre 18.09.26**	
32		Ausschreibungsunterlagen fertig	1 Tag	Fre 07.08.26	Fre 07.08.26	
33		Versand KSM	5 Tage	Mon 10.08.26	Fre 14.08.26	32
34		Angebotsfrist	3 Wochen	Mon 17.08.26	Fre 04.09.26	33
35		Prüfung Angebote	2 Wochen	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26	34
36		**Auftragsvergabe**	**10 Tage**	**Mon 21.09.26**	**Fre 02.10.26**	
37		Auftrag	2 Wochen	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26	35
38		**Ausführungszeitraum**	**72 Tage**	**Don 14.01.27**	**Fre 23.04.27**	**37EA+2 Wochen**
39		Werkplanung	2 Wochen	Don 14.01.27	Mit 27.01.27	55
40		Prüfung und Freigabe	5 Tage	Fre 29.01.27	Don 04.02.27	39EA+1 Tag
41		Fertigung	8 Wochen	Mon 08.02.27	Fre 02.04.27	40EA+1 Tag
42		Montage Tragkonstrution+Dach	1 Woche	Mon 05.04.27	Fre 09.04.27	41
43		Montage Wände Tore Wandbkleidung	1 Woche	Mon 19.04.27	Fre 23.04.27	42EA+5 Tage
44		**Los 05 Fundamente Carport**	**109 Tage**	**Fre 14.08.26**	**Mit 13.01.27**	
45		**Ausschreibung**	**21 Tage**	**Fre 14.08.26**	**Fre 11.09.26**	
46		Ausschreibungsunterlagen fertig	1 Tag	Fre 14.08.26	Fre 14.08.26	
47		Versand KSM	5 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26	46
48		Angebotsfrist	2 Wochen	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26	47
49		Prüfung Angebote	1 Woche	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26	48
50		**Auftragsvergabe**	**10 Tage**	**Mon 14.09.26**	**Fre 25.09.26**	
51		Auftrag	2 Wochen	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26	49
52		**Ausführungszeitraum**	**28 Tage**	**Mon 07.12.26**	**Mit 13.01.27**	**51EA+2 Wochen**
53		Fundamente Schalen+Bewehren	2 Wochen	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26	13EA-2 Wochen
54		Jahreswechsel	16 Tage	Mon 21.12.26	Son 10.01.27	
55		Betonage+Ausschalen	3 Tage	Mon 11.01.27	Mit 13.01.27	54
56		**Los 06 Zimmerer**	**181 Tage**	**Fre 14.08.26**	**Fre 23.04.27**	
57		**Ausschreibung**	**21 Tage**	**Fre 14.08.26**	**Fre 11.09.26**	
58		Ausschreibungsunterlagen fertig	1 Tag	Fre 14.08.26	Fre 14.08.26	
59		Versand KSM	5 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26	58
60		Angebotsfrist	2 Wochen	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26	59
61		Prüfung Angebote	1 Woche	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26	60
62		**Auftragsvergabe**	**10 Tage**	**Mon 14.09.26**	**Fre 25.09.26**	
63		Auftrag	2 Wochen	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26	61
64		**Ausführungszeitraum**	**10 Tage**	**Mon 12.04.27**	**Fre 23.04.27**	
65		Wandherstellung	2 Wochen	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27	43EE

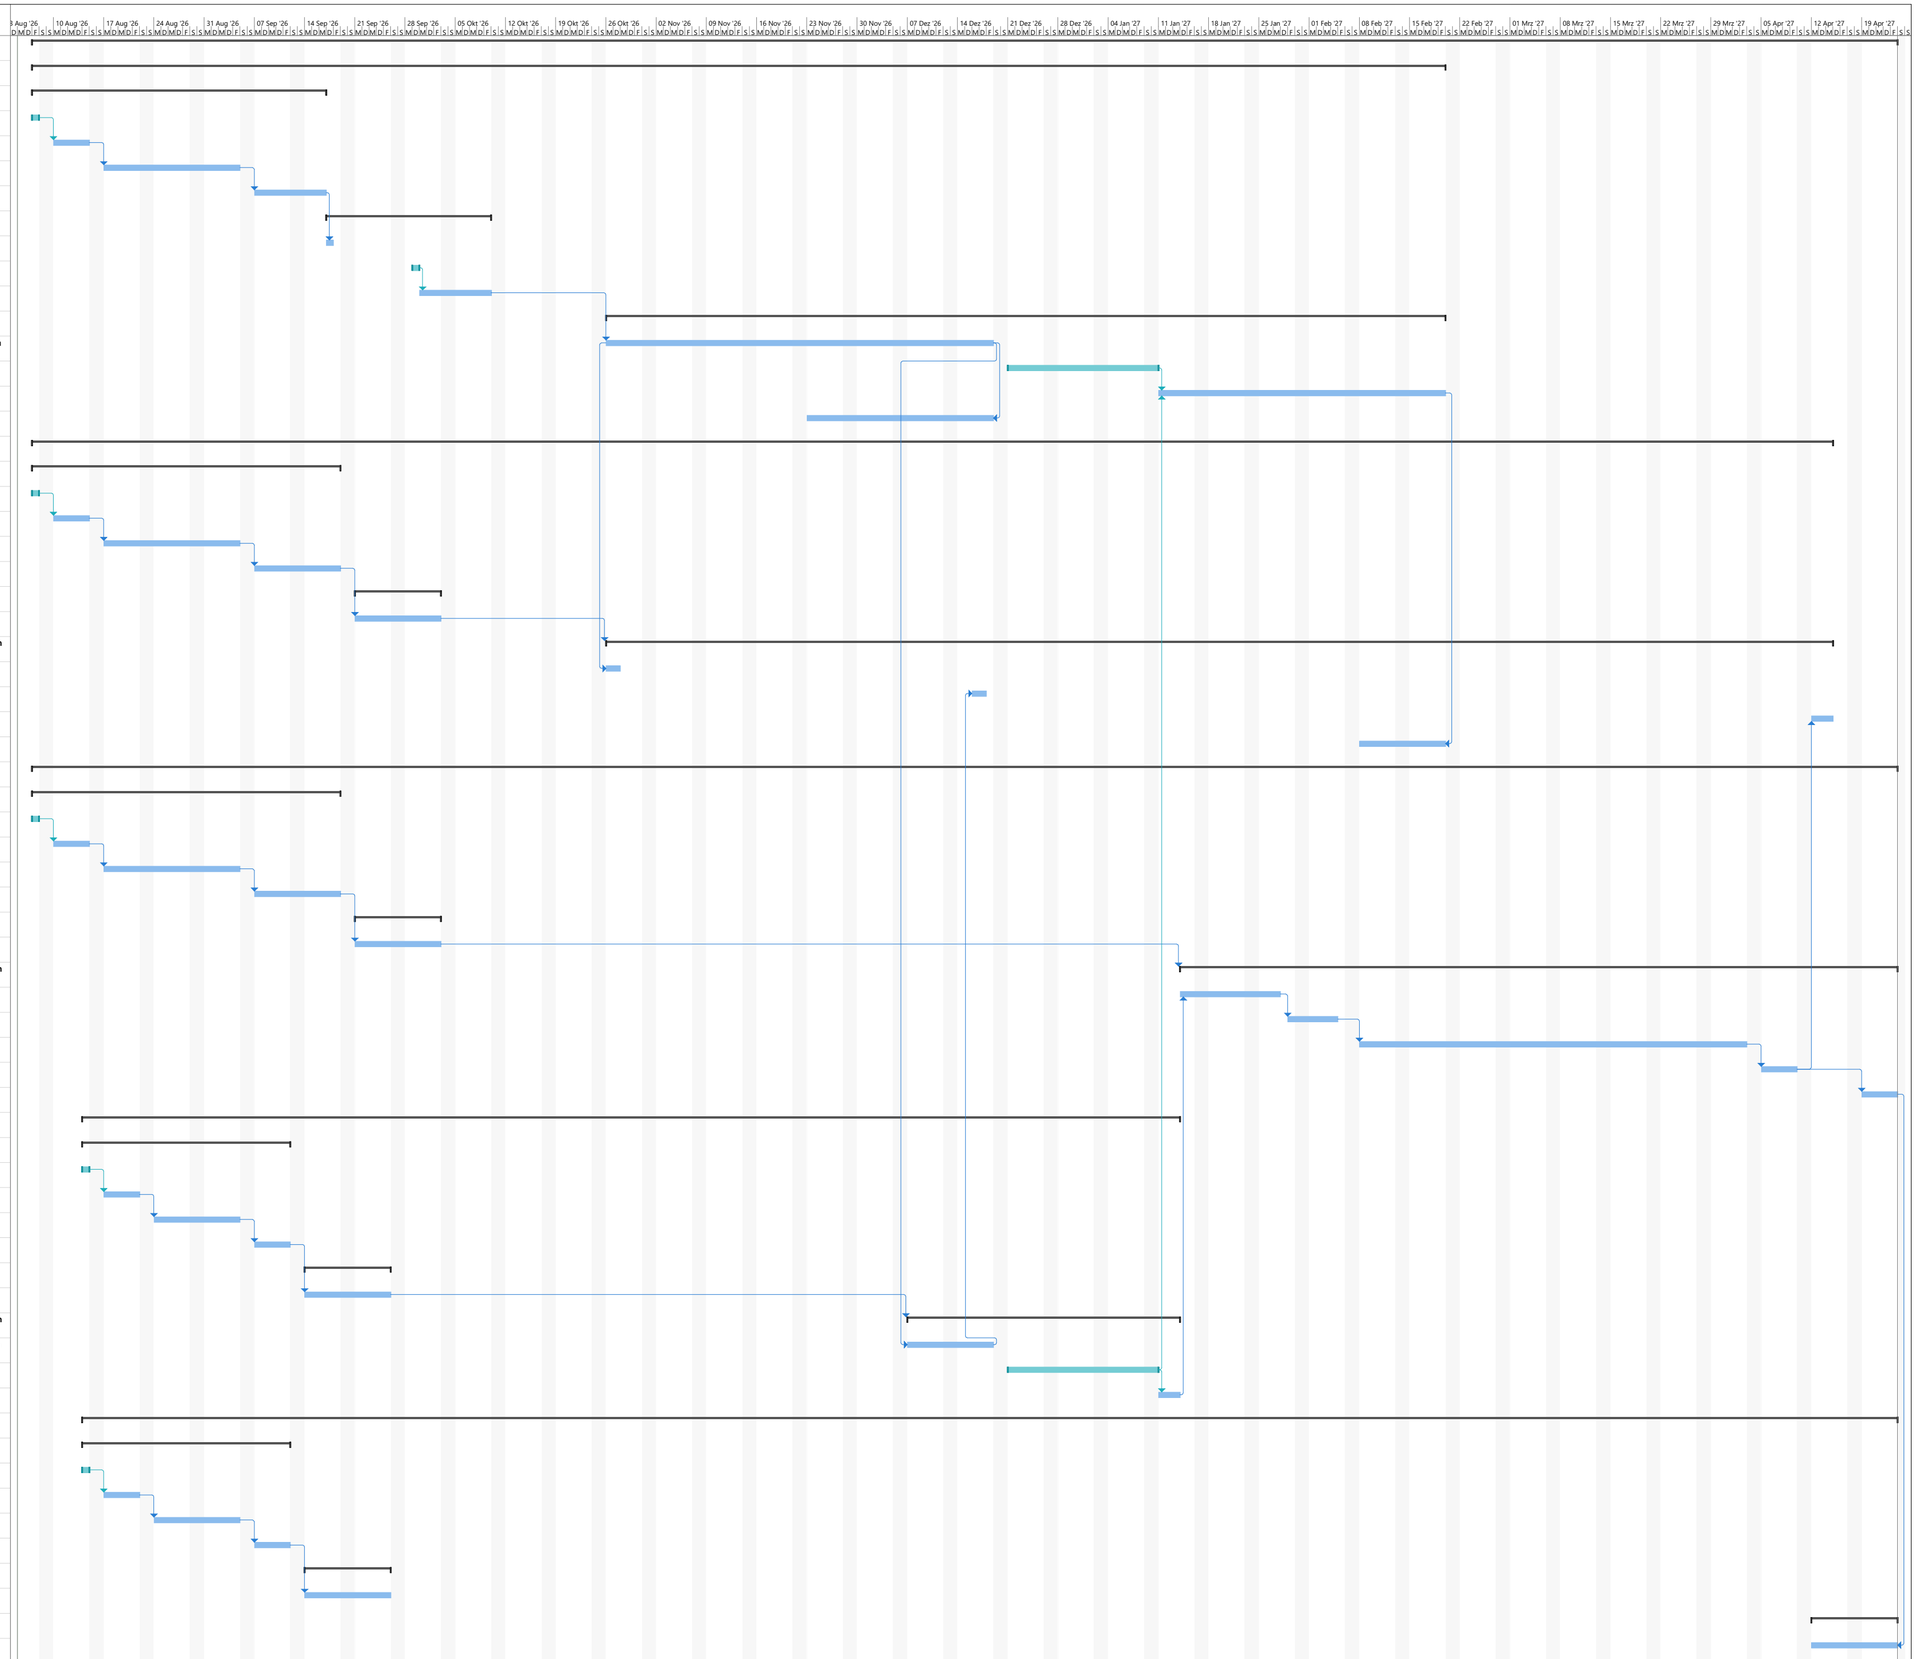

Projekt: 2026-08-05 LRA LWL P
Datum: Mit 05.08.26

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt
