
BS 6/25

49,94 m HN76

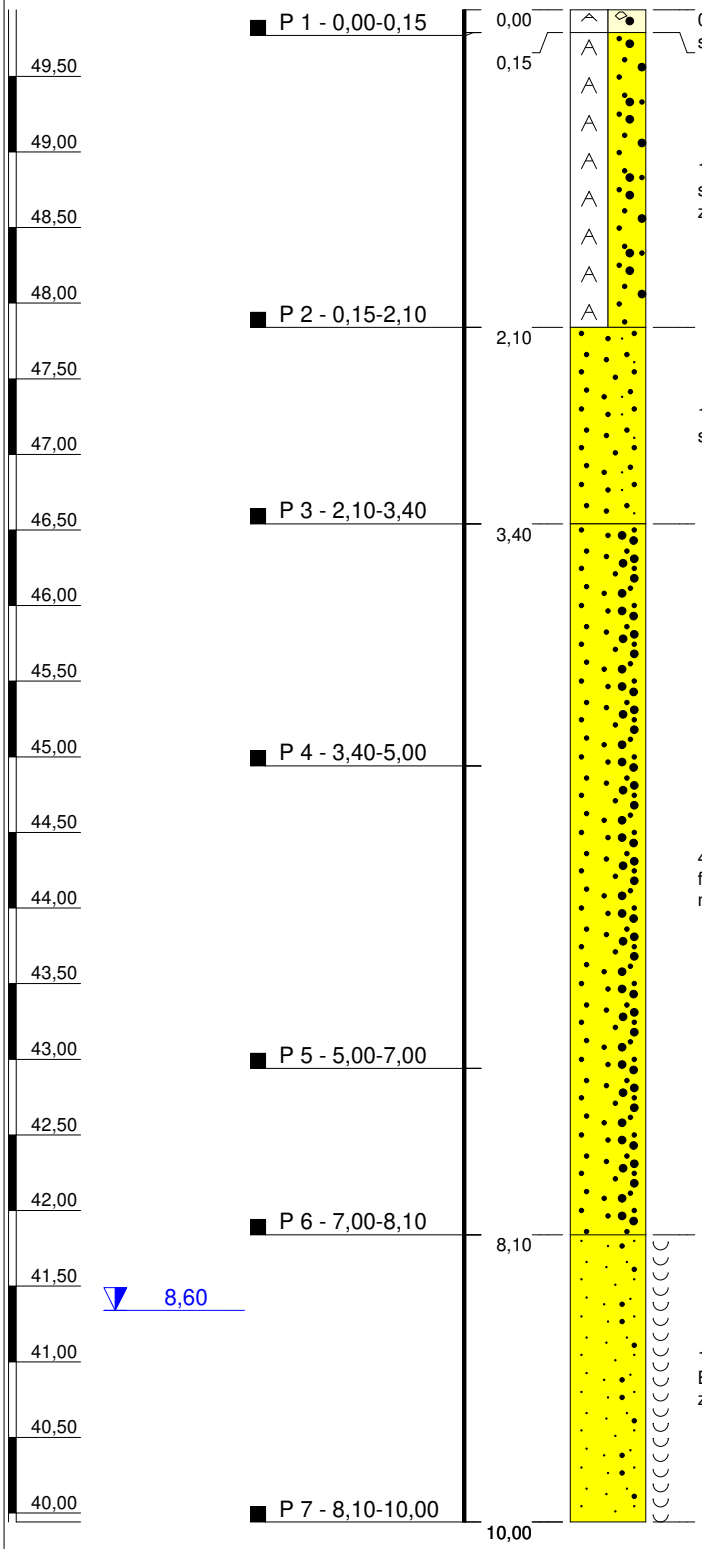

0,15 Auffüllung, Schotter, sandig, braungrau, feucht, mäßig schwer zu bohren, kalkhaltig

1,95 Auffüllung, Mittelsand, grobsandig, schwach feinkiesig, schwach mittelkiesig, schwach feinsandig, braun, feucht, leicht zu bohren - mäßig schwer zu bohren, kalkhaltig

1,30, Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, hellbraun, schwach feucht - feucht, mäßig schwer zu bohren, kalkfrei

4,70, Mittelsand, stark grobsandig, schwach feinkiesig, schwach feinsandig, Feinsandlagen, hellbraungrau, schwach feucht, mäßig schwer zu bohren - schwer zu bohren, kalkhaltig


1,90, Feinsand, mittelsandig, hellbraun, Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrung (8, 6), sehr feucht - naß, mäßig schwer zu bohren - schwer zu bohren, kalkhaltig

Anlage 2

Projekt:	**Gasspeicher - Biogasanlage Schwerin**		*Höhenmaßstab: 1:50*
Bohrung:	**BS 6/25**	**Projekt-Nr.: 58 80 25**	
Auftraggeber:	BioEnergie Schwerin GmbH	Rechtswert: 0	
Bohrfirma:	M. Haack, Weitendorf	Hochwert: 0	
Bearbeiter:	E. Sacharow	Ansatzhöhe: 49,94 m HN76	
Datum:	03.12.2025	Endtiefe: 10,00 m	

BS 7/25

50,13 m HN76

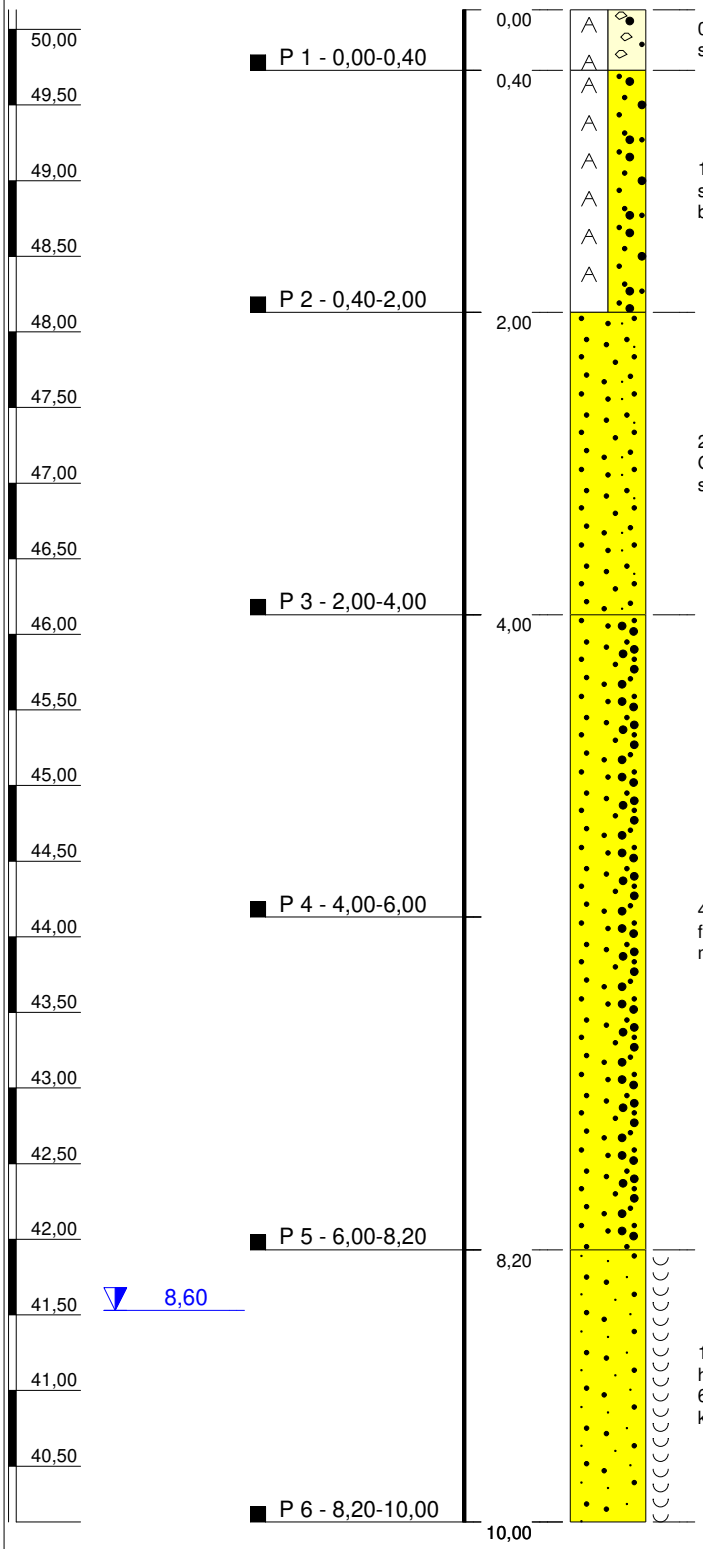

0,40 Auffüllung, Schotter, sandig, braungrau, feucht, mäßig schwer zu bohren - schwer zu bohren, kalkhaltig

1,60 Auffüllung, Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach schluffig, schwach feinkiesig, schwach mittelkiesig, braun, feucht, mäßig schwer zu bohren, kalkhaltig

2,00, Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, kiesige Grobsandlagen, hellbraun, schwach feucht - feucht, mäßig schwer zu bohren, kalkhaltig

4,20, Mittelsand, stark grobsandig, schwach feinkiesig, schwach feinsandig, Feinsandlagen, hellbraun, schwach feucht - feucht, mäßig schwer zu bohren - schwer zu bohren, kalkhaltig


1,80, Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach grobsandig, hellbraun, Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrung (8, 6), feucht - naß, mäßig schwer zu bohren - schwer zu bohren, kalkhaltig

Anlage 2

Projekt:	**Gasspeicher - Biogasanlage Schwerin**		*Höhenmaßstab: 1:50*
Bohrung:	**BS 7/25**	**Projekt-Nr.: 58 80 25**	
Auftraggeber:	BioEnergie Schwerin GmbH	Rechtswert: 0	
Bohrfirma:	M. Haack, Weitendorf	Hochwert: 0	
Bearbeiter:	E. Sacharow	Ansatzhöhe: 50,13 m HN76	
Datum:	03.12.2025	Endtiefe: 10,00 m	

BS 8/25

50,18 m HN76

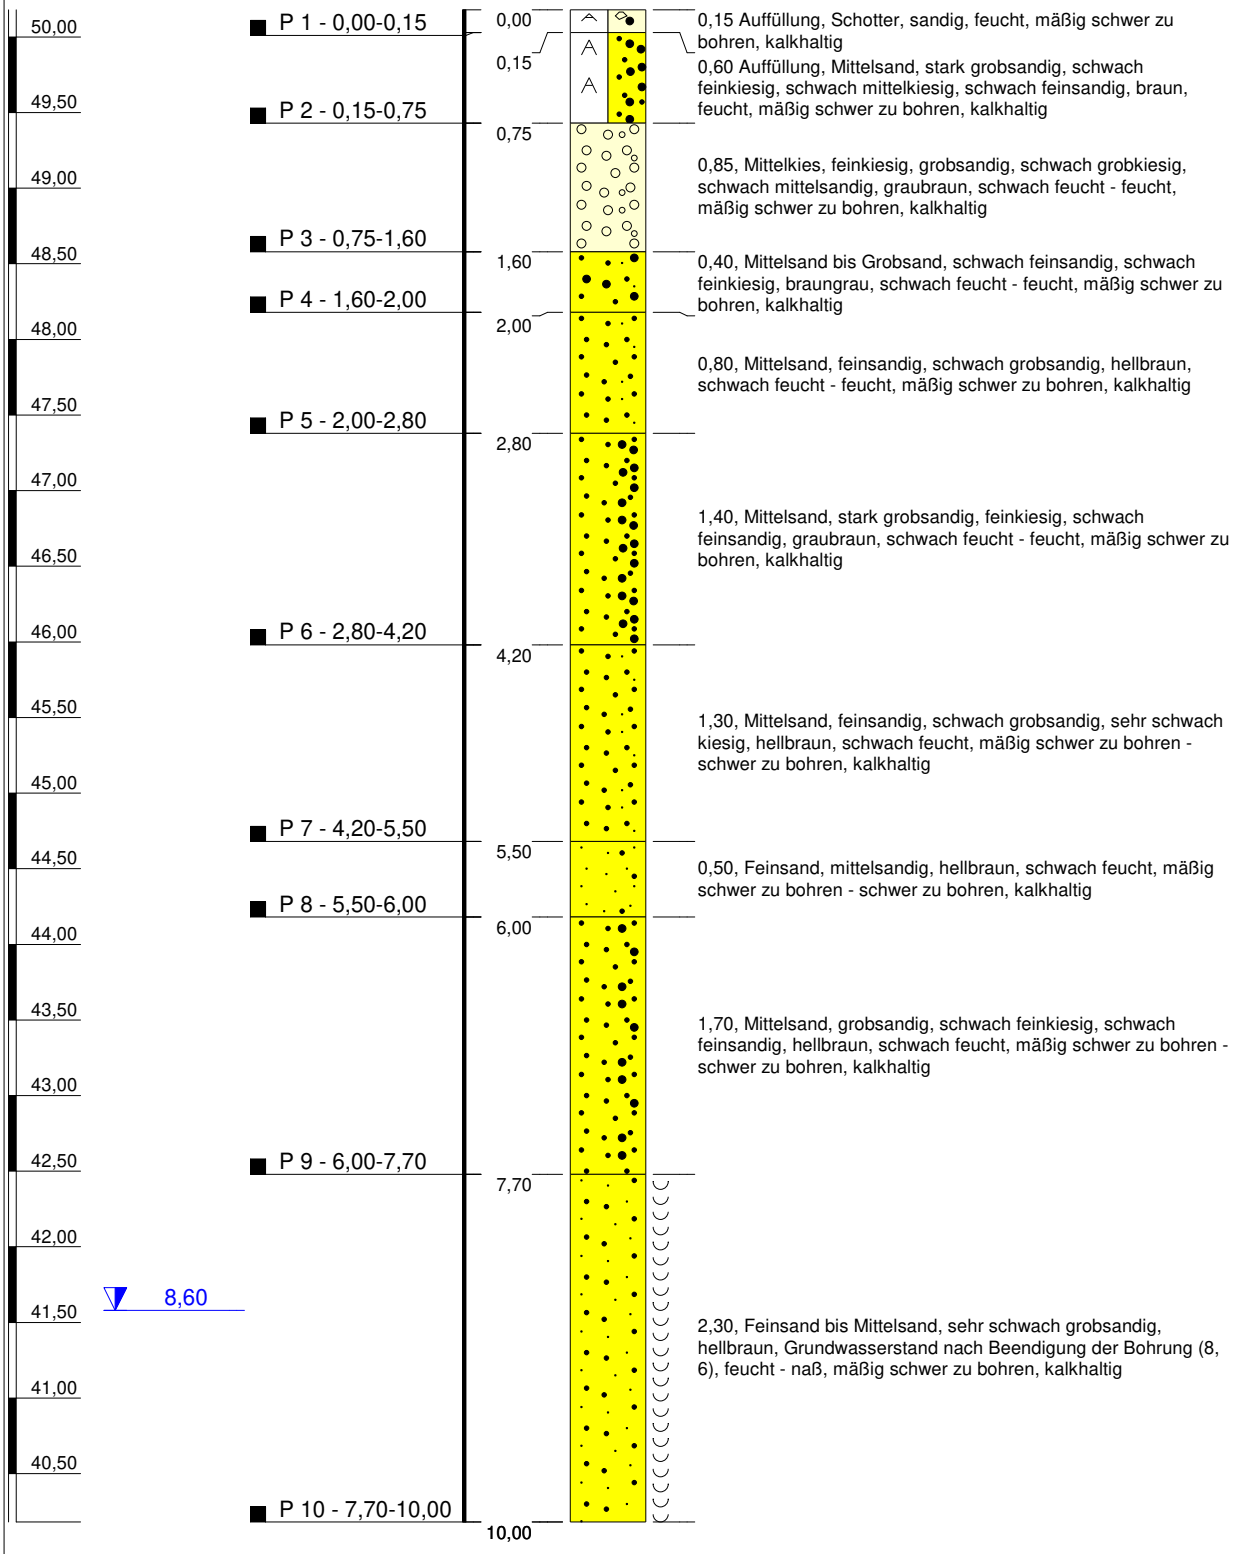

Anlage 2

Projekt:	**Gasspeicher - Biogasanlage Schwerin**		*Höhenmaßstab: 1:50*
Bohrung:	**BS 8/25**	**Projekt-Nr.: 58 80 25**	
Auftraggeber:	BioEnergie Schwerin GmbH	Rechtswert: 0	
Bohrfirma:	M. Haack, Weitendorf	Hochwert: 0	
Bearbeiter:	E. Sacharow	Ansatzhöhe: 50,18 m HN76	
Datum:	03.12.2025	Endtiefe: 10,00 m	
