
P_1000-2026

Vivantes - Forum für Senioren
Haus Britz
Austausch der Fenster - Rahmenterminplan

Nr.	Vorgangsn	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1		Veröffentlichung LVs	0 Tage	Don 19.11.26	Don 19.11.26		AGF / Vivantes
2		Angebotserstellung	3 Wochen	Don 19.11.26	Mit 09.12.26	1	Firmen
3		Submission (mit Bindefrist: 27.01.2027)	0 Tage	Mit 09.12.26	Mit 09.12.26	2	
4		Auswertung der Angebote	1 Woche	Don 10.12.26	Mit 16.12.26	3	AGF
5		Beauftragung	1 Woche	Don 17.12.26	Mit 06.01.27	4	Vivantes
6		Personal & Materialdisposition	3 Wochen	Don 07.01.27	Mit 27.01.27	5	Firmen
7		Erstellung & Prüfung der Werk- und Montageplanung	3 Wochen	Don 28.01.27	Mit 17.02.27	6	Firmen / AGF
8		Bestellung der Fenster	0 Tage	Mit 17.02.27	Mit 17.02.27	7	Firmen
9		Lieferzeitraum Fenster	12 Wochen	Don 18.02.27	Mit 19.05.27	8	Firmen
10		Bauabschnitt 1 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 20.05.27	Mit 09.06.27	9	Firmen
11		Bauabschnitt 2 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 10.06.27	Mit 30.06.27	10	Firmen
12		Bauabschnitt 3 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 01.07.27	Mit 21.07.27	11	Firmen
13		Bauabschnitt 4 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 22.07.27	Mit 11.08.27	12	Firmen
14		Bauabschnitt 5 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 12.08.27	Mit 01.09.27	13	Firmen
15		Bauabschnitt 6 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 02.09.27	Mit 22.09.27	14	Firmen
16		Bauabschnitt 7 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 23.09.27	Mit 13.10.27	15	Firmen
17		Bauabschnitt 8 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 14.10.27	Mit 03.11.27	16	Firmen
18		Bauabschnitt 9 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 04.11.27	Mit 24.11.27	17	Firmen
19		Bauabschnitt 10 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 25.11.27	Mit 15.12.27	18	Firmen
20		Bauabschnitt 11inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 16.12.27	Mit 05.01.28	19	Firmen
21		Bauabschnitt 12 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 06.01.28	Mit 26.01.28	20	Firmen
22		Bauabschnitt 13 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 27.01.28	Mit 16.02.28	21	Firmen
23		Bauabschnitt 14 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 17.02.28	Mit 08.03.28	22	Firmen
24		Bauabschnitt 15 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 09.03.28	Mit 29.03.28	23	Firmen
25		Bauabschnitt 16 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 30.03.28	Mit 19.04.28	24	Firmen
26		Bauabschnitt 17 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 20.04.28	Mit 10.05.28	25	Firmen
27		Bauabschnitt 18 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	3 Wochen	Don 11.05.28	Mit 31.05.28	26	Firmen
28		Bauabschnitt 19 inkl. VOB-Abnahme&Inbetriebnahme	2 Wochen	Don 01.06.28	Mit 14.06.28	27	Firmen

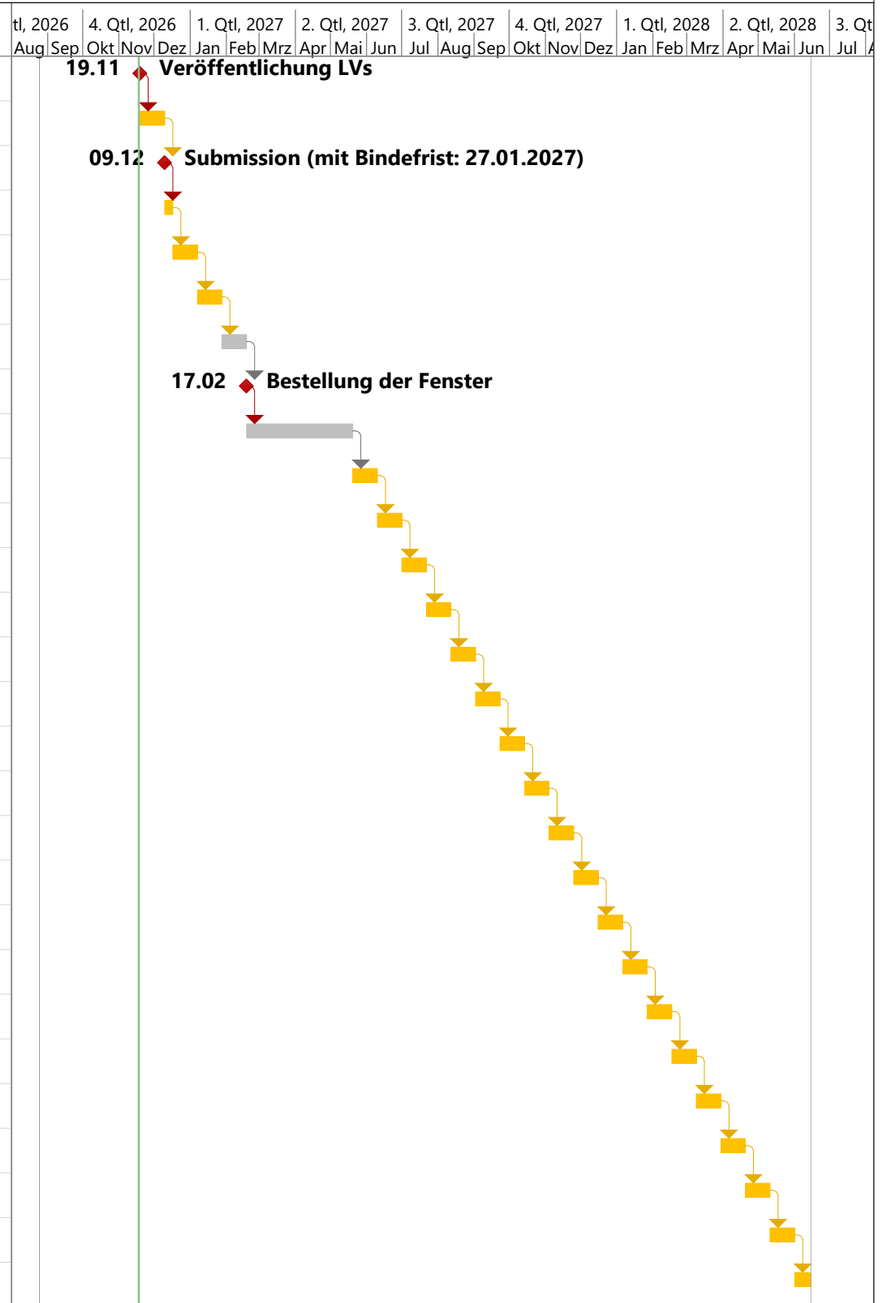

Projekt: 26-11-18_Haus Britz_F
Datum: Mit 18.11.26

Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag
Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit
Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt
Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein	
