Erweiterungsneubau Burgschule Linden

Holzbau

28.07.2026

LKG
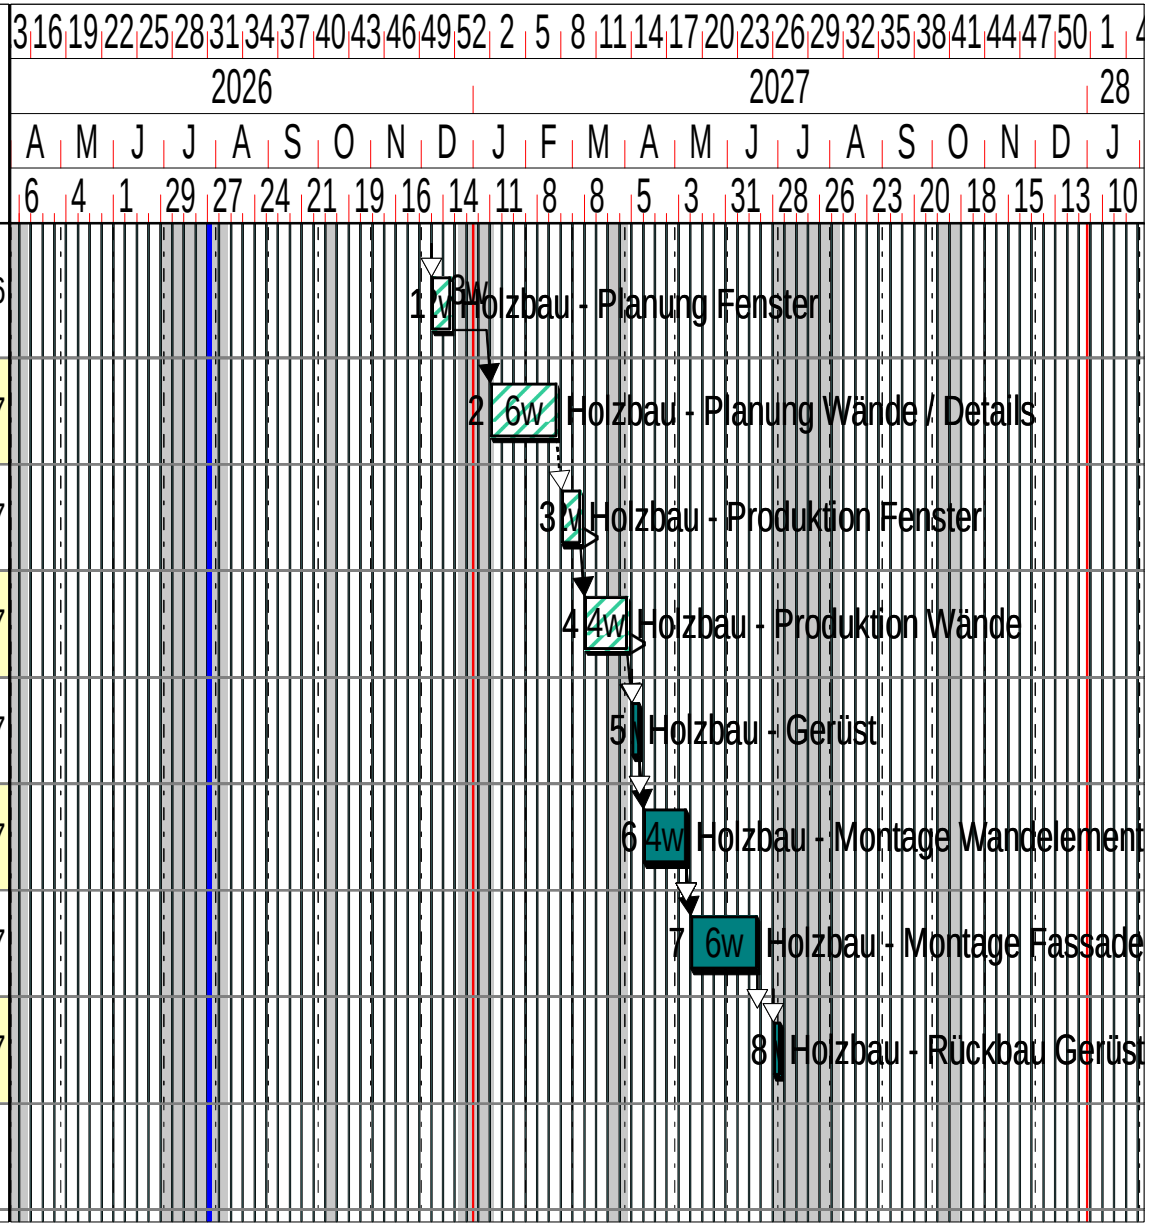
Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende
1	Holzbau - Planung Fenster	07.12.2026	2w	18.12.2026
2	Holzbau - Planung Wände / Details	11.01.2027	6w	19.02.2027
3	Holzbau - Produktion Fenster	22.02.2027	2w	05.03.2027
4	Holzbau - Produktion Wände	08.03.2027	4w	02.04.2027
5	Holzbau - Gerüst	05.04.2027	1w	09.04.2027
6	Holzbau - Montage Wandelemente	12.04.2027	4w	07.05.2027
7	Holzbau - Montage Fassadenbekleidung (opt.)	10.05.2027	6w	18.06.2027
8	Holzbau - Rückbau Gerüste	28.06.2027	1w	02.07.2027
