
Bauzeitenplan

Projektnummer:

BW_ZSA Carport: Entwurf Rahmenterminplan 12.10.2026

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
4	Ausschreibung (Zimmerer, Spengler, Abdichtung)	25at	Mo, 12.10.26	Fr, 13.11.26
5	Versand LVs	1at	Fr, 13.11.26	Fr, 13.11.26
6	Kalkulation öffentliche Vergabe	20at	Mo, 16.11.26	Fr, 11.12.26
7	Auswertung + Vergabe	22at	Mo, 14.12.26	Fr, 15.01.27
8	Baustellenvorbereitung	72at	Mo, 18.01.27	Do, 29.04.27
9	**Bauausführung**			
10	Container beräumen (AG)	29at	Mo, 04.01.27	Fr, 12.02.27
11	Rückbau Container (AG)	10at	Mo, 15.02.27	Fr, 26.02.27
12	Abbruch Bodenplatte Container incl. Leitungen	5at	Mo, 01.03.27	Fr, 05.03.27
13	Leitungsgräben erstellen, Freilegung Bestandsdach	10at	Mo, 22.02.27	Fr, 05.03.27
14	Verbindung Halle/Neubau ELT+HLS	10at	Mo, 08.03.27	Fr, 19.03.27
15	Sanierung Abdichtung Bestand	18at	Mo, 08.03.27	Fr, 02.04.27
16	Carport Unterbau/Planie incl. Leerrohre Ladesäulen (Gewerk Außenanlagen)	9at	Mo, 15.03.27	Do, 25.03.27
17	Fundamentierung, Verfüllung (Gewerk Außenanlagen)	16at	Di, 30.03.27	Di, 20.04.27
18	Asphalt Fahrgasse	5at	Mo, 19.04.27	Fr, 23.04.27
19	Pflasterarbeiten Bereich Carport	8at	Mo, 26.04.27	Mi, 05.05.27
20	Pflasterarbeiten West	18at	Mo, 10.05.27	Fr, 04.06.27
21	Zimmerer Rohbau	9at	Mo, 10.05.27	Fr, 21.05.27
22	Zimmerer Fassade	14at	Mo, 24.05.27	Fr, 11.06.27
23	Dachabdichtung	10at	Mo, 07.06.27	Fr, 18.06.27
24	Gründach	5at	Mo, 21.06.27	Fr, 25.06.27
25	Spengler	5at	Mo, 21.06.27	Fr, 25.06.27
26	ELT Fertiginstallation	5at	Mo, 21.06.27	Fr, 25.06.27
27	Restarbeiten Hochbau	10at	Mo, 28.06.27	Fr, 09.07.27
28	Restarbeiten Außenanlagen	10at	Mo, 05.07.27	Fr, 16.07.27
29	Offiziellle Einweihung Neubau	1kt	Sa, 17.07.27	Sa, 17.07.27

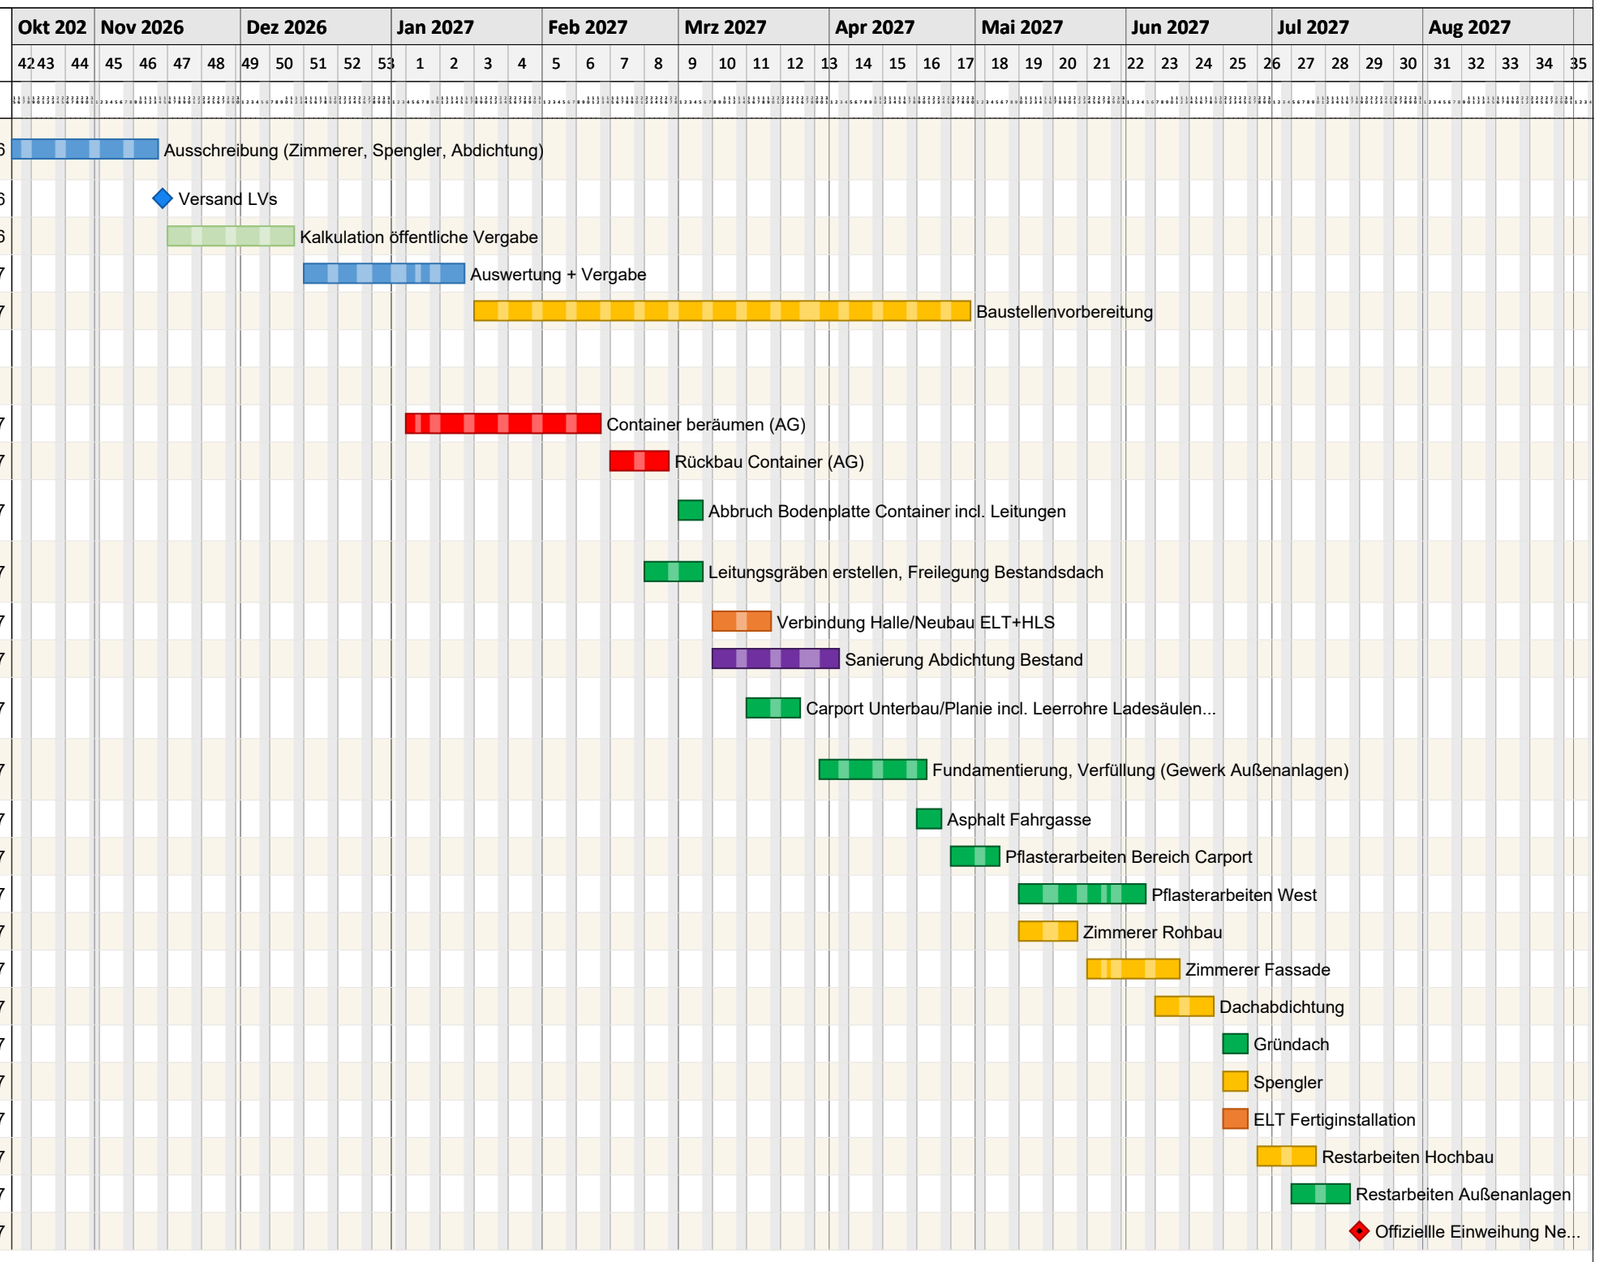

Projektzeitrahmen von So, 01.03.26 bis Sa, 04.09.27
Kalender: Bayern (eingebettet)
Druckdatum: 12.10.2026 09:09
Filter:
Bearbeiter:

erstellt mit pro-Plan 2025 (pro-Plan 2025) Serien Nr.: PPI25-04C1924BFB24 Lizenz fü.Ar Alischer | Buchner | Hohetsel Ingenieurbüro für Ba
