Grobterminplan

Modernisierung Oberschule Uchte

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**Modernisierung Oberschule Uchte**	**1564at**	**Mo, 03.03.25**	**Mi, 14.05.31**
1.1	**VgV-Verfahren**	**463at**	**Mo, 03.03.25**	**Do, 31.12.26**
1.1.1	**Juristische Beratung der Vergabeverfahren:**	376at	Mo, 03.03.25	Mo, 31.08.26
1.1.2	Projektsteuerung	122at	Fr, 26.09.25	Mo, 23.03.26
1.1.3	Objektplanung	115at	Mi, 10.12.25	Fr, 29.05.26
1.1.4	Fachplanung Technische Ausrüstung TA	75at	Fr, 02.01.26	Mo, 20.04.26
1.1.5	Fachplanung Tragwerk	78at	Mo, 20.04.26	Mo, 10.08.26
1.1.6	Brandschutz	58at	Mo, 27.04.26	Mo, 20.07.26
1.1.7	SiGeKo	98at	Mo, 11.05.26	Fr, 25.09.26
1.1.8	Objektplanung Freianlagen (Prognose)	144at	Mo, 11.05.26	Mo, 30.11.26
1.1.9	weitere Fachplaner	116at	Mi, 22.07.26	Do, 31.12.26
1.2	**Planungsphase**	**522at**	**Mi, 18.03.26**	**Fr, 31.03.28**
1.2.1	"Phase null" - pädagogische / räumliche Bestandsaufnahme	148at	Mi, 18.03.26	Fr, 16.10.26
1.2.2	Grundlagenermittlung	138at	Mo, 20.07.26	Fr, 29.01.27
1.2.3	Vorentwurfsplanung	96at	Mo, 01.02.27	Fr, 18.06.27
1.2.4	Entwurfsplanung	94at	Mo, 21.06.27	Do, 28.10.27
1.2.5	Genehmigungsplanung	45at	Fr, 29.10.27	Do, 30.12.27
1.2.6	Einreichung Bauantrag (Prognose)	1at	Fr, 31.12.27	Fr, 31.12.27
1.2.7	Bauantrag (Prognose)	1at	Fr, 31.03.28	Fr, 31.03.28
1.3	**Ausführungsplanung**	**144at**	**Mo, 03.01.28**	**Do, 27.07.28**
1.4	**Ausschreibung und Vergabe (LPh6 + 7)**	**169at**	**Di, 02.05.28**	**Di, 02.01.29**
1.5	**Bauzeit**	**627at**	**Mo, 13.11.28**	**Mi, 14.05.31**

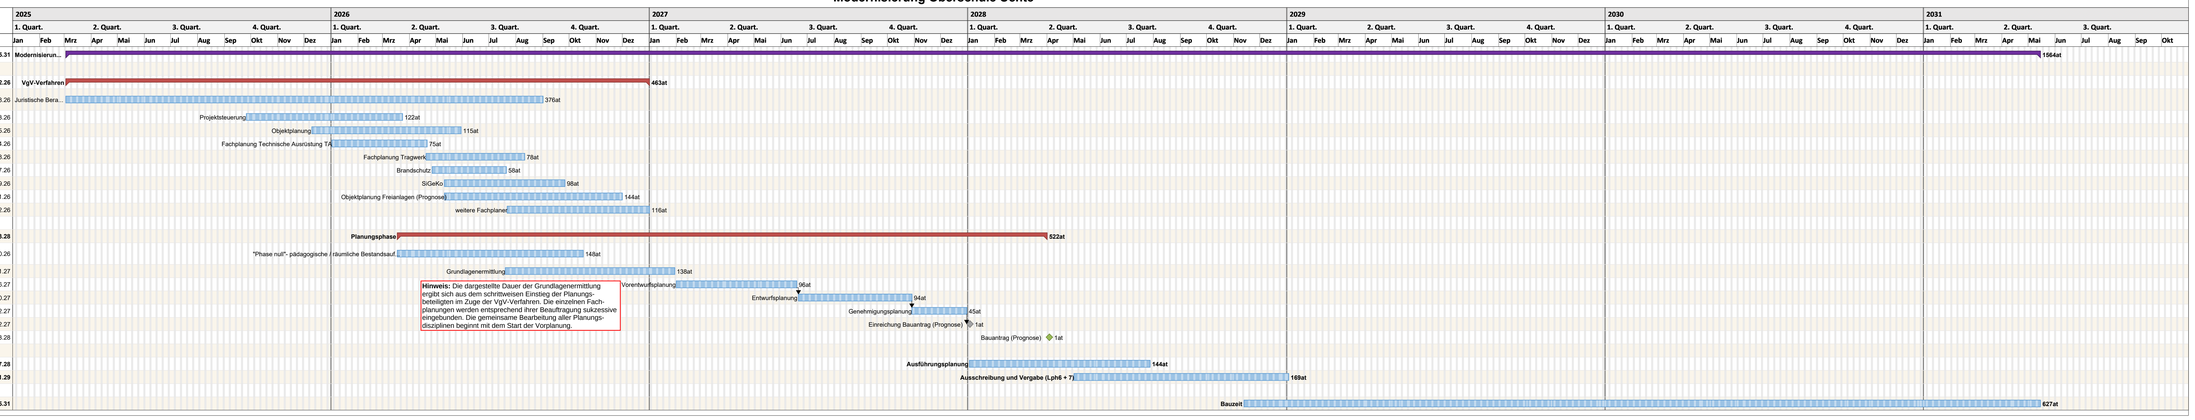

Hinweis: Die dargestellte Dauer der Grundlagenermittlung ergibt sich aus dem schrittweisen Einstieg der Planungsbeteiligten im Zuge der VgV-Verfahren. Die einzelnen Fachplanungen werden entsprechend ihrer Beauftragung sukzessive eingebunden. Die gemeinsame Bearbeitung aller Planungsdisziplinen beginnt mit dem Start der Vorplanung.
