
Zentralklinikum Georgsheil

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		**Los 1**				
2		SOM 1	418 days	Mon 12.04.27	Wed 15.11.28	
3		**B1.1 Bau**	**418 days**	**Mon 12.04.27**	**Wed 15.11.28**	
4		Schacht- & TWR-Montage	20 days	Mon 12.04.27	Fri 07.05.27	
5		TGA-Schnittstelle	2 days	Mon 10.05.27	Tue 11.05.27	4
6		IBN	2 days	Wed 12.05.27	Thu 13.05.27	5
7		ZÜS	1 day	Fri 14.05.27	Fri 14.05.27	6
8		Nutzung Bauaufzug	370 days	Mon 17.05.27	Fri 13.10.28	7
9		Rückbau	15 days	Mon 16.10.28	Fri 03.11.28	8
10		Portalmontage	5 days	Mon 06.11.28	Fri 10.11.28	9
11		IBN	2 days	Mon 13.11.28	Tue 14.11.28	10
12		ZÜS	1 day	Wed 15.11.28	Wed 15.11.28	11
13		**B1.2**	**352 days**	**Mon 17.05.27**	**Tue 19.09.28**	
14		Schacht- & TWR-Montage	20 days	Mon 17.05.27	Fri 11.06.27	7;6
15		TGA-Schnittstelle	2 days	Mon 14.06.27	Tue 15.06.27	14
16		Portalmontage	5 days	Mon 14.08.28	Fri 18.08.28	
17		IBN	2 days	Mon 11.09.28	Tue 12.09.28	50
18		ZÜS	1 day	Tue 19.09.28	Tue 19.09.28	51
19		SOM 2	368 days	Mon 06.09.27	Wed 31.01.29	
20		**B2.2 Bau**	**368 days**	**Mon 06.09.27**	**Wed 31.01.29**	
21		Schacht- & TWR-Montage	20 days	Mon 06.09.27	Fri 01.10.27	
22		TGA-Schnittstelle	2 days	Mon 04.10.27	Tue 05.10.27	21
23		IBN	2 days	Wed 06.10.27	Thu 07.10.27	22
24		ZÜS	1 day	Fri 08.10.27	Fri 08.10.27	23
25		Nutzung Bauaufzug	320 days	Mon 11.10.27	Fri 29.12.28	24
26		Rückbau	14 days	Tue 02.01.29	Fri 19.01.29	25
27		Portalmontage	5 days	Mon 22.01.29	Fri 26.01.29	26
28		IBN	2 days	Mon 29.01.29	Tue 30.01.29	27
29		ZÜS	1 day	Wed 31.01.29	Wed 31.01.29	28
30		**B2.1**	**248 days**	**Mon 11.10.27**	**Wed 20.09.28**	
31		Schacht- & TWR-Montage	15 days	Mon 11.10.27	Fri 29.10.27	24
32		TGA-Schnittstelle	2 days	Mon 01.11.27	Tue 02.11.27	31
33		Portalmontage	5 days	Mon 21.08.28	Fri 25.08.28	16
34		IBN	2 days	Wed 13.09.28	Thu 14.09.28	17
35		ZÜS	1 day	Wed 20.09.28	Wed 20.09.28	18
36		**SOM 3**	**390 days**	**Mon 28.06.27**	**Fri 22.12.28**	
37		**B3.1 Bau**	**390 days**	**Mon 28.06.27**	**Fri 22.12.28**	
38		Schacht- & TWR-Montage	15 days	Mon 28.06.27	Fri 16.07.27	
39		TGA-Schnittstelle	2 days	Mon 19.07.27	Tue 20.07.27	38
40		IBN	2 days	Wed 21.07.27	Thu 22.07.27	39
41		ZÜS	1 day	Fri 23.07.27	Fri 23.07.27	40
42		Nutzung Bauaufzug	345 days	Mon 26.07.27	Fri 17.11.28	41
43		Rückbau	15 days	Mon 20.11.28	Fri 08.12.28	42
44		Portalmontage	5 days	Mon 11.12.28	Fri 15.12.28	43
45		IBN	3 days	Mon 18.12.28	Wed 20.12.28	44
46		ZÜS	2 days	Thu 21.12.28	Fri 22.12.28	45
47		**B3.2**	**304 days**	**Mon 26.07.27**	**Thu 21.09.28**	
48		Schacht- & TWR-Montage	20 days	Mon 26.07.27	Fri 20.08.27	41
49		TGA-Schnittstelle	2 days	Mon 23.08.27	Tue 24.08.27	48
50		Portalmontage	5 days	Mon 04.09.28	Fri 08.09.28	33
51		IBN	2 days	Fri 15.09.28	Mon 18.09.28	34
52		ZÜS	1 day	Thu 21.09.28	Thu 21.09.28	35
53		**SOM 1+2+3**	**10 days**	**Thu 08.02.29**	**Wed 21.02.29**	
54		Blackout-Test	2 days	Thu 08.02.29	Fri 09.02.29	29;28
55		Brandfallmatrix-Test	5 days	Mon 12.02.29	Fri 16.02.29	54
56		VOB-Abnahme	3 days	Mon 19.02.29	Wed 21.02.29	55

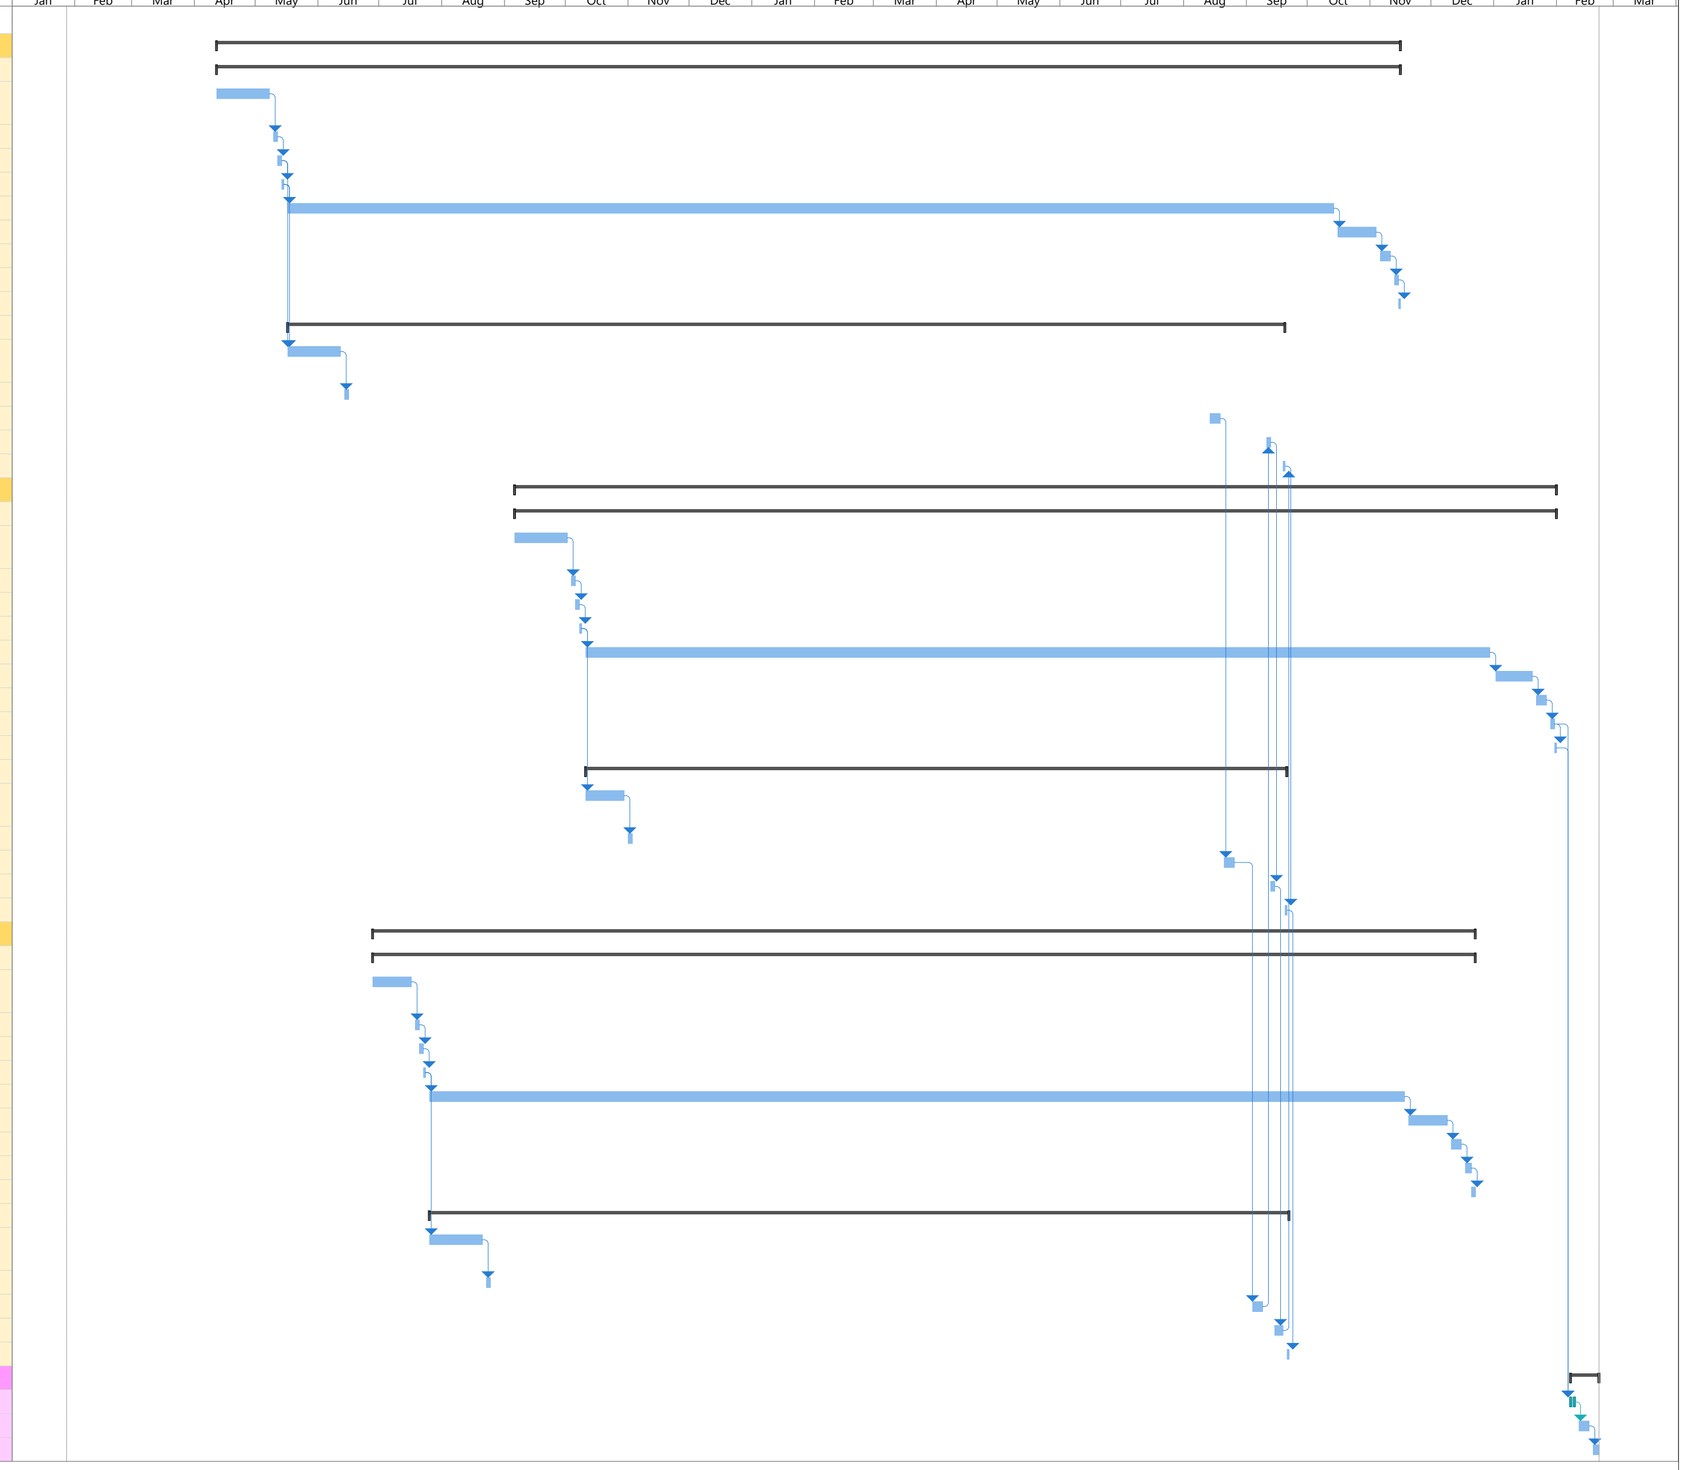

Project: VE461 Aufzugsanlagen
Date: Fri 02.10.26

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress

Nur zur Kalkulation, spätere Abweichungen möglich
