AZV
ABWASSERZWECKVERBAND UNTERE AHR

Rahmenterminplan

Neubau Kläranlage Untere Ahr

Stand: 25.04.2025, Entwurf

DREES & SOMMER

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Rahmenterminplan "Neubau Kläranlage Untere Ahr"**	**1691 Tage**	**Mon 01.07.24**	**Mon 30.06.31**
2	Projektstart	0 Tage	Don 11.07.24	Don 11.07.24
3	**Projektvorbereitung**	**482 Tage**	**Mon 01.07.24**	**Die 30.06.26**
4	Bauherrenfestlegungen	220 Tage	Mon 01.07.24	Fre 30.05.25
5	Externe Gutachten	400 Tage	Mon 01.07.24	Fre 27.02.26
6	Externe Planerleistungen	482 Tage	Mon 01.07.24	Die 30.06.26
7	**Projektphase 1: Projektentwicklung, strategische Planung, Grundlagenermittlung**	**181 Tage**	**Mon 01.07.24**	**Mon 31.03.25**
8	Projektsteuerungsleistungen	66 Tage	Mon 01.07.24	Mon 30.09.24
9	Grundlagenermittlung	181 Tage	Mon 01.07.24	Mon 31.03.25
10	**Projektphase 2: Planung (Vor-, Entwurfs, und Genehmigungsplanung)**	**505 Tage**	**Mon 01.07.24**	**Fre 31.07.26**
11	Vorplanung	241 Tage	Mon 01.07.24	Mon 30.06.25
12	Entwurfsplanung (inkl. Nachlauf Dokumentation)	241 Tage	Die 01.04.25	Die 31.03.26
13	Genehmigungsplanung	35 Tage	Mon 03.11.25	Fre 19.12.25
14	Einreichung Bauantrag	0 Tage	Fre 19.12.25	Fre 19.12.25
15	Genehmigungsdauer (Annahme)	140 Tage	Mon 12.01.26	Fre 31.07.26
16	Baugenehmigung erteilt	0 Tage	Fre 31.07.26	Fre 31.07.26
17	**Projektphase 3: Ausführungsvorbereitung (Ausführungsplanung, Vorbereiten und Mitwirken bei der Vergabe)**	**460 Tage**	**Die 01.07.25**	**Mon 31.05.27**
18	**Bauabschnitt 1: vorweglaufende Bauarbeiten (u. a. Baufeld freimachen, Erschließung, Erd-/Verbauarbeiten)**	**181 Tage**	**Die 01.07.25**	**Die 31.03.26**
19	Ausführungsplanung und Ausschreibung (LV)	66 Tage	Die 01.07.25	Die 30.09.25
20	Vergabeprozess	137 Tage	Mon 01.09.25	Die 31.03.26
21	**Bauabschnitt 2: zentrale Bau-, Montage- und Installationsarbeiten**	**336 Tage**	**Mon 12.01.26**	**Mon 31.05.27**
22	Ausführungsplanung und Ausschreibung (LV) - Bautechnik	183 Tage	Mon 12.01.26	Mit 30.09.26
23	Vergabeprozess - Bautechnik	114 Tage	Die 01.09.26	Fre 26.02.27
24	Ausführungsplanung und Ausschreibung (LV) - Maschinentechnik	240 Tage	Mon 12.01.26	Fre 18.12.26
25	Vergabeprozess - Maschinentechnik	110 Tage	Die 01.12.26	Mon 31.05.27
26	Ausführungsplanung und Ausschreibung (LV) - EMSR-Technik	240 Tage	Mon 12.01.26	Fre 18.12.26
27	Vergabeprozess - EMSR-Technik	110 Tage	Die 01.12.26	Mon 31.05.27
28	**Projektphase 4: Ausführung (Projekt-, Bauüberwachung)**	**1406 Tage**	**Mon 01.09.25**	**Mon 30.06.31**
29	Start Bauausführung (vorweglaufende Bauarbeiten)	0 Tage	Mon 01.09.25	Mon 01.09.25
30	Bauabschnitt 1: vorweglaufende Bauarbeiten (u. a. Baufeld freimachen, Erschließung, Erd-/Verbauarbeiten)	320 Tage	Mon 01.09.25	Fre 18.12.26
31	Bauabschnitt 2: zentrale Bau-, Montage- und Installationsarbeiten	950 Tage	Mon 01.02.27	Fre 20.12.30
32	Beginn Inbetriebnahme	0 Tage	Mon 13.01.31	Mon 13.01.31
33	Inbetriebnahme, Abnahme und Übergabe	121 Tage	Mon 13.01.31	Mon 30.06.31

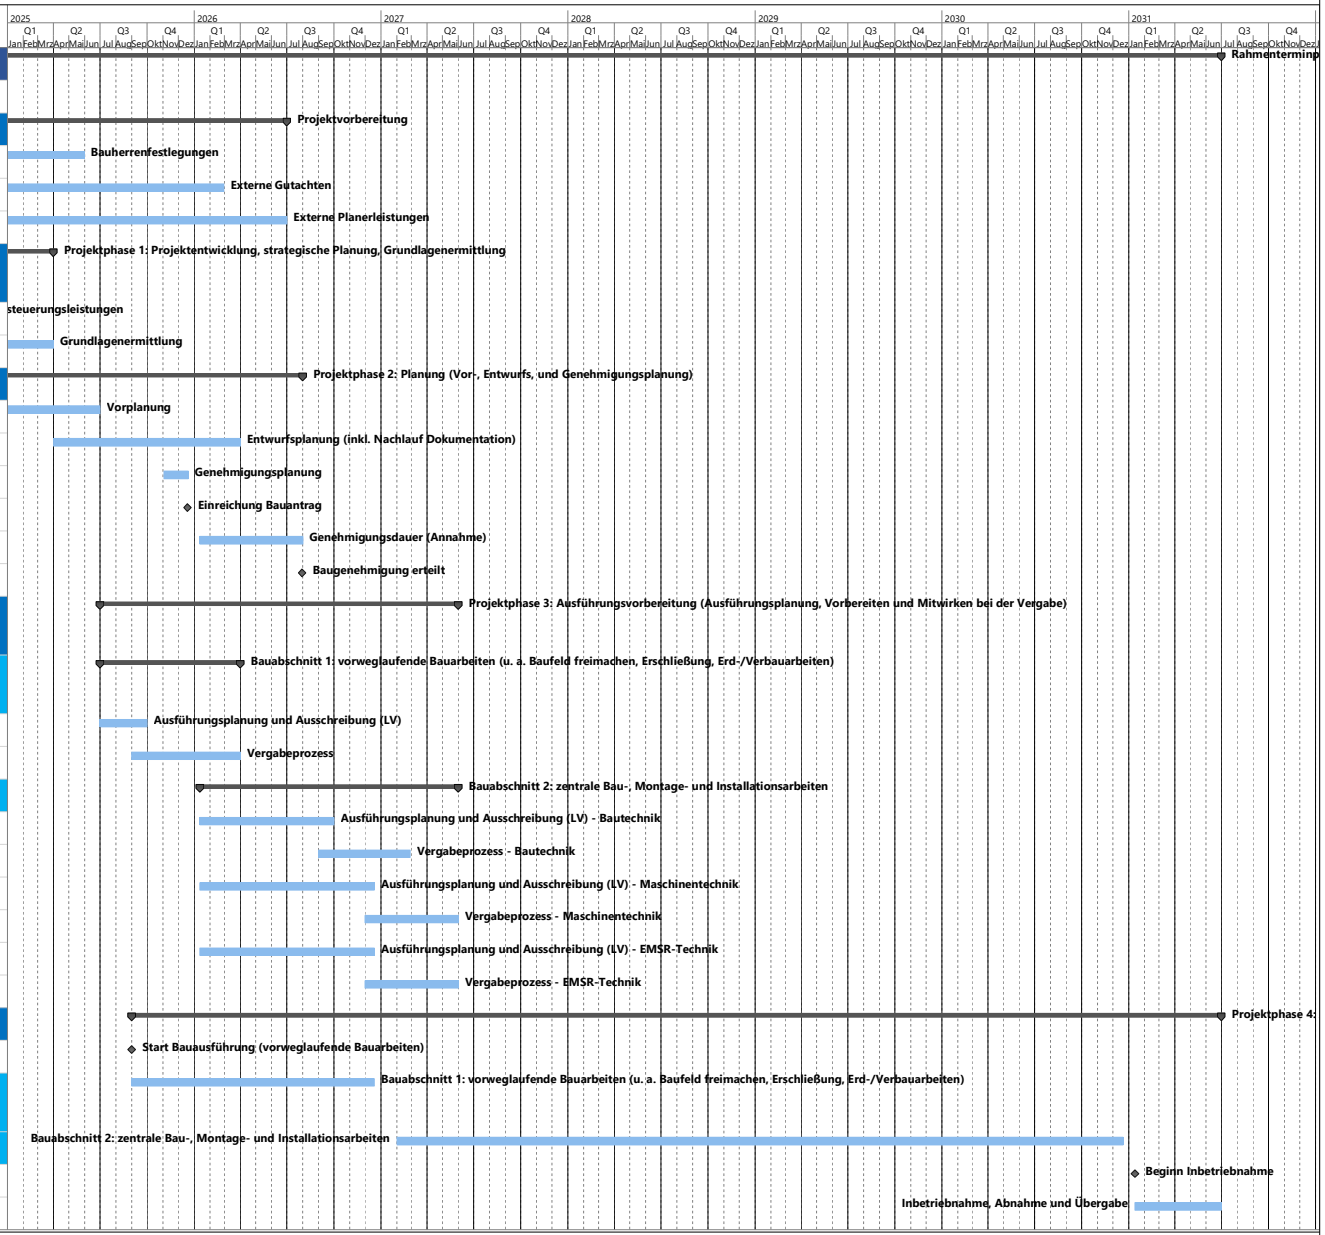

Projekt: KAUA-L0-VE00-000-DUS-TP-Rahmenterminplan.mpp
Ansicht: RTP-Neu-2025
Aufgestellt: Wolf, Wladimir

Vorgang | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Manueller Vorgang | In Arbeit
