
Nr.	Vorgangsr	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1		Verhandlungsverfahre Planungsleistung	89 Tage	Die 01.09.26	Fre 01.01.27	
2		Erstellen Ausführungsplanung	85 Tage	Mon 04.01.27	Fre 30.04.27	1
3		Ausschreibung Bauleistung	40 Tage	Mon 03.05.27	Fre 25.06.27	2
4		Rohdungarbeiten um	10 Tage	Don 01.07.27	Mit 14.07.27	3
5		Abbruch der Vorhangfassade	30 Tage	Don 15.07.27	Mit 25.08.27	4
6		Flächenputz Außen im Sockel auf	10 Tage	Don 26.08.27	Mit 08.09.27	5
7		Oberbodenabtragen zum Dämmen der	7 Tage	Don 09.09.27	Fre 17.09.27	6
8		Abbruch Sportboden (	7 Tage	Don 26.08.27	Fre 03.09.27	5
9		Rückbau Versenkreck	5 Tage	Mon 06.09.27	Fre 10.09.27	8
10		Abdichtung des Sockelanschlusses,	15 Tage	Mon 20.09.27	Fre 08.10.27	7
11		Regenwasser Entwässerung um	10 Tage	Mon 11.10.27	Fre 22.10.27	10
12		Aufstellen Innengerüs	5 Tage	Mon 13.09.27	Fre 17.09.27	9;8
13		Aufstellen Außengerü	5 Tage	Mon 25.10.27	Fre 29.10.27	11
14		Abbruch Flachdachaufbau inklusive Dachflächenfenster (3-Wochen)	30 Tage	Mon 01.11.27	Fre 10.12.27	9;13
15		Einbau neuer Dachflächenfenster/ Flachdachaufbau erneuern (20-Wochen)	200 Tage	Mon 13.12.27	Fre 15.09.28	14
16		Einbau neuer Fensterelemente und Pfostenriegelkonstruk (26-Wochen)	165 Tage	Mon 01.11.27	Fre 13.10.28	13
17		Flächenputz Außen auf Ziegelmauerwerk	10 Tage	Mon 25.10.27	Fre 05.11.27	11
18		Wärmedämmverbund	150 Tage	Mon 16.10.28	Fre 11.05.29	15;16;17
19		Rückbau Lüftung, Rückbau	10 Tage	Mon 20.09.27	Fre 01.10.27	12
20		Grob Elektro, Lüftung und	70 Tage	Mon 04.10.27	Fre 07.01.28	19
21		Montage Blitzschutz (	5 Tage	Mon 14.05.29	Fre 18.05.29	15;18
22		Feininstallation Beleuchtung	15 Tage	Mon 10.01.28	Fre 28.01.28	20
23		Einbau des neuen Sp	20 Tage	Mon 16.10.28	Fre 10.11.28	15;16;22
24		Bauendreinigung (2-W	10 Tage	Mon 14.05.29	Fre 25.05.29	18;22;23;15;16
25		Abnahmen/ Inbetriebnahme/ Mängelbehebung	25 Tage	Mon 28.05.29	Fre 29.06.29	24

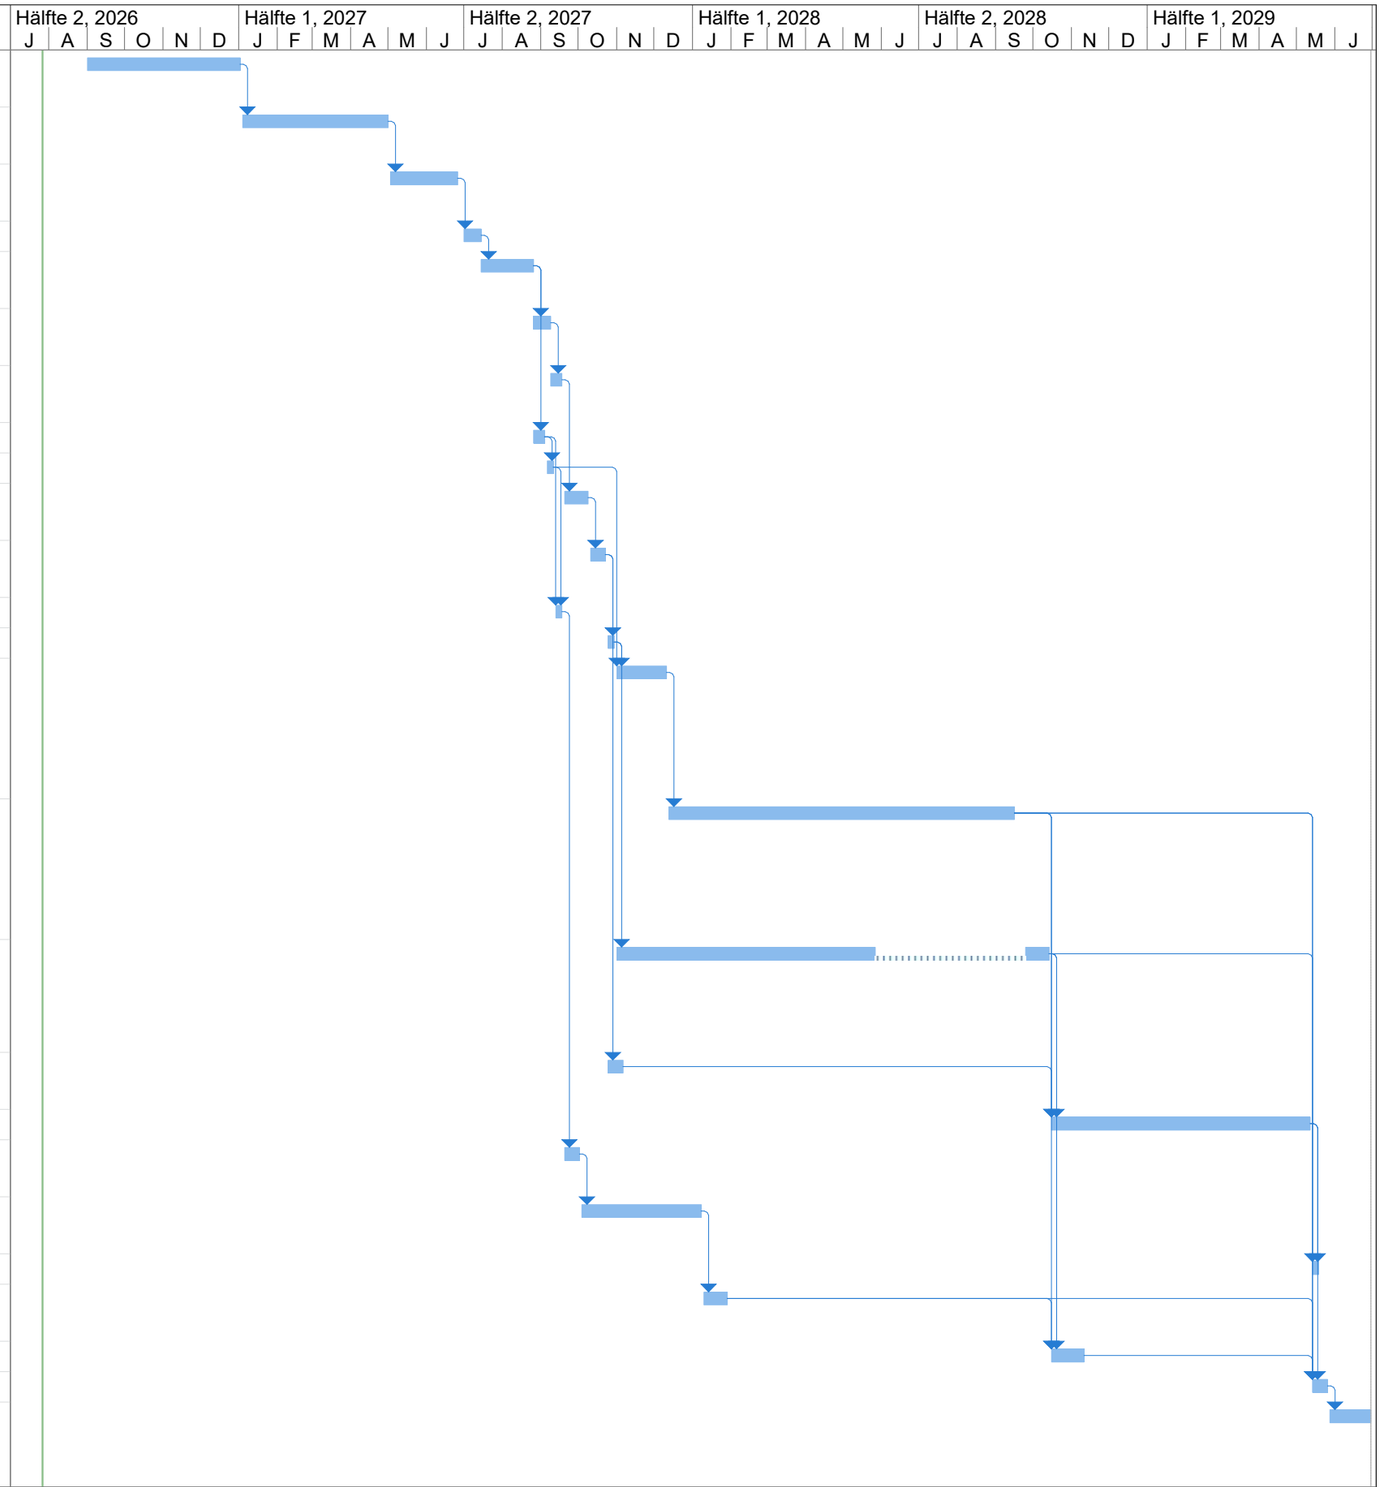

Projekt: Energetische Sanierung einer Feldsporthalle
Datum: Mon 27.07.26

Vorgang	Projektsammelvorgang	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Stichtag
Unterbrechung	Externe Vorgänge	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	In Arbeit
Meilenstein	Externer Meilenstein	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Manueller Fortschritt
Sammelvorgang	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	
