
MHG Villa Rücker, Terminplan
Vorabzug

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		**Ferien Hamburg 2026**	**220 Tage**	**Mon 02.03.26**	**Fre 01.01.27**
6		**Zeiträume RTP MHG + Bau + Logistik**	**898 Tage**	**Mon 14.07.25**	**Mit 20.12.28**
7		**Fertigstellung Beräumung (Modelleisenbahn)**	0 Tage	Mon 14.07.25	Mon 14.07.25
8		LPH 8 BA1 inkl. Schadstoffsanierung	122 Wochen	Die 05.08.25	Mon 06.12.27
9		LPH 8 BA1, 2.OG	12 Wochen	Don 04.11.27	Mit 26.01.28
10		LPH 8 BA2	92 Wochen	Die 03.03.26	Mon 06.12.27
11		Einbau Villa Rücker	55 Wochen	Don 02.12.27	Mit 20.12.28
12		Austellungsgestaltung	40 Wochen	Die 01.02.28	Mon 06.11.28
13		Möglicher Eröffnungstermin	0 Tage	Mon 18.12.28	Mon 18.12.28
14		**Phase 1: Stand 2024-2025**	**339 Tage?**	**Mon 01.08.22**	**Don 16.11.23**



55		**Ausführung der Arbeiten an bauzeitlichen Bauteilen**	**310 Tage**	**Don 05.11.26**	**Mit 12.01.28**
56		VE02 Restaurierung Holz inkl. Beschläge	250 Tage	Don 05.11.26	Mit 20.10.27
57		VE03 Restuarierung Tapete	250 Tage	Die 17.11.26	Mon 01.11.27
58		VE01 Restaurierung Stuck inkl. Vormontage	250 Tage	Don 28.01.27	Mit 12.01.28
59		VE02, Spiegel und Gläser, Herstellung	50 Tage	Don 01.04.27	Mit 09.06.27
60		Raumschale inkl. Dielenboden	85 Tage	Mon 12.07.27	Fre 05.11.27
61		**Phase 3: Rekonstruktionen, Einbauten und Montagen**	**182 Tage**	**Don 02.12.27**	**Fre 11.08.28**
62		**Beginn Einbau Villa Rücker**	0 Tage	Don 02.12.27	Don 02.12.27
63		VE01 Montage Stuck- und Fassungsarbeiten	120 Tage	Don 02.12.27	Mit 17.05.28
64		VE02 Montage Holz inkl. Beschläge	120 Tage	Mon 28.02.28	Fre 11.08.28
65		VE01 Montage Spiegel und Gläser	30 Tage	Mon 08.05.28	Fre 16.06.28
66		VE03 Montage Tapete	60 Tage	Mon 22.05.28	Fre 11.08.28
67		**Fertigstellungstermin**	1 Tag	Mon 14.08.28	Mon 14.08.28

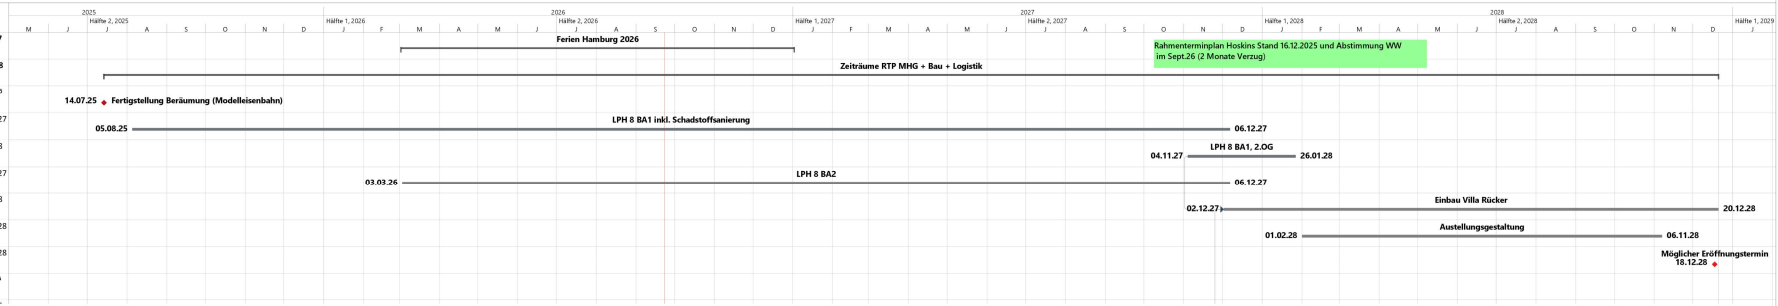
