Nr.	Vorgangsname	Dauer	Verantwortlich	Anfang	Ende	% Abg.	Vorgänger
0	260611 RA Bauablaufplan	472 Tage		Don 18.06.26	Fre 21.04.28	0%	
1	1 Auszug Nutzer	9 Tage	AKK	Don 18.06.26	Die 30.06.26	0%	
2	2 Kick-Off	1 Tag	ALLE	Don 18.06.26	Don 18.06.26	0%	1AA
3	3 Vorab Maßnahmen	128 Tage		Mit 01.07.26	Fre 08.01.27	0%	
39	4 Aufstockung Reha	330 Tage		Fre 21.08.26	Don 09.12.27	0%	
56	5 UG	22 Tage		Mit 02.09.26	Don 01.10.26	0%	
73	6 EG	123 Tage	ALLE	Mit 01.07.26	Fre 18.12.26	0%	
75	7 Abbruch Bestand über EG	28 Tage	Rohbau / TGA	Die 15.09.26	Don 22.10.26	0%	
81	8 1.OG	283 Tage	ALLE	Die 13.10.26	Don 25.11.27	0%	
147	9 2.OG	233 Tage		Mon 08.02.27	Mit 29.12.27	0%	
214	10 3.OG	243 Tage		Fre 30.04.27	Die 04.04.28	0%	
281	11 Dachabdichtungsarbeiten	53 Tage		Don 22.07.27	Mon 04.10.27	0%	
291	12 WDVS	92 Tage		Fre 11.06.27	Mon 18.10.27	0%	
292	12.1 Klinkerriemchen / WDVS Putz Bestand einschneiden	7 Tage		Fre 11.06.27	Mon 21.06.27	0%	220
293	12.2 Tropfkante Übergang Altbestand einbauen	5 Tage		Die 22.06.27	Mon 28.06.27	0%	292
294	12.3 vorb. Arbeiten WDVS	3 Tage		Don 05.08.27	Mon 09.08.27	0%	239AA;172AA;105AA
295	12.4 MiWo Dämmung kleben / dübeln	20 Tage		Die 10.08.27	Mon 06.09.27	0%	294
296	12.5 MiWo Dämmung armieren	25 Tage		Die 17.08.27	Mon 20.09.27	0%	295AA+5 Tage
297	12.6 Riemchen kleben	30 Tage		Die 24.08.27	Mon 04.10.27	0%	296AA+5 Tage
298	12.7 Riemchen verfugen	25 Tage		Die 07.09.27	Mon 11.10.27	0%	297AA+10 Tage
299	12.8 Versiegeln	5 Tage		Die 12.10.27	Mon 18.10.27	0%	298
300	13 Fenster Einsatz 2	10 Tage		Die 12.10.27	Mon 25.10.27	0%	
302	14 Metallfassade	13 Tage		Die 26.10.27	Don 11.11.27	0%	
305	15 Schlosserarbeiten	50 Tage		Fre 10.12.27	Don 17.02.28	0%	50
306	16 Inbetriebnahme und Abnahmen	30 Tage		Mon 13.03.28	Fre 21.04.28	0%	

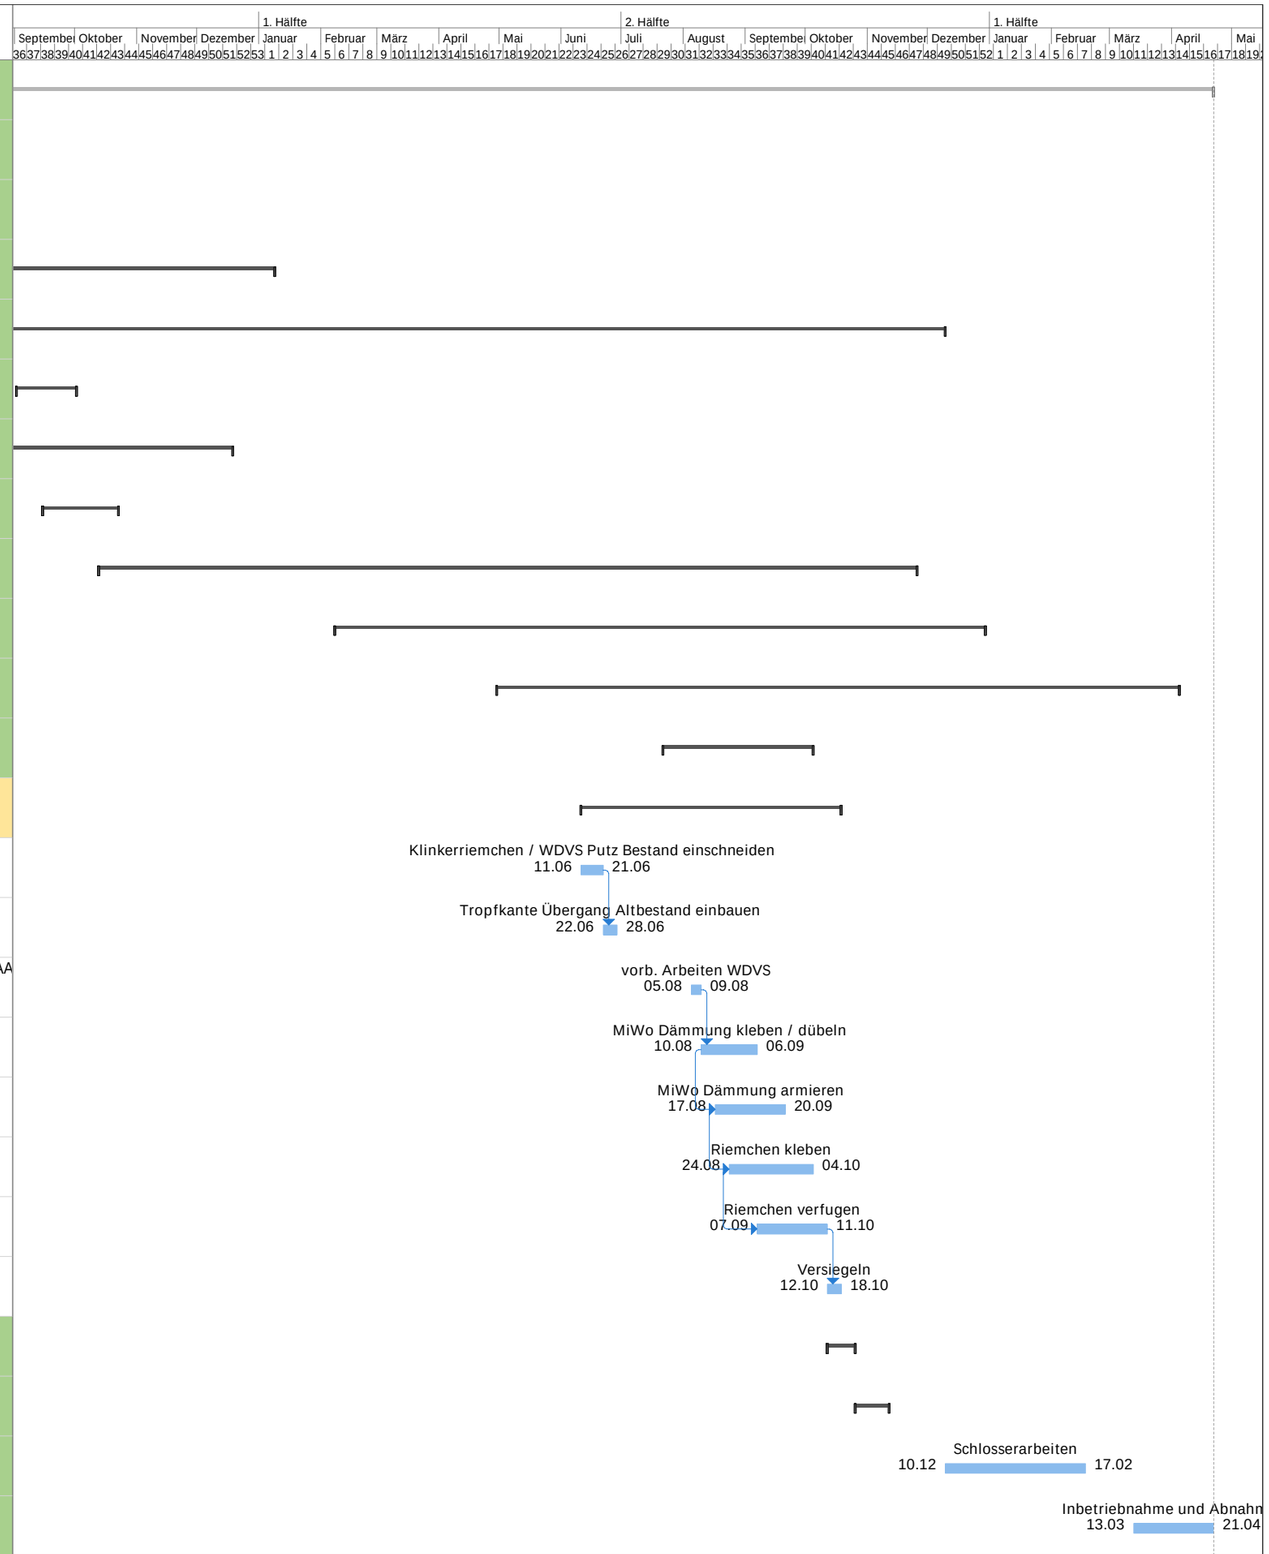

Projekt: 260611 RA Bauablaufp
Datum: Fre 19.06.26

Vorgang | Sammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Nur Dauer | Nur Anfang | Externer Meilenstein | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Projektsammelvorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Ende | Stichtag
Meilenstein | Inaktiver Vorgang | Manueller Vorgang | Manueller Sammelvorgang | Externe Vorgänge | In Arbeit
