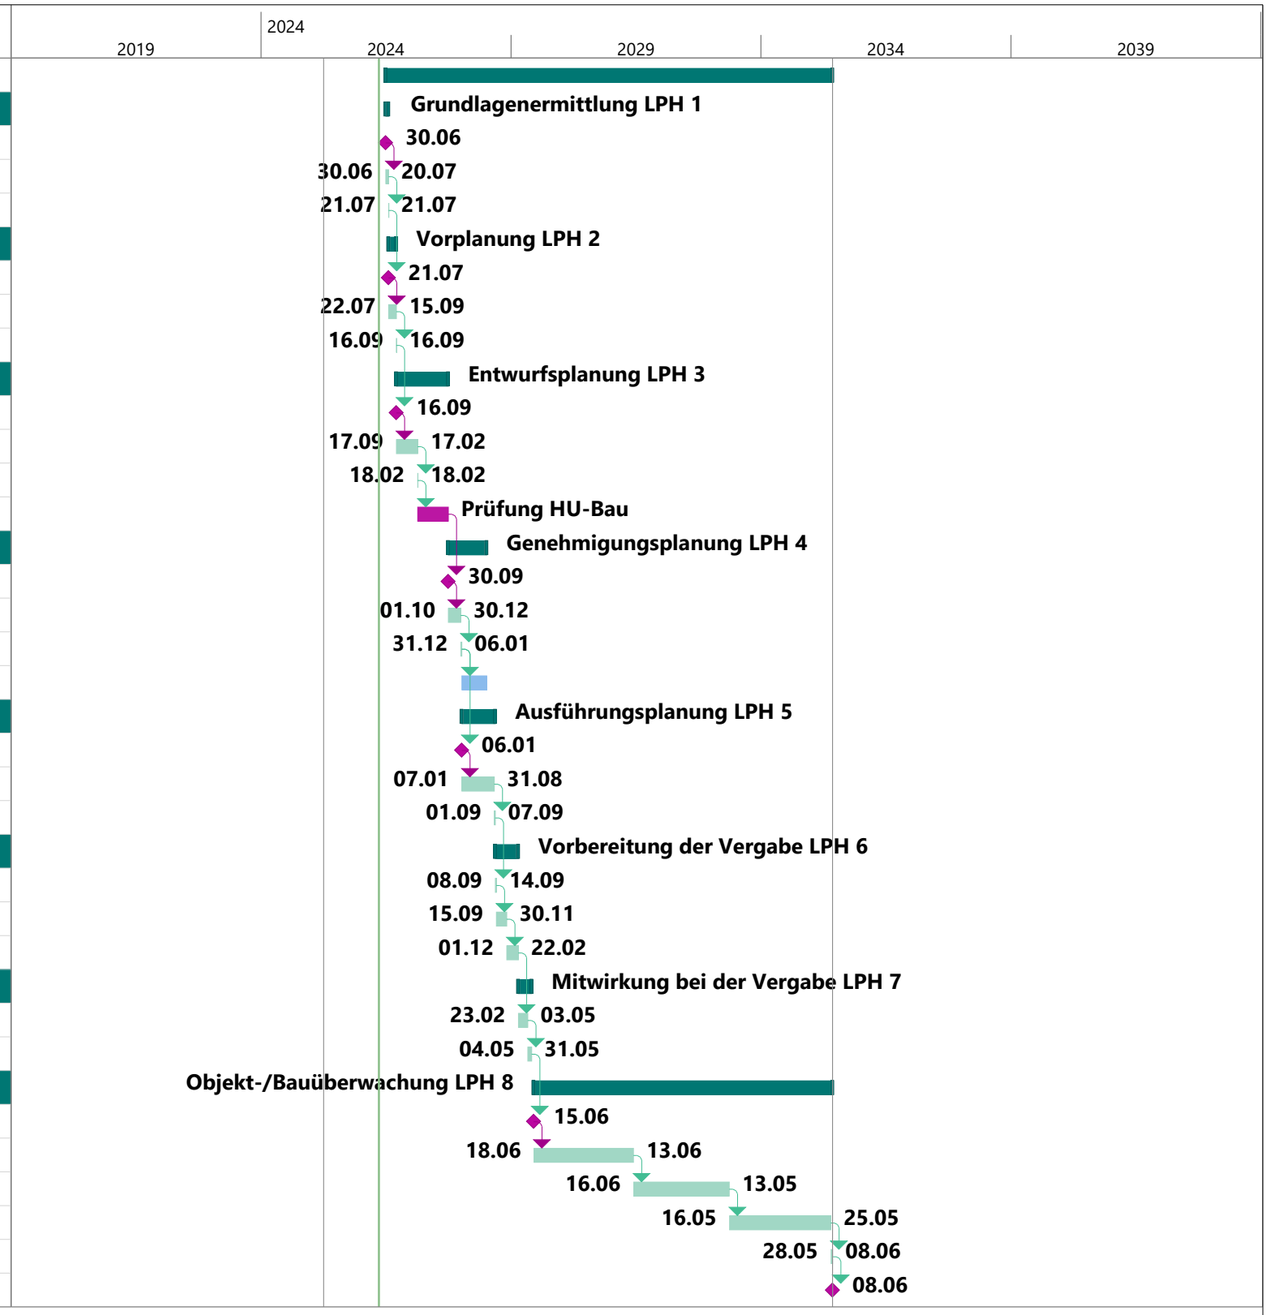Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Neubau Psychiatrie Göttingen**	**2334 Tage**	**Die 30.06.26**	**Fre 08.06.35**
2	**Grundlagenermittlung LPH 1**	**16 Tage**	**Die 30.06.26**	**Die 21.07.26**
3	**Projekt Kick-off-Termin START**	0 Tage	Die 30.06.26	Die 30.06.26
4	Erstellung Grundlagenermittlung	15 Tage	Die 30.06.26	Mon 20.07.26
5	Freigabe Grundlagenermittlung	1 Tag	Die 21.07.26	Die 21.07.26
6	**Vorplanung LPH 2**	**41 Tage**	**Die 21.07.26**	**Mit 16.09.26**
7	**Kick-off-Termin LPH 2**	0 Tage	Die 21.07.26	Die 21.07.26
8	Erstellung Vorplanung	40 Tage	Mit 22.07.26	Die 15.09.26
9	Freigabe Vorplanung	1 Tag	Mit 16.09.26	Mit 16.09.26
10	**Entwurfsplanung LPH 3**	**271 Tage**	**Mit 16.09.26**	**Don 30.09.27**
11	**Kick-off-Termin LPH 3**	0 Tage	Mit 16.09.26	Mit 16.09.26
12	Erstellung Entwurfsplanung	110 Tage	Don 17.09.26	Mit 17.02.27
13	Freigabe Entwurfsplanung	1 Tag	Don 18.02.27	Don 18.02.27
14	**Prüfung HU-Bau**	160 Tage	Fre 19.02.27	Don 30.09.27
15	**Genehmigungsplanung LPH 4**	**200 Tage**	**Don 30.09.27**	**Don 06.07.28**
16	**Kick-off-Termin LPH 4**	0 Tage	Don 30.09.27	Don 30.09.27
17	Erstellung Genehmigungsplanung	65 Tage	Fre 01.10.27	Don 30.12.27
18	Freigabe Genehmigungsplanung	5 Tage	Fre 31.12.27	Don 06.01.28
19	Dauer Baugenehmigung	130 Tage	Fre 07.01.28	Don 06.07.28
20	**Ausführungsplanung LPH 5**	**175 Tage**	**Don 06.01.28**	**Don 07.09.28**
21	**Kick-off-Termin LPH 5**	0 Tage	Don 06.01.28	Don 06.01.28
22	Erstellung Ausführungsplanung	170 Tage	Fre 07.01.28	Don 31.08.28
23	Freigabe Ausführungsplanung	5 Tage	Fre 01.09.28	Don 07.09.28
24	**Vorbereitung der Vergabe LPH 6**	**120 Tage**	**Fre 08.09.28**	**Don 22.02.29**
25	Festlegen der Vergabestrategie	5 Tage	Fre 08.09.28	Don 14.09.28
26	Erstellung der Leistungsverzeichnisse	55 Tage	Fre 15.09.28	Don 30.11.28
27	Veröffentlichung der Ausschreibung	60 Tage	Fre 01.12.28	Don 22.02.29
28	**Mitwirkung bei der Vergabe LPH 7**	**70 Tage**	**Fre 23.02.29**	**Don 31.05.29**
29	Auswertungen/Wartefrist	50 Tage	Fre 23.02.29	Don 03.05.29
30	Beauftragung	20 Tage	Fre 04.05.29	Don 31.05.29
31	**Objekt-/Bauüberwachung LPH 8**	**1560 Tage**	**Fre 15.06.29**	**Fre 08.06.35**
32	**Baubeginn**	0 Tage	Fre 15.06.29	Fre 15.06.29
33	1. Bauphase bis Übergabe an Klinik	520 Tage	Mon 18.06.29	Fre 13.06.31
34	2. Bauphase bis Übergabe an Klinik	500 Tage	Mon 16.06.31	Fre 13.05.33
35	3. Bauphase bis Übergabe an Klinik	530 Tage	Mon 16.05.33	Fre 25.05.35
36	Inbetriebnahme / Abnahme	10 Tage	Mon 28.05.35	Fre 08.06.35
37	**Übergabe**	0 Tage	Fre 08.06.35	Fre 08.06.35
