Bauzeitenplan
Metallbau- und Schlosserarbeiten 06.07.2026
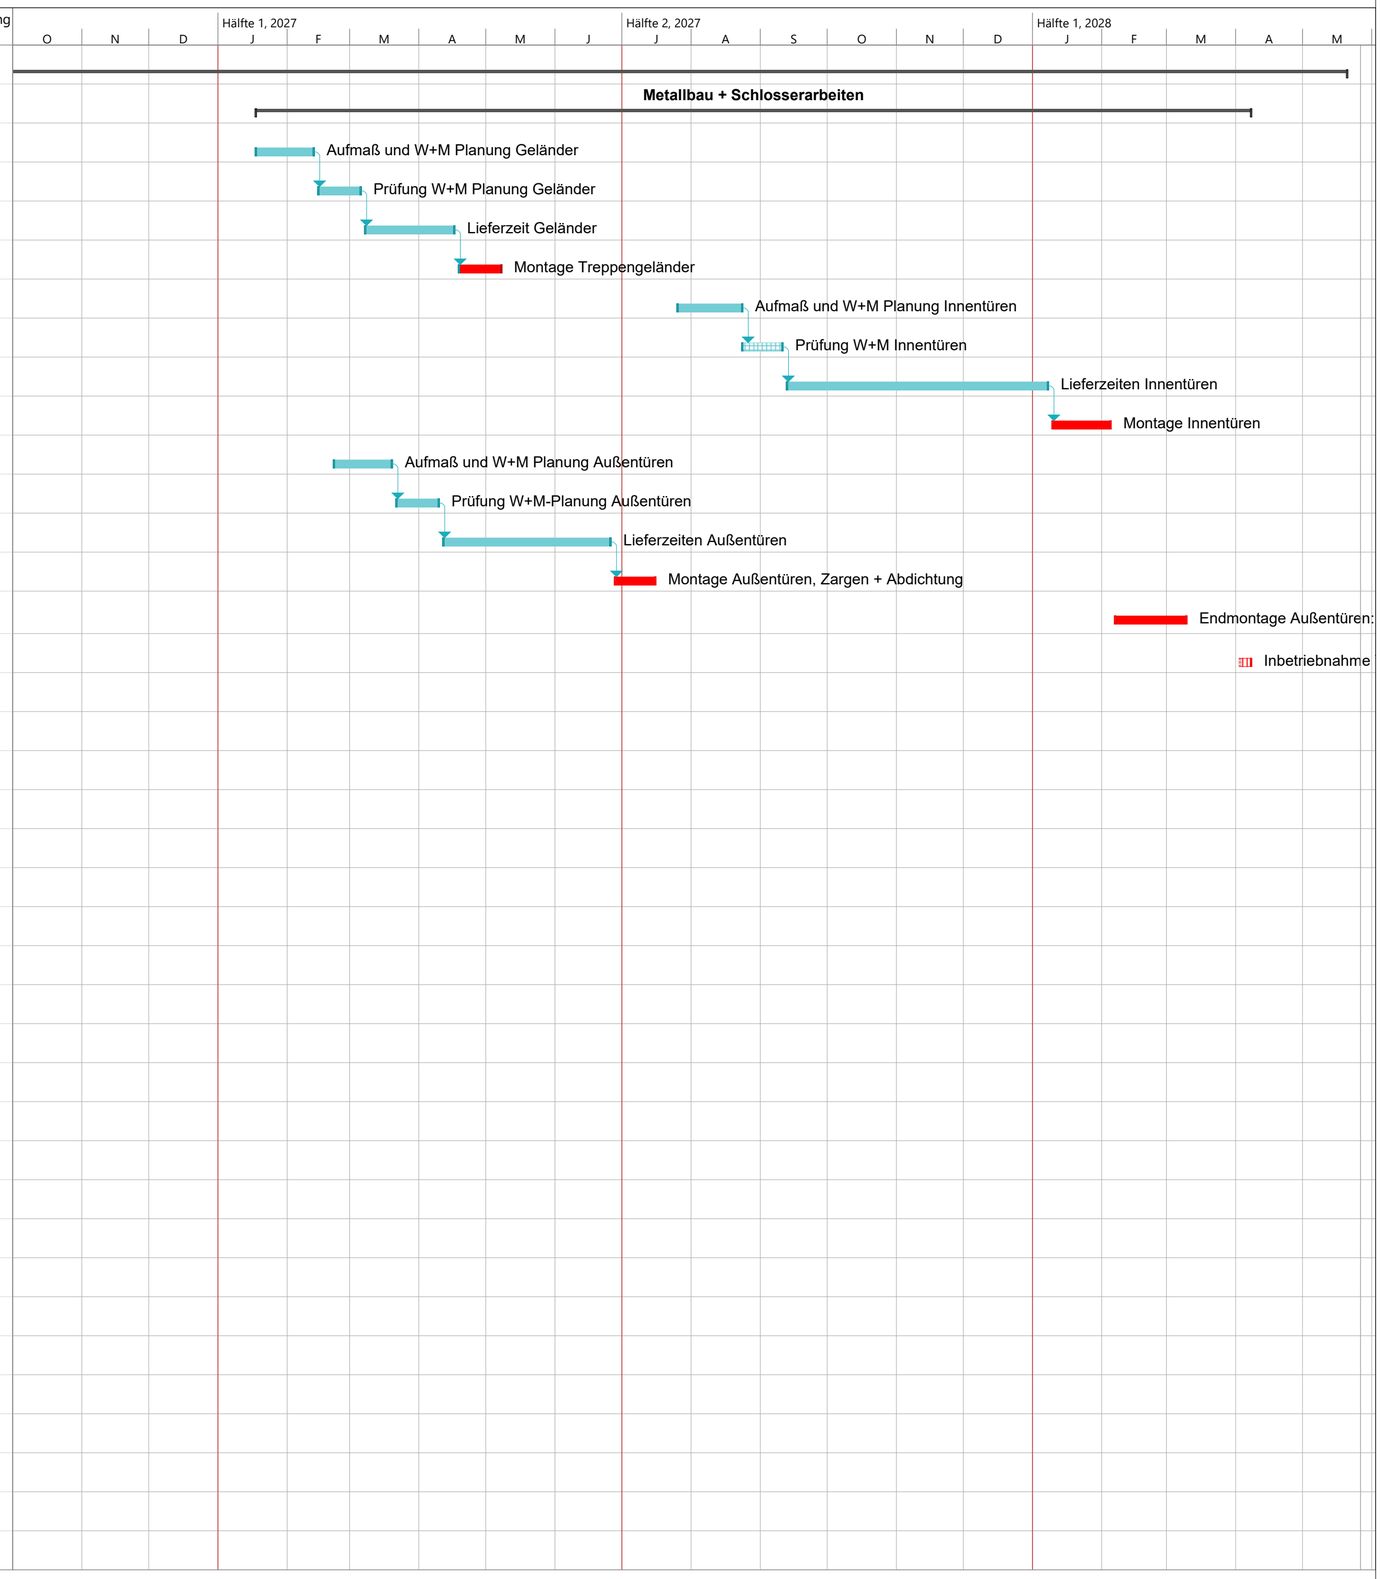
Nr.	Vorgangsn	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgäng
108		**LP 8 Objektüberwachung**	**1054 Tage?**	**Die 07.05.24**	**Son 21.05.28**	
235		**Metallbau + Schlosserarbeiten**	**320 Tage**	**Mon 18.01.27**	**Fre 07.04.28**	
236		Aufmaß und W+M Planung Geländer	20 Tage	Mon 18.01.27	Fre 12.02.27	
237		Prüfung W+M Planung Geländer	15 Tage	Mon 15.02.27	Fre 05.03.27	236
238		Lieferzeit Geländer	30 Tage	Mon 08.03.27	Fre 16.04.27	237
239		Montage Treppengeländer	15 Tage	Mon 19.04.27	Fre 07.05.27	238
240		Aufmaß und W+M Planung Innentüren	21 Tage	Mon 26.07.27	Mon 23.08.27	206
241		Prüfung W+M Innentüren	14 Tage	Die 24.08.27	Fre 10.09.27	240
242		Lieferzeiten Innentüren	85 Tage	Mon 13.09.27	Fre 07.01.28	241
243		Montage Innentüren	20 Tage	Mon 10.01.28	Fre 04.02.28	242
244		Aufmaß und W+M Planung Außentüren	20 Tage	Mon 22.02.27	Fre 19.03.27	
245		Prüfung W+M-Planung Außentüren	15 Tage	Mon 22.03.27	Fre 09.04.27	244
246		Lieferzeiten Außentüren	55 Tage	Mon 12.04.27	Fre 25.06.27	245
247		Montage Außentüren, Zargen + Abdichtung	14 Tage	Mon 28.06.27	Don 15.07.27	246
248		Endmontage Außentüren: Austausch Baustellenzugänge gegen Türelemente	24 Tage	Mon 07.02.28	Don 09.03.28	
249		Inbetriebnahme Türen	5 Tage	Mon 03.04.28	Fre 07.04.28	265
