IMBJ240033 Ganztags-Ausbau GS Melanchthonstraße
Terminplan-Basis: RLBau, VgV und Einzelvergaben

Rahmenterminplan für Gesamtprojekt
Stand 17.04.2026
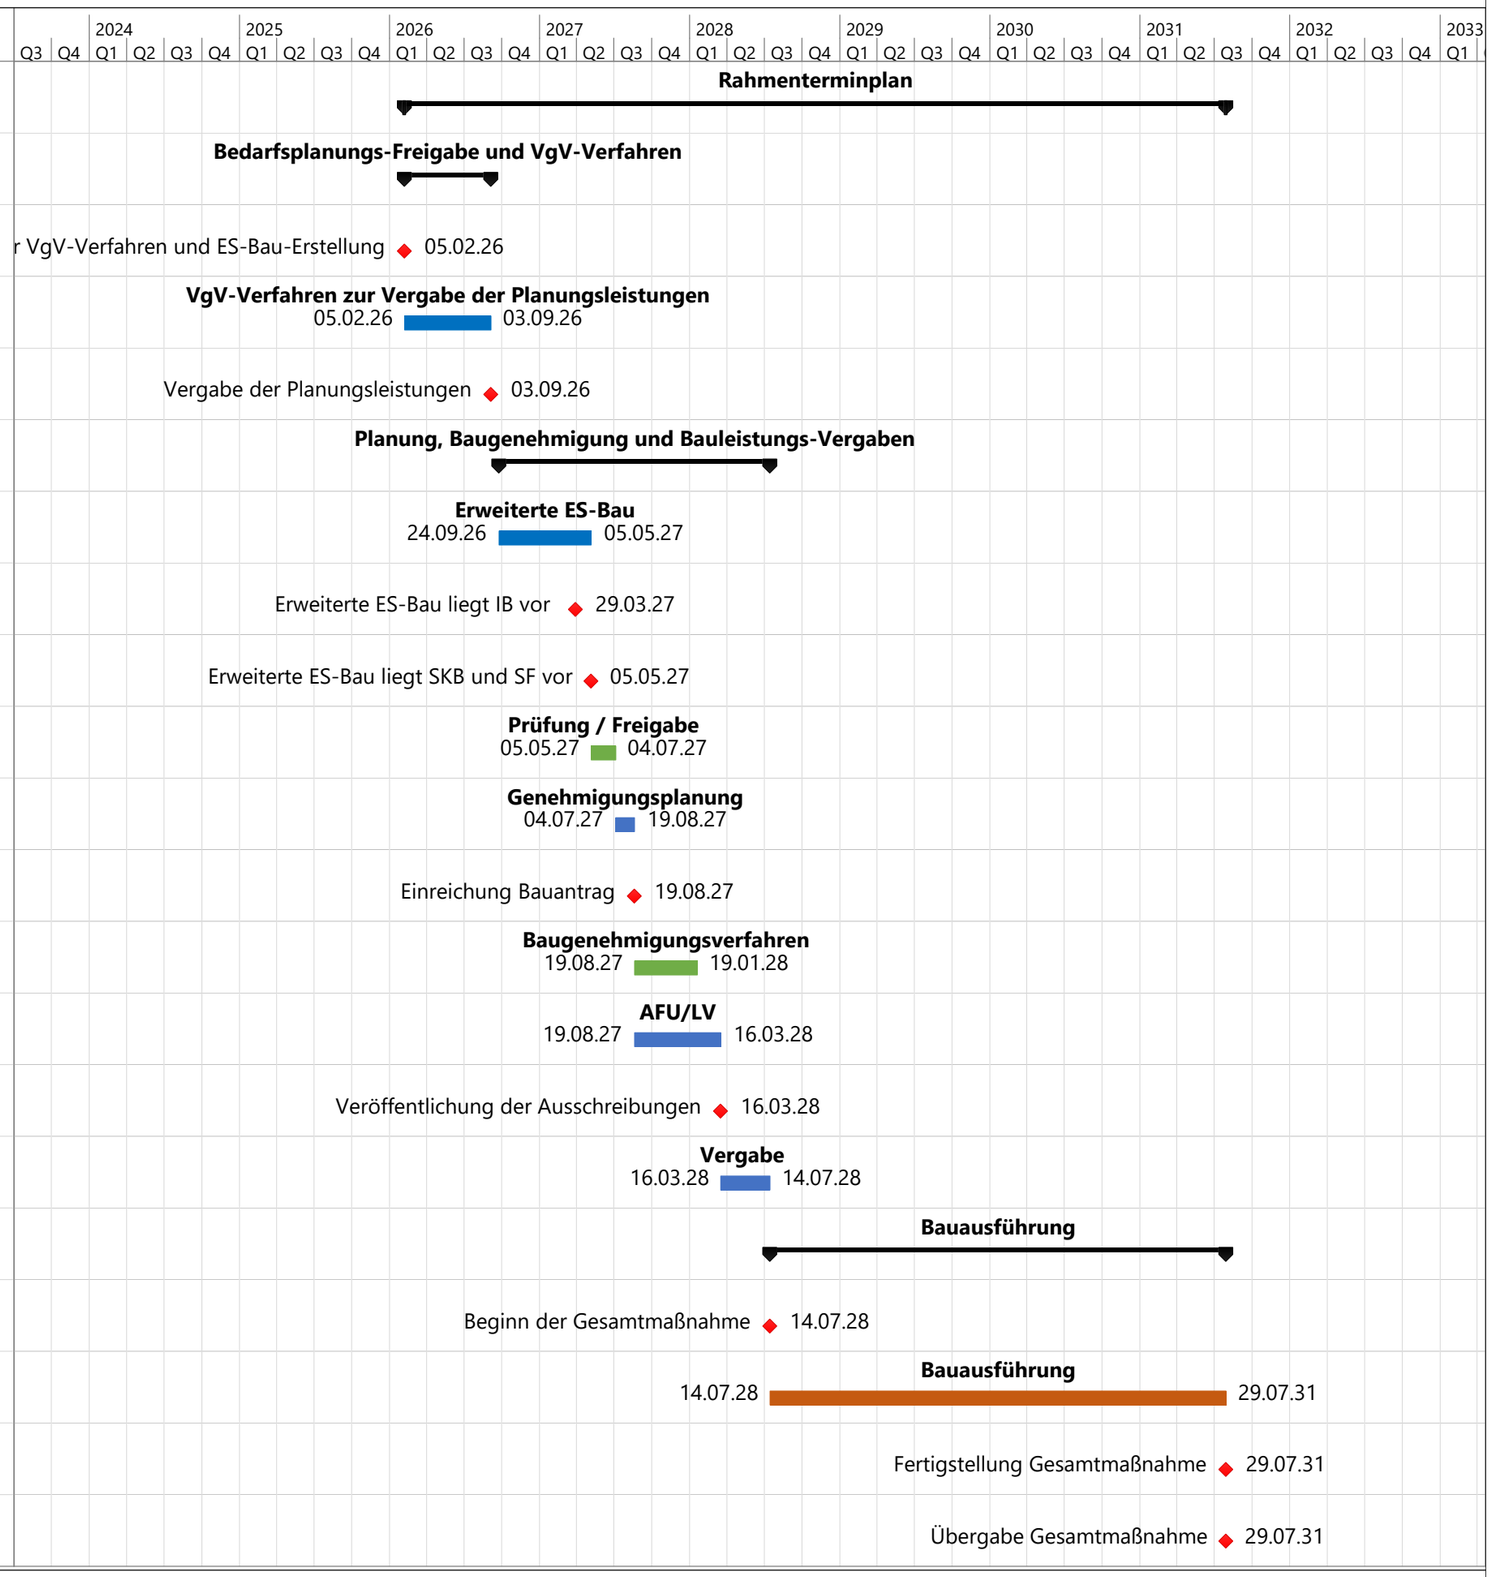
Nr.	Name	Anfang	Ende
0	**Rahmenterminplan**	05.02.26	29.07.31
1	**Bedarfsplanungs-Freigabe und VgV-Verfahren**	05.02.26	03.09.26
2	Auftrag für VgV-Verfahren und ES-Bau-Erstellung	05.02.26	05.02.26
3	VgV-Verfahren zur Vergabe der Planungsleistungen	05.02.26	03.09.26
4	Vergabe der Planungsleistungen	03.09.26	03.09.26
5	**Planung, Baugenehmigung und Bauleistungs-Vergaben**	24.09.26	14.07.28
6	Erweiterte ES-Bau	24.09.26	05.05.27
7	Erweiterte ES-Bau liegt IB vor	29.03.27	29.03.27
8	Erweiterte ES-Bau liegt SKB und SF vor	05.05.27	05.05.27
9	Prüfung / Freigabe	05.05.27	04.07.27
10	Genehmigungsplanung	04.07.27	19.08.27
11	Einreichung Bauantrag	19.08.27	19.08.27
12	Baugenehmigungsverfahren	19.08.27	19.01.28
13	AFU/LV	19.08.27	16.03.28
14	Veröffentlichung der Ausschreibungen	16.03.28	16.03.28
15	Vergabe	16.03.28	14.07.28
16	**Bauausführung**	14.07.28	29.07.31
17	Beginn der Gesamtmaßnahme	14.07.28	14.07.28
18	Bauausführung	14.07.28	29.07.31
19	Fertigstellung Gesamtmaßnahme	29.07.31	29.07.31
20	Übergabe Gesamtmaßnahme	29.07.31	29.07.31
