Projekt: IMBS250026 Ersatzneubau Umkleidegebäude Oeversberg

Basis: Einhaltung RLBau, VgV mit Wettbewerb,

Zusammenfassung mehrerer Fachlose, Baukosten kleiner 6 Mio €

R A H M E N T E R M I N P L A N
VgV-Verfahren

Nr.	Name	Anfang	Ende	Dauer
0	**Rahmenterminplan**	Mon 01.12.25	Don 02.08.29	47,95M
1	**Bedarfsplanung**			
2	Auftrag erw. ES-Bau / Mittelbereitstellung Planungskosten	Mon 01.12.25	Mon 01.12.25	0fM
3	VgV Verfahren	Mon 05.01.26	Sam 04.07.26	6fM
4	VGV / Wettbewerb / Vergabe	Mon 06.07.26	Fre 14.08.26	1,5M
5	**Planungsphase**	Mon 17.08.26	Mon 10.01.28	17,05fM
6	erw. ES-Bau	Mon 17.08.26	Don 14.01.27	5fM
7	erw. ES Bau liegt Ressort vor	Don 14.01.27	Don 14.01.27	0fM
8	Prüfung / Freigabe	Don 14.01.27	Mit 14.04.27	3fM
9	Bauantragsplanung	Fre 30.04.27	Son 30.05.27	1fM
10	Einrreichung Bauantrag	Son 30.05.27	Son 30.05.27	0fM
11	Baugenehmigung	Son 30.05.27	Sam 28.08.27	3fM
12	AFU/LV	Sam 28.08.27	Die 12.10.27	1,5fM
13	Veröffentlichung der Ausschreibung	Die 12.10.27	Die 12.10.27	0fM
14	Vergabe	Die 12.10.27	Mon 10.01.28	3fM
15	**Bauausführung Baukosten < 6,0 Mio € (KG300+400)**	Mon 10.01.28	Don 02.08.29	20,45M
16	Beginn der Gesamtmaßnahme	Mon 10.01.28	Mon 10.01.28	0fM
17	Bauausführung	Mon 10.01.28	Fre 04.05.29	16fM
18	Fertigstellung Gesamtmaßnahme	Fre 04.05.29	Die 03.07.29	2fM
19	Abnahme, Einregulierung	Die 03.07.29	Don 02.08.29	1fM
20	Übergabe Geamtmaßnahme	Don 02.08.29	Don 02.08.29	0fM

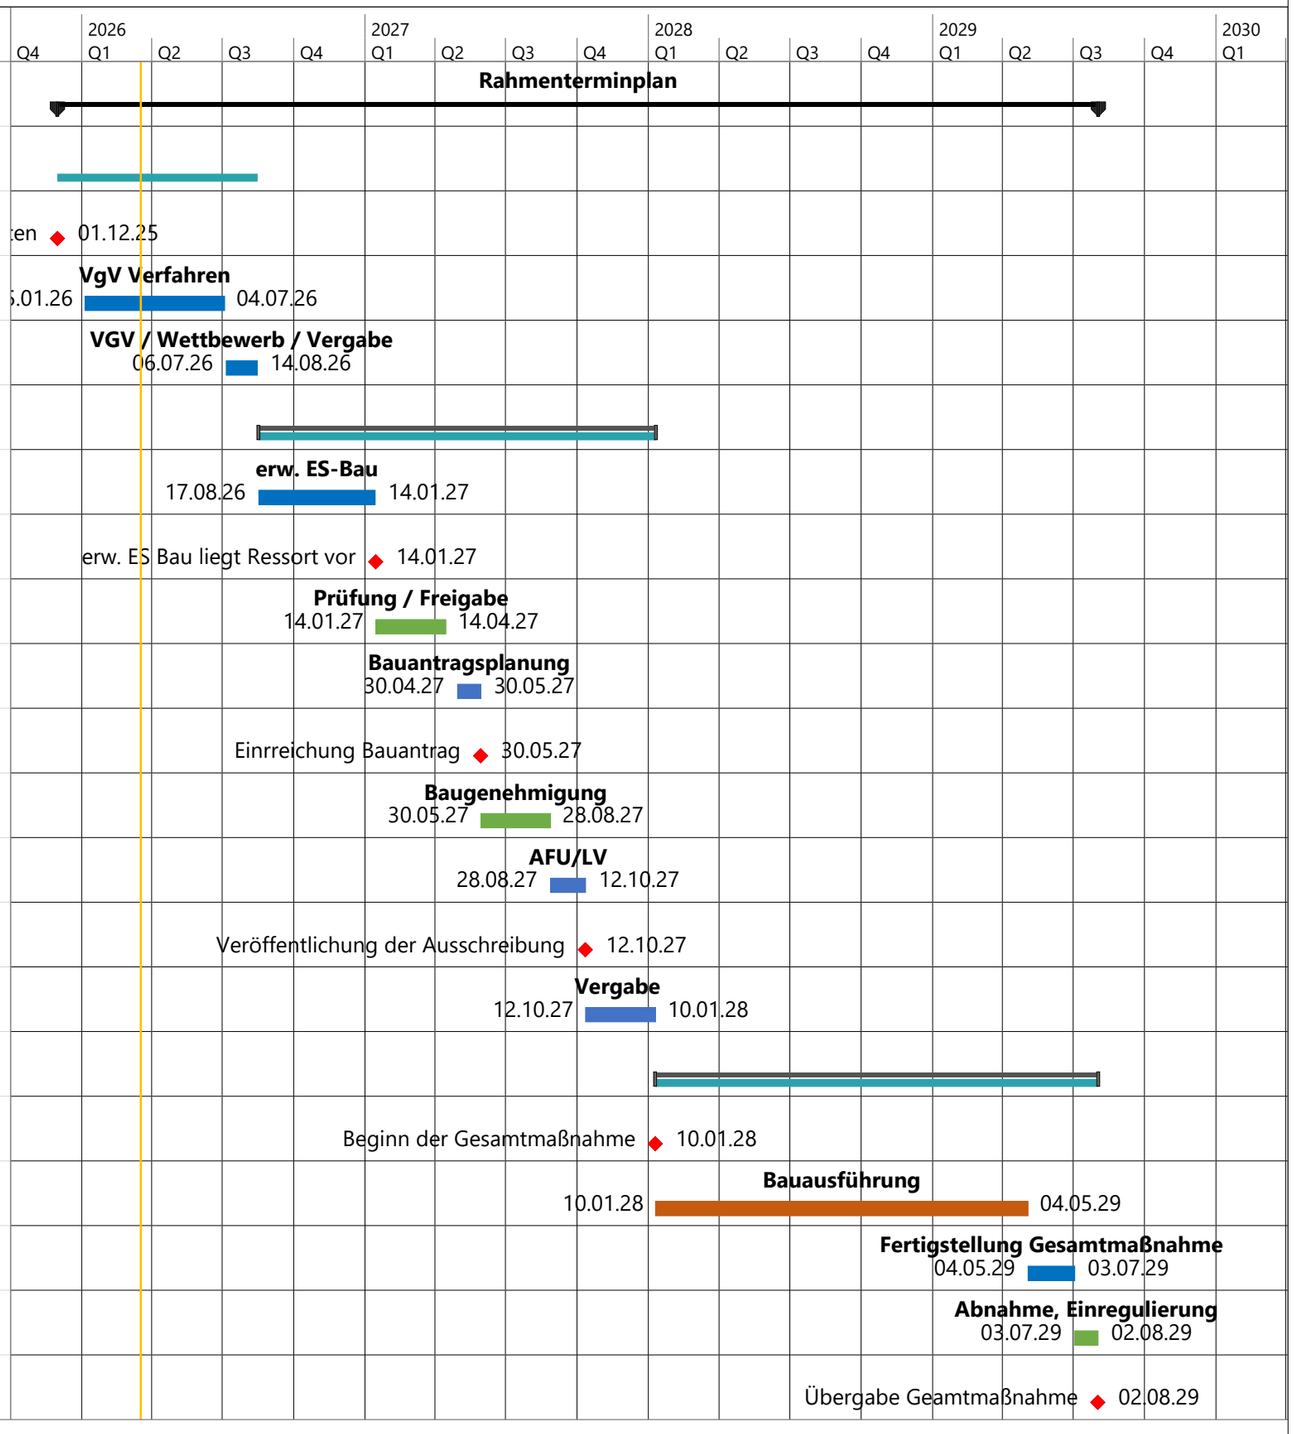

Aufgestellt: Holger Franz, Azin Karamati m 18.03.2026
