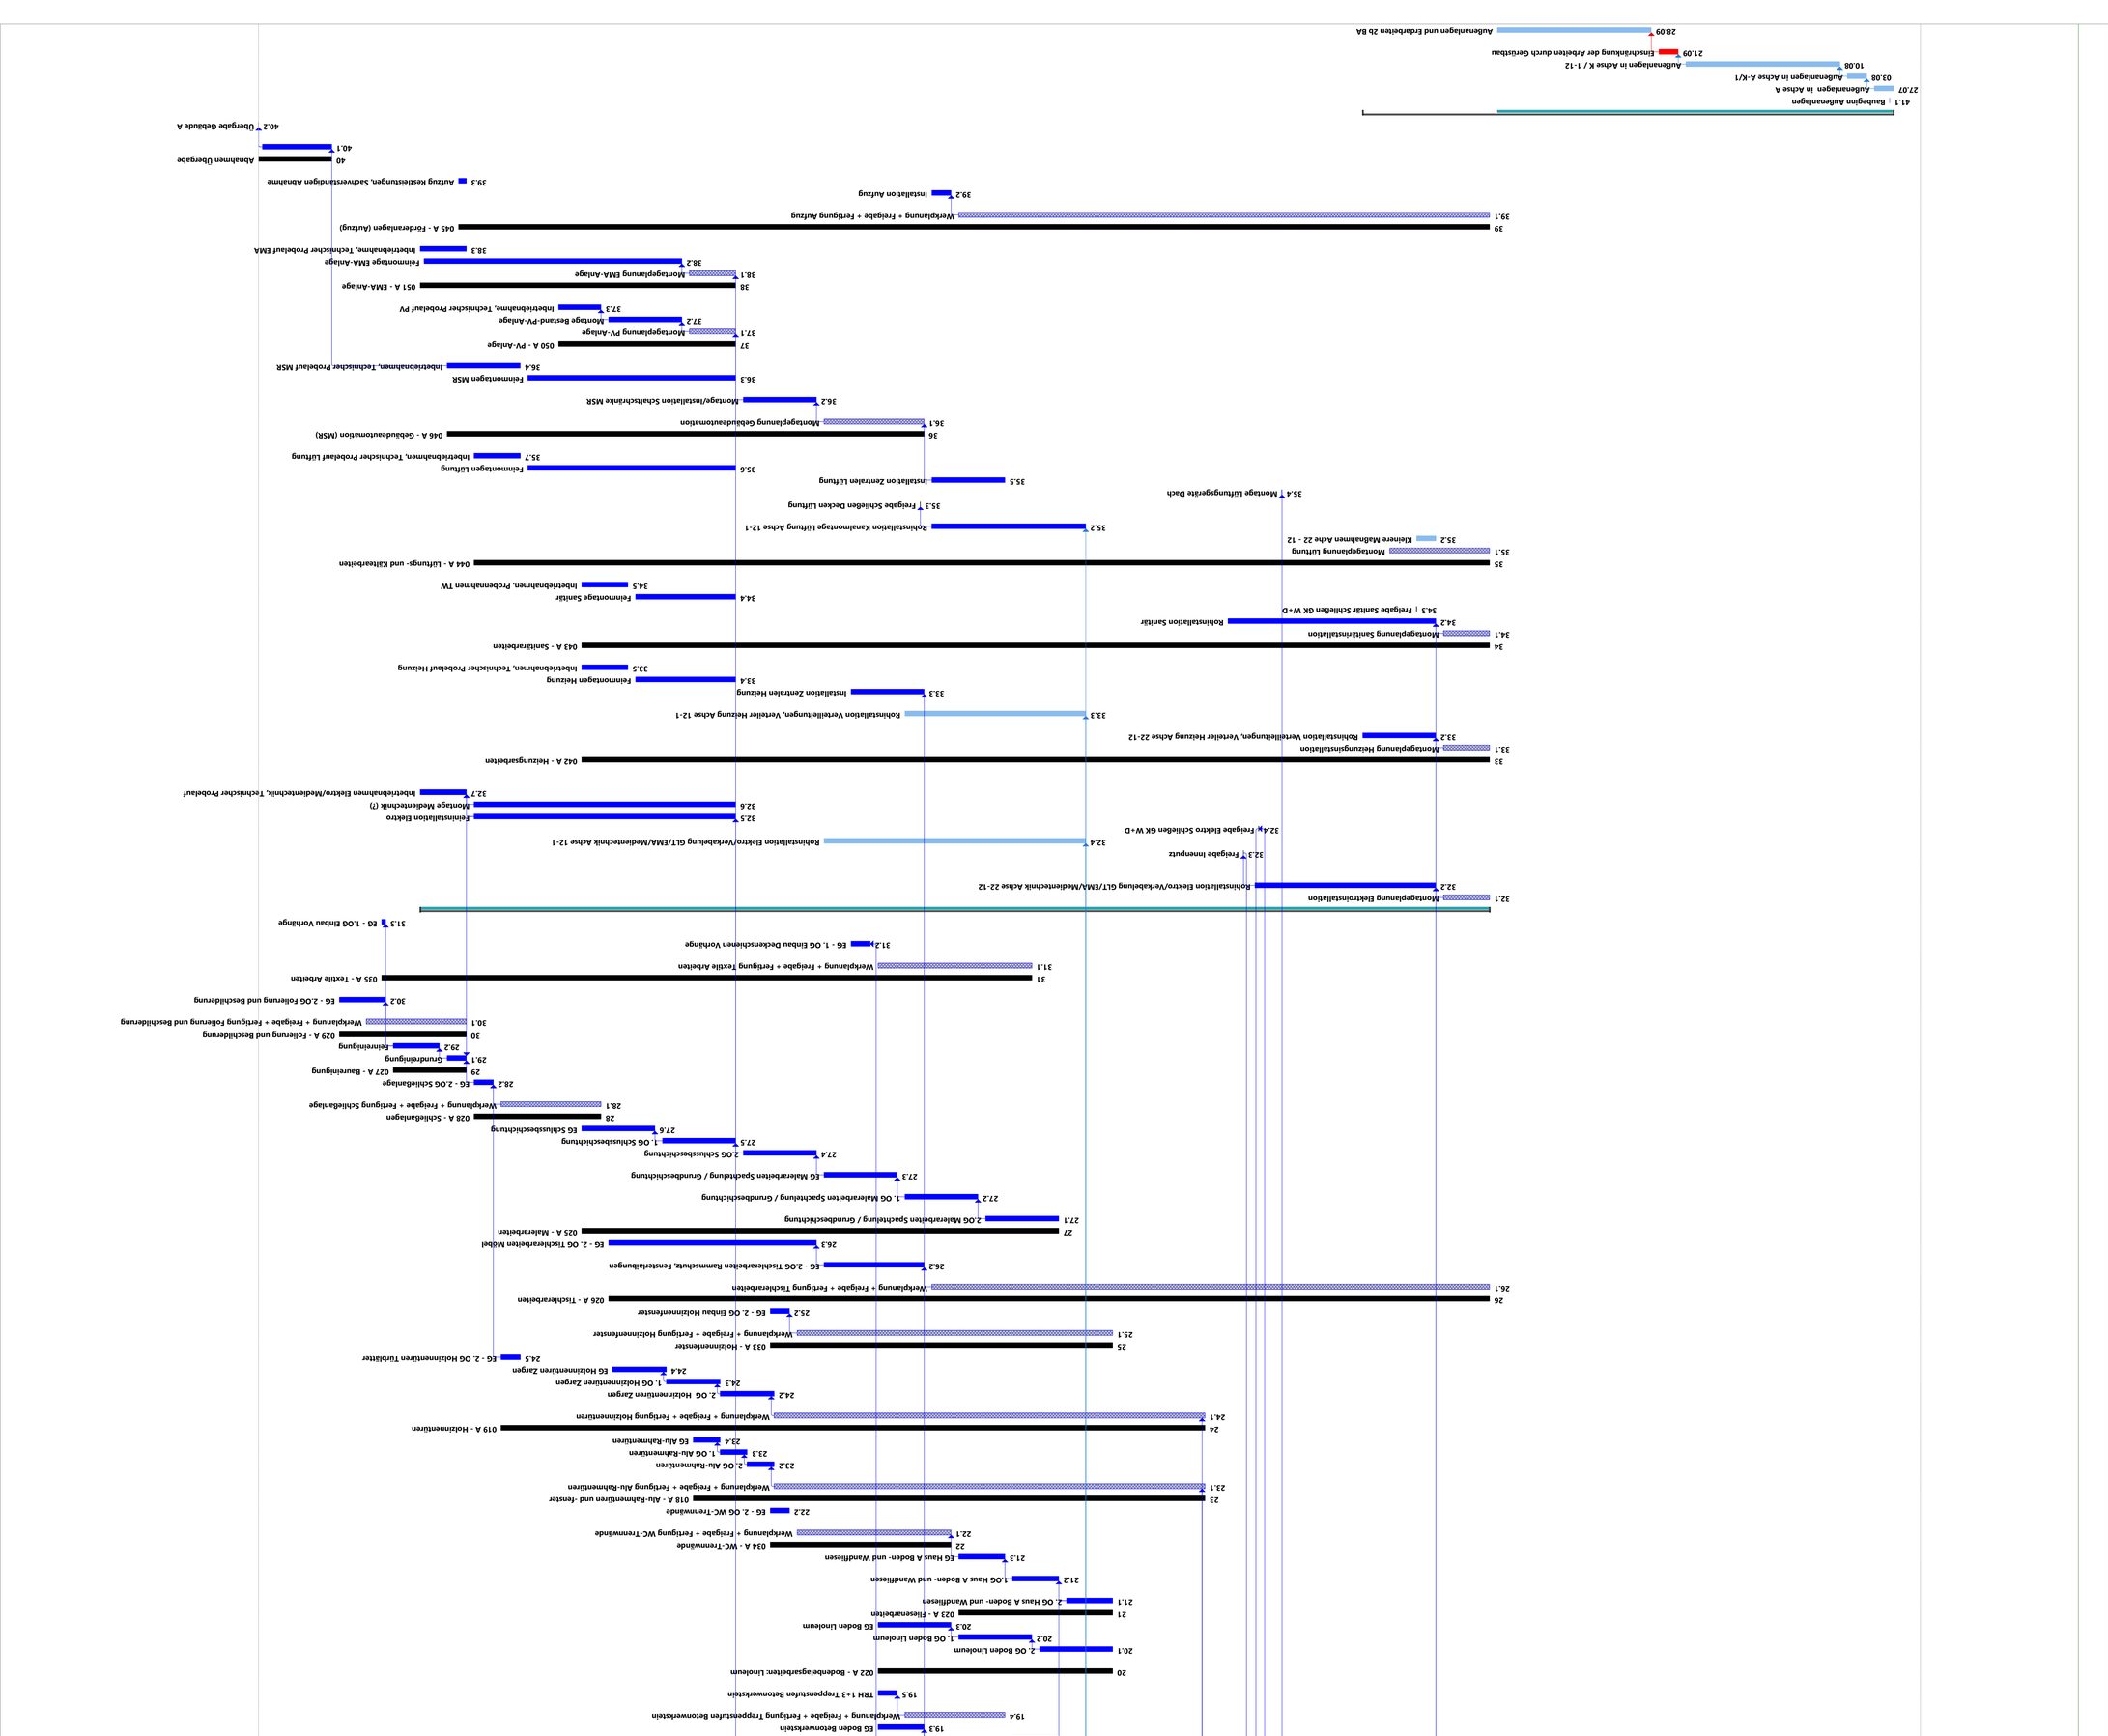
Jun
Jul
3. Qtr. 2026
Aug
Sep
4. Qtr. 2026
Okt
Nov
Dez
1. Qtr. 2027
Jan
Feb
Mär
2. Qtr. 2027
Apr
Mai
Jun
3. Qtr. 2027
Jul
Aug
Sep
4. Qtr. 2027
Okt
Nov
Schulferien NRW
Feiertagen TGA durch GA
Feiertage EE
Abbau PV-Anlage Bestand
Demontage EEE
Schalterein NRW
Feiertagen TGA durch GA
Feiertage EE
Abbau PV-Anlage Bestand
Demontage EEE
003 - Schadstoffsanierung Haus A
Baustelleneinrichtung Schadstoffe - Schwarz Wäß Bereiche
Abschottung der Sanierungsbereiche Achse 12 im Gebäude
Schadstoffsanierung + leichter Abbruch innen (Achse 22-12)
Schadstoffsanierung + leichter Abbruch innen (Achse 12-1)
Schadstoffsanierung Abbruch Kalzipaldekkonstruktion
Schadstoffsanierung Abbruch Fenster nach Abschnitt
Schadstoffsanierung Abbruch Dachabdichtung + Dämmung Dach über 2.OG
Schadstoffsanierung Abbruch Dachabdichtung + Dämmung Dach über 1.OG
Baustelleinrichtung
Montage Attikaabdeckung Haus A
Aufmaß Attikaabdeckung
Werkplanung + Freigabe + Fertigung Attikaabdeckung
Montage Attikaabdeckung Haus A
Aufbau Kran
Aufbau Gerüst Achse 1/K-H ... 1.3H umlaufend
Aufbau Gerüst Achse K1-12 EG
Aufbau Gerüst Achse H-1/3 und 1/3-12
Schutzgerüst Achse H-1/3 und 1/3-12
Demontage Gerüst auf Dach über 1.OG
Montage Gerüst auf Dach über 1.OG Achse H-1/3 und 1/3-12
Montage Gerüst Achse 1/K-H ... 1.3H umlaufend
Werkplanung + Freigabe + Fertigung Tischlerarbeiten
Montage/Installation Schalschränke MSR
Montage/Installation Kameraschutz, Fensteraufbauten
Montage/Installation Gebäudeautomation
Montage/Installation Kameraschutz Achse 12-1
Montage/Installation Zentralen Lüftung
Montage/Installation Lüftungsgeräte Dach
Montage Lüftungsgeräte Dach
Montage/Installation Schalschränke MSR
