Datei: 25-12-01_Neubau FWH Rielasingen - Worblingen.PPL

Projektnummer:

Rahmenterminplan Index III

Neubau FWH Rielasingen - Worblingen

Stand 02.12.2025

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Vergaverfahren Ausschreibung Fachplaner	60at	Mo, 05.01.26	Mo, 30.03.26
2	Beauftragung Fachplaner BH	1at	Mi, 01.04.26	Mi, 01.04.26
3	**LPH 1-4**	250at	Di, 07.04.26	Fr, 02.04.27
3.1	LPH 1	30at	Di, 07.04.26	Mi, 20.05.26
3.2	**LPH 2**	85at	Mi, 06.05.26	Fr, 04.09.26
4	Vorstellung Kostenschätzung	1at	Di, 08.09.26	Di, 08.09.26
5	**Freigabe Kostenschätzung durch BH**	1at	Di, 15.09.26	Di, 15.09.26
3.3	**LPH 3**	87at	Fr, 18.09.26	Do, 21.01.27
6	Vorstellung Entwurf	1at	Mi, 27.01.27	Mi, 27.01.27
7	**Freigabe Entwurf**	1at	Mi, 03.02.27	Mi, 03.02.27
3.4	**LPH 4**	35at	Do, 11.02.27	Fr, 02.04.27
8	Unterlagen Prüfen/Freigeben BH	5at	Do, 25.03.27	Fr, 02.04.27
9	Tekturunterlagen einreichen	1at	Mo, 05.04.27	Mo, 05.04.27
10	Tekturverfahren	60at	Mo, 05.04.27	Mi, 30.06.27
11	**Ausführungsplanung LPH 5**	450at	Fr, 02.04.27	Fr, 12.01.29
12	**Ausschreibung Vergabe LPH 6+7 (Paket Hülle dicht)**	398kt	Do, 04.11.27	Di, 05.12.28
13	**Bauablauf**	686kt	Fr, 05.05.28	Do, 21.03.30

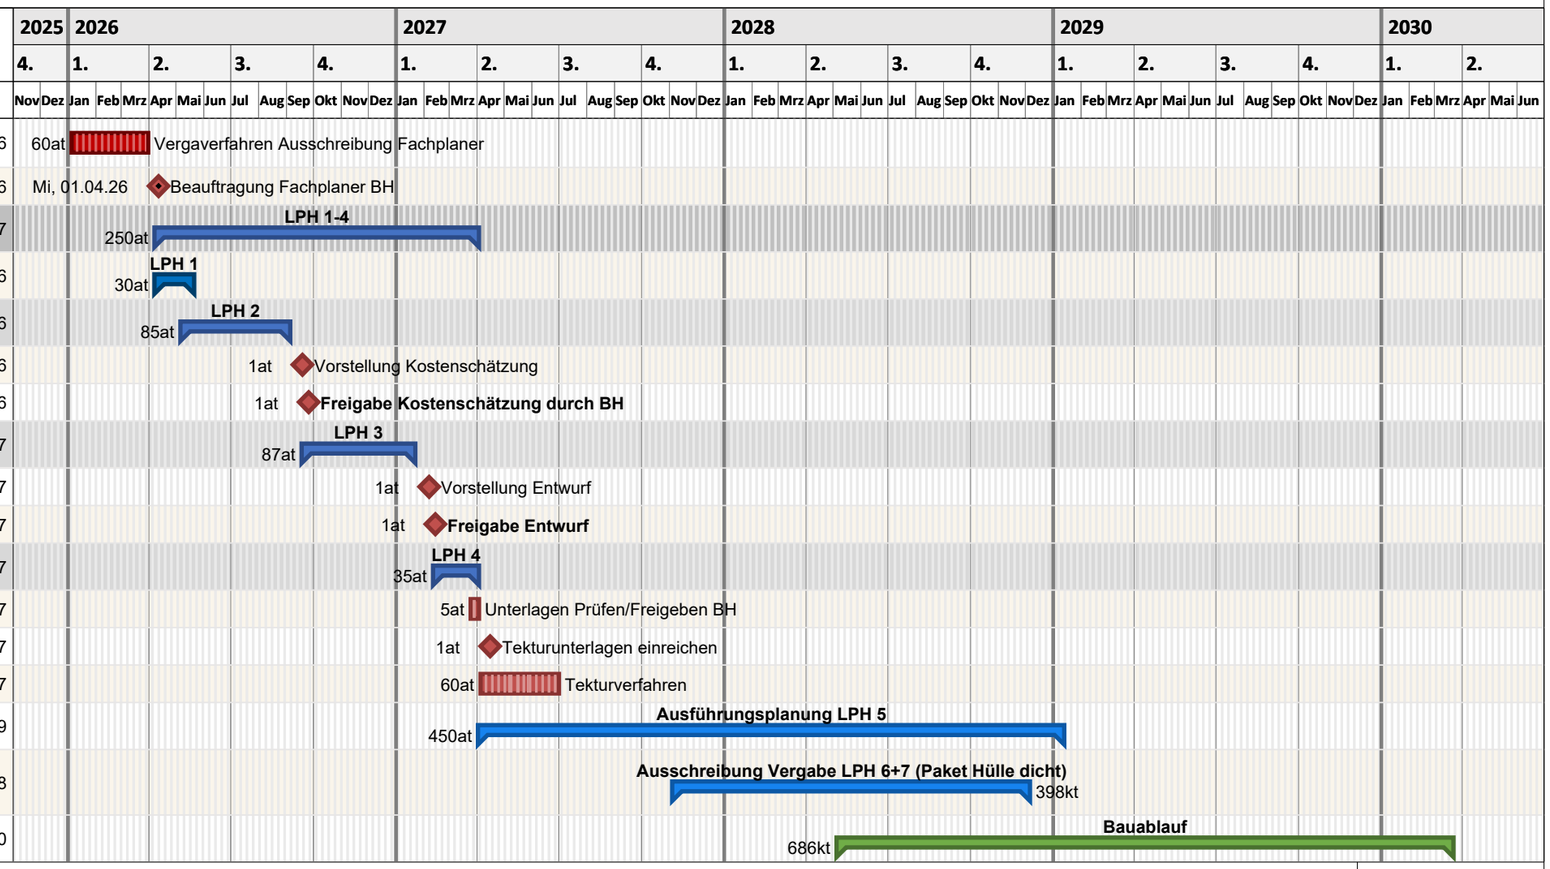

Projektzeitrahmen von Di, 01.10.24 bis Di, 31.12.30
Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
Druckdatum: 02.12.2025 11:00
Filter:
Bearbeiter: pel

Bahnhofstr. 13
Abensberg
Tel. +49 9443 9210
e-Mail: info@kplan.de

erstellt mit pro-Plan 2024 (24.0.0.6) Serien-Nr.: PPL24-5D91A8EE5284 Lizenz für kplan AG, Abensberg
