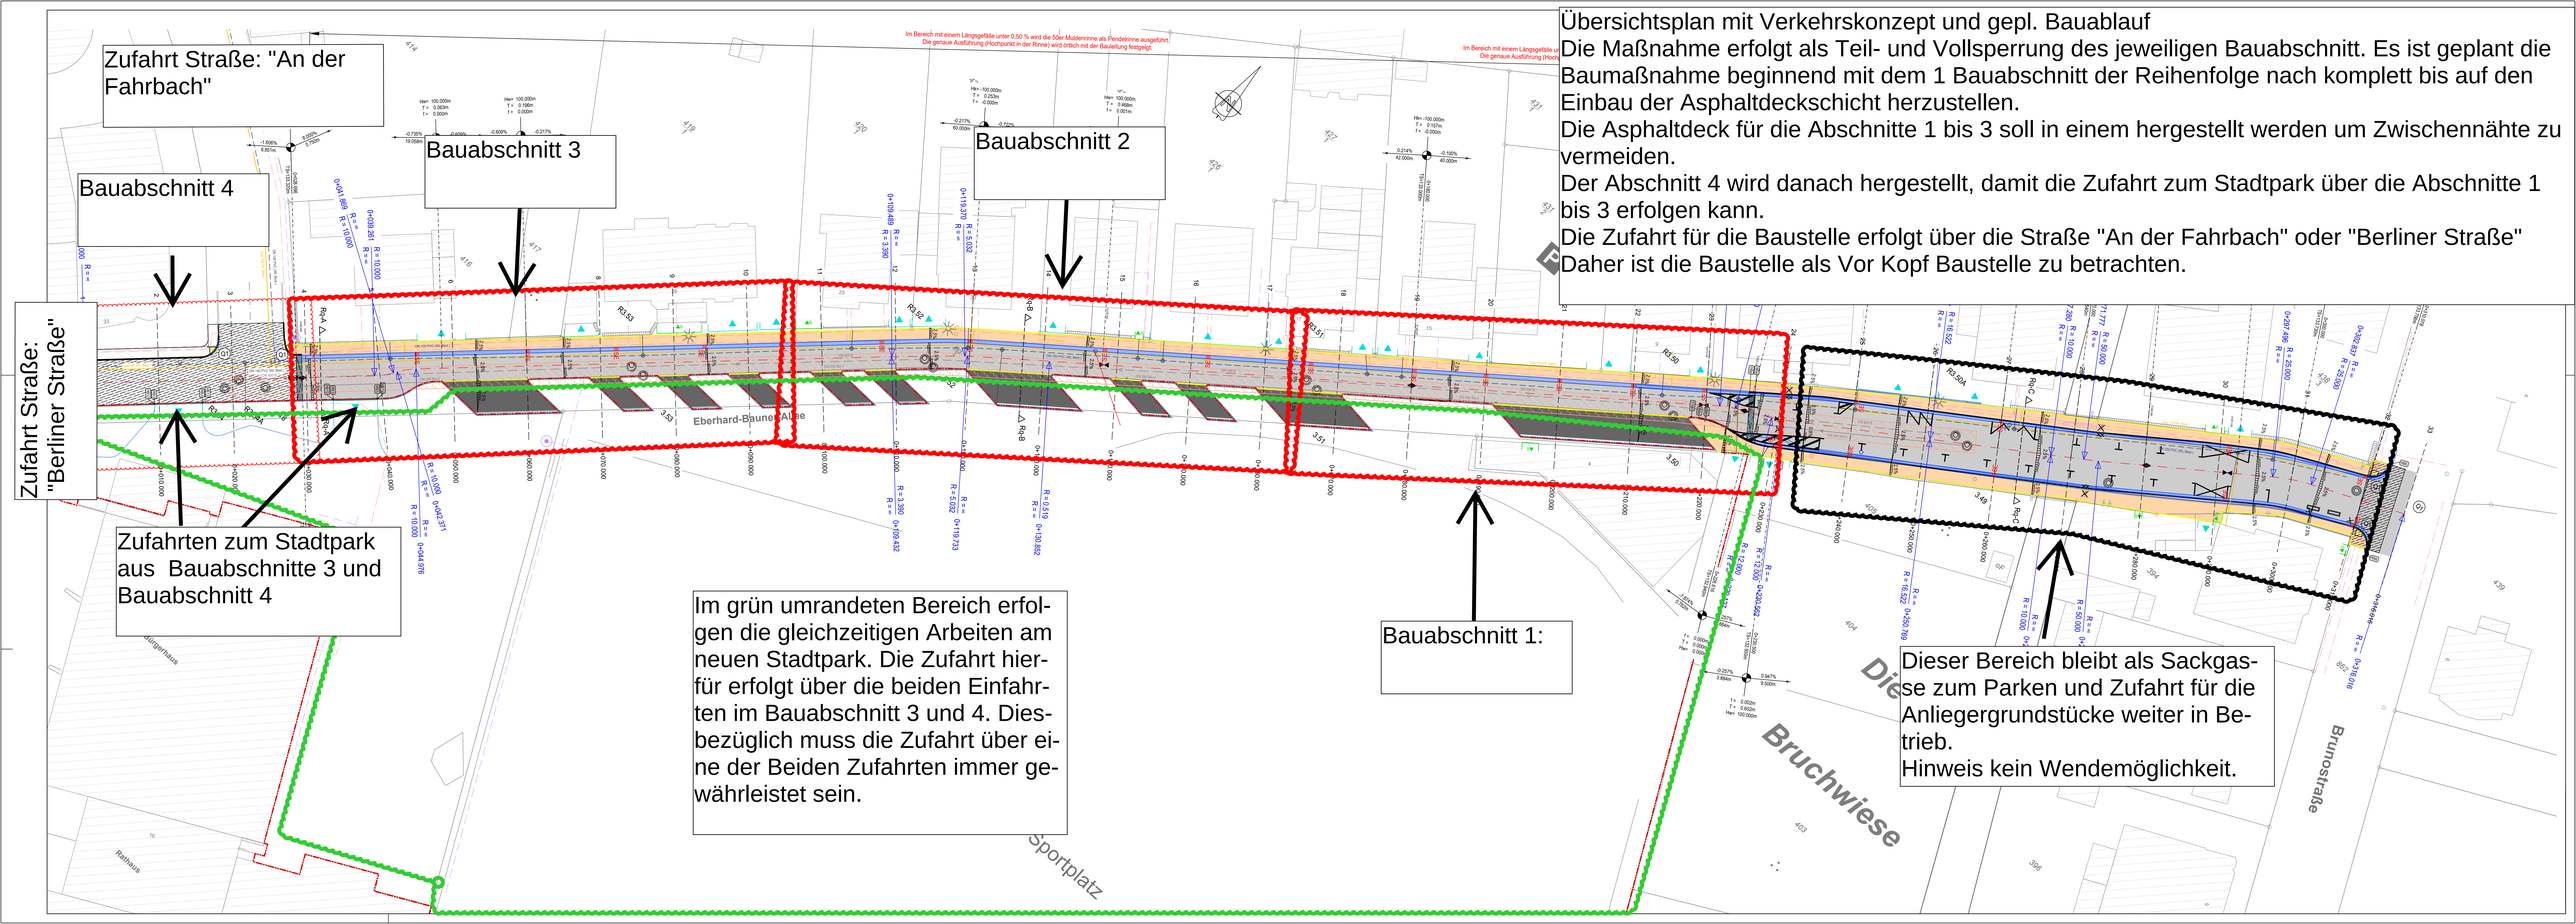
Übersichtsplan mit Verkehrskonzept und gepl. Bauablauf
Die Maßnahme erfolgt als Teil- und Vollsperrung des jeweiligen Bauabschnitt. Es ist geplant die Baumaßnahme beginnend mit dem 1 Bauabschnitt der Reihenfolge nach komplett bis auf den Einbau der Asphaltdeckschicht herzustellen.
Die Asphaltdeck für die Abschnitte 1 bis 3 soll in einem hergestellt werden um Zwischennähte zu vermeiden.
Der Abschnitt 4 wird danach hergestellt, damit die Zufahrt zum Stadtpark über die Abschnitte 1 bis 3 erfolgen kann.
Die Zufahrt für die Baustelle erfolgt über die Straße "An der Fahrbach" oder "Berliner Straße"
Daher ist die Baustelle als Vor Kopf Baustelle zu betrachten.
Zufahrt Straße: "An der Fahrbach"
Bauabschnitt 4
Bauabschnitt 3
Bauabschnitt 2
Zufahrt Straße: "Berliner Straße"
Zufahrten zum Stadtpark aus Bauabschnitte 3 und Bauabschnitt 4
Im grün umrandeten Bereich erfolgen die gleichzeitigen Arbeiten am neuen Stadtpark. Die Zufahrt hierfür erfolgt über die beiden Einfahrten im Bauabschnitt 3 und 4. Diesbezüglich muss die Zufahrt über eine der Beiden Zufahrten immer gewährleistet sein.
Bauabschnitt 1:
Dieser Bereich bleibt als Sackgasse zum Parken und Zufahrt für die Anliegergrundstücke weiter in Betrieb.
Hinweis kein Wendemöglichkeit.
Eberhard-Bauer-Allee
Bruchwiese
Brunostraße
Sportplatz
Rathaus
