Asklepios Klinik Seligenstadt
Bauzeitenplan Erweiterung NFR

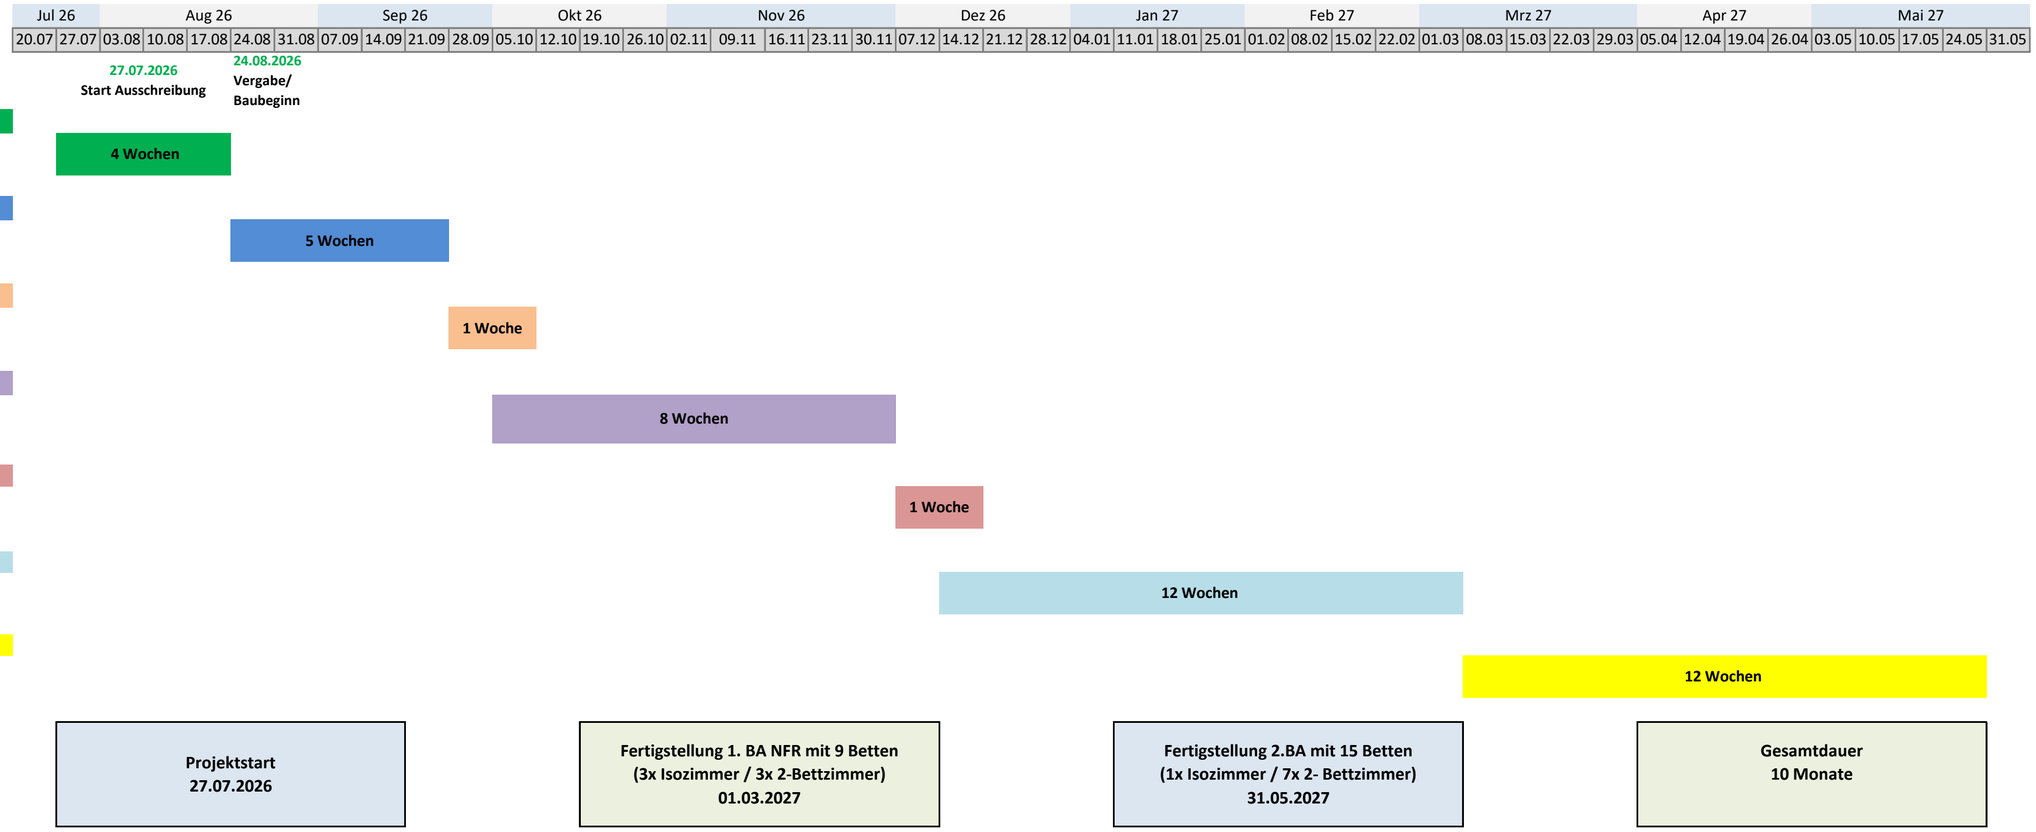

Auschreibung
Start: 17.08.2026
Ende: 14.09.2026

Umbau Büros
Start: 24.08.2026
Dauer: ca. 5 Wochen

Umzug GF
Start: 28.09.2026
Dauer: 1 Woche

Umbau Schule
Start: ca. 05.10.2026
Dauer: 8 Wochen

Umzug Schule
Start: 04.01.2027
Dauer: 1 Woche

Umbau NFR / Bauabschnitt 1
Start: 07.12.2026
Dauer 12 Wochen

Umbau NFR / 2 Bauabschnitt
Start: 08.03.2027
Dauer 12 Wochen

Projektstart
27.07.2026

Fertigstellung 1. BA NFR mit 9 Betten
(3x Isozimmer / 3x 2-Bettzimmer)
01.03.2027

Fertigstellung 2.BA mit 15 Betten
(1x Isozimmer / 7x 2- Bettzimmer)
31.05.2027

Gesamtdauer
10 Monate
