Erweiterung OBS Süd Delmenhorst

Bauzeitenplan 18.05.2026 Freianlagen
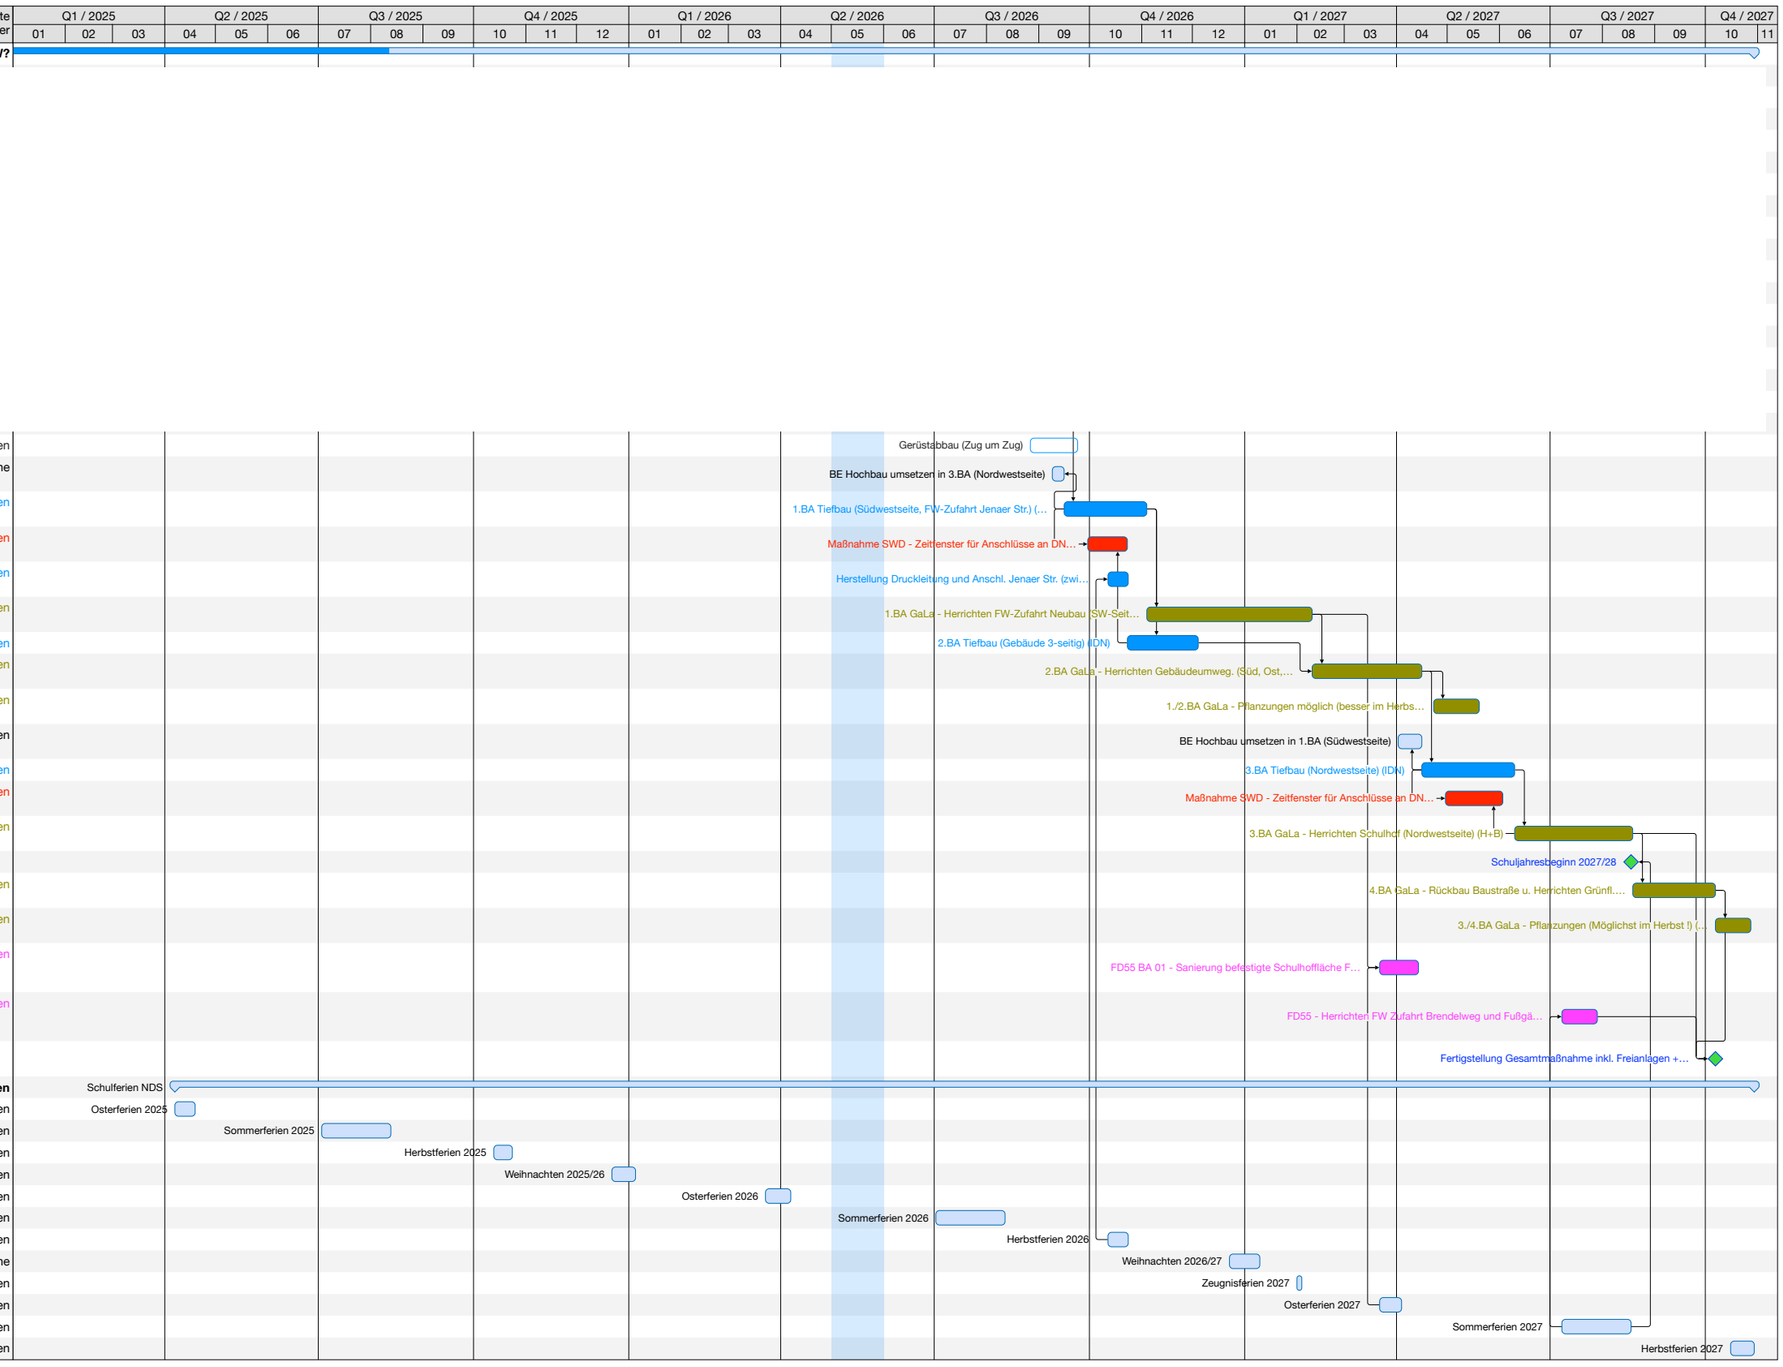
#	Titel	Geplanter Start	Geplantes Ende	Geplante Dauer
0	**ODEL Bauzeitenplan**	**01.04.2024**	**30.10.2027**	**178,8W?**
226	Gerüstabbau (Zug um Zug)	27.08.2026	23.09.2026	4 Wochen
227	BE Hochbau umsetzen in 3.BA (Nordwestseite)	09.09.2026	16.09.2026	1 Woche
228	1.BA Tiefbau (Südwestseite, FW-Zufahrt Jenaer Str.) (IDN)	16.09.2026	03.11.2026	7 Wochen
229	Maßnahme SWD - Zeitfenster für Anschlüsse an DN 800 1.BA (Südseite)	29.09.2026	23.10.2026	3,5 Wochen
230	Herstellung Druckleitung und Anschl. Jenaer Str. (zwingend in den Ferien)	12.10.2026	23.10.2026	2 Wochen
231	1.BA GaLa - Herrichten FW-Zufahrt Neubau (SW-Seite, FW-Zufahrt) (H+B)	04.11.2026	09.02.2027	12 Wochen
234	2.BA Tiefbau (Gebäude 3-seitig) (IDN)	23.10.2026	04.12.2026	6 Wochen
235	2.BA GaLa - Herrichten Gebäudeumweg. (Süd, Ost, Nord) (H+B)	10.02.2027	15.04.2027	9 Wochen
236	1./2.BA GaLa - Pflanzungen möglich (besser im Herbst !) (H+B)	23.04.2027	19.05.2027	3 Wochen
237	BE Hochbau umsetzen in 1.BA (Südwestseite)	02.04.2027	16.04.2027	2 Wochen
238	3.BA Tiefbau (Nordwestseite) (IDN)	16.04.2027	09.06.2027	7 Wochen
239	Maßnahme SWD - Zeitfenster für Anschlüsse an DN 800 3.BA (Westseite)	29.04.2027	03.06.2027	4 Wochen
240	3.BA GaLa - Herrichten Schulhof (Nordwestseite) (H+B)	10.06.2027	18.08.2027	10 Wochen
241	**Schuljahresbeginn 2027/28**	**18.08.2027**	**18.08.2027**	
242	4.BA GaLa - Rückbau Baustraße u. Herrichten Grünfl. (Nordwestseite) (H+B)	19.08.2027	06.10.2027	7 Wochen
243	3./4.BA GaLa - Pflanzungen (Möglichst im Herbst !) (H+B)	07.10.2027	27.10.2027	3 Wochen
245	FD55 BA 01 - Sanierung befestigte Schulhoffläche FW-Zufahrt Neu In Ferien umzusetzen !	22.03.2027	13.04.2027	3 Wochen
246	FD55 - Herrichten FW Zufahrt Brendelweg und Fußgängerverlängerung) In Ferien umzusetzen !	08.07.2027	28.07.2027	3 Wochen
247	**Fertigstellung Gesamtmaßnahme inkl. Freianlagen + Maßnahmen FD 55 !**	**06.10.2027**	**06.10.2027**	
248	**Schulferien NDS**	**07.04.2025**	**30.10.2027**	**125,8 Wochen**
249	Osterferien 2025	07.04.2025	19.04.2025	1,8 Wochen
250	Sommerferien 2025	03.07.2025	13.08.2025	5,8 Wochen
251	Herbstferien 2025	13.10.2025	24.10.2025	1,8 Wochen
252	Weihnachten 2025/26	22.12.2025	05.01.2026	0 Wochen
253	Osterferien 2026	23.03.2026	07.04.2026	1,8 Wochen
254	Sommerferien 2026	02.07.2026	12.08.2026	5,8 Wochen
255	Herbstferien 2026	12.10.2026	24.10.2026	2 Wochen
256	Weihnachten 2026/27	23.12.2026	09.01.2027	1 Woche
257	Zeugnisferien 2027	01.02.2027	03.02.2027	0,4 Wochen
258	Osterferien 2027	22.03.2027	03.04.2027	1,6 Wochen
259	Sommerferien 2027	08.07.2027	18.08.2027	5,8 Wochen
260	Herbstferien 2027	16.10.2027	30.10.2027	2 Wochen
