Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**AMO - DigiHub**	**880t**	**Mit 08.07.26**	**Don 27.12.29**
2	**-Vergabeverfahren**	**135t**	**Mit 08.07.26**	**Don 14.01.27**
3	**Los 1**	**135t**	**Mit 08.07.26**	**Don 14.01.27**
28	**Planung + Bau**	**745t**	**Fre 15.01.27**	**Don 27.12.29**
29	Grundlagenermittlung und Vorentwurfsplanung LPH 1+2 (3 Monate)	60t	Fre 15.01.27	Fre 09.04.27
30	Freigabe Vorentwurf mit Kostenschätzung seitens AMO	15t	Mon 12.04.27	Fre 30.04.27
31	Beantragung Fördergelder "Bau" auf Basis der Kostenschätzung	0t	Fre 30.04.27	Fre 30.04.27
32	Entwurfsplanung LPH3 (ca. 5,5 Monate)	110t	Mon 03.05.27	Die 05.10.27
33	Freigabe Entwurf mit Kostenberechnung seitens AMO	15t	Mit 06.10.27	Die 26.10.27
34	Erstellung Genehmigungsplanung (LPH 4) und Zusammenstellung der Unterlagen	15t	Mit 27.10.27	Mit 17.11.27
35	Einreichung Bauantrag	0t	Mit 17.11.27	Mit 17.11.27
36	Genehmigung (ca. 6 Monate)	120t	Don 18.11.27	Mon 08.05.28
37	Ausführungsplanung LPH5 (ca. 9 Monate)	180t	Don 18.11.27	Don 03.08.28
38	Ausschreibung LPH6 (ca. 9 Monate)	180t	Don 10.02.28	Fre 27.10.28
39	Zuwendungsbescheid "Bau" (Voraussetzung für Vergabe)	0t	Mon 24.04.28	Mon 24.04.28
40	Vergabe LPH7 (ca. 8 Monate)	160t	Don 23.03.28	Mon 13.11.28
41	Vergabe H1 z.B. Erd- und Verbauarbeiten (ca. 3 Monate)	60t	Don 23.03.28	Don 22.06.28
42	Vorbereitende Maßnahmen (Rodung, Strom + Wasser)	30t	Fre 23.06.28	Don 03.08.28
43	Bauzeit BA1 (14 Monate) - Reinraum + Labore	280t	Fre 04.08.28	Fre 14.09.29
44	Inbetriebnahme BA1 - Reinraum + Labore	60t	Mon 17.09.29	Die 11.12.29
45	Bauzeit BA2 (13 Monate)	260t	Die 28.11.28	Die 11.12.29
46	Restpunkte und Übergabe an Bauherr / Nutzer	10t	Mit 12.12.29	Don 27.12.29

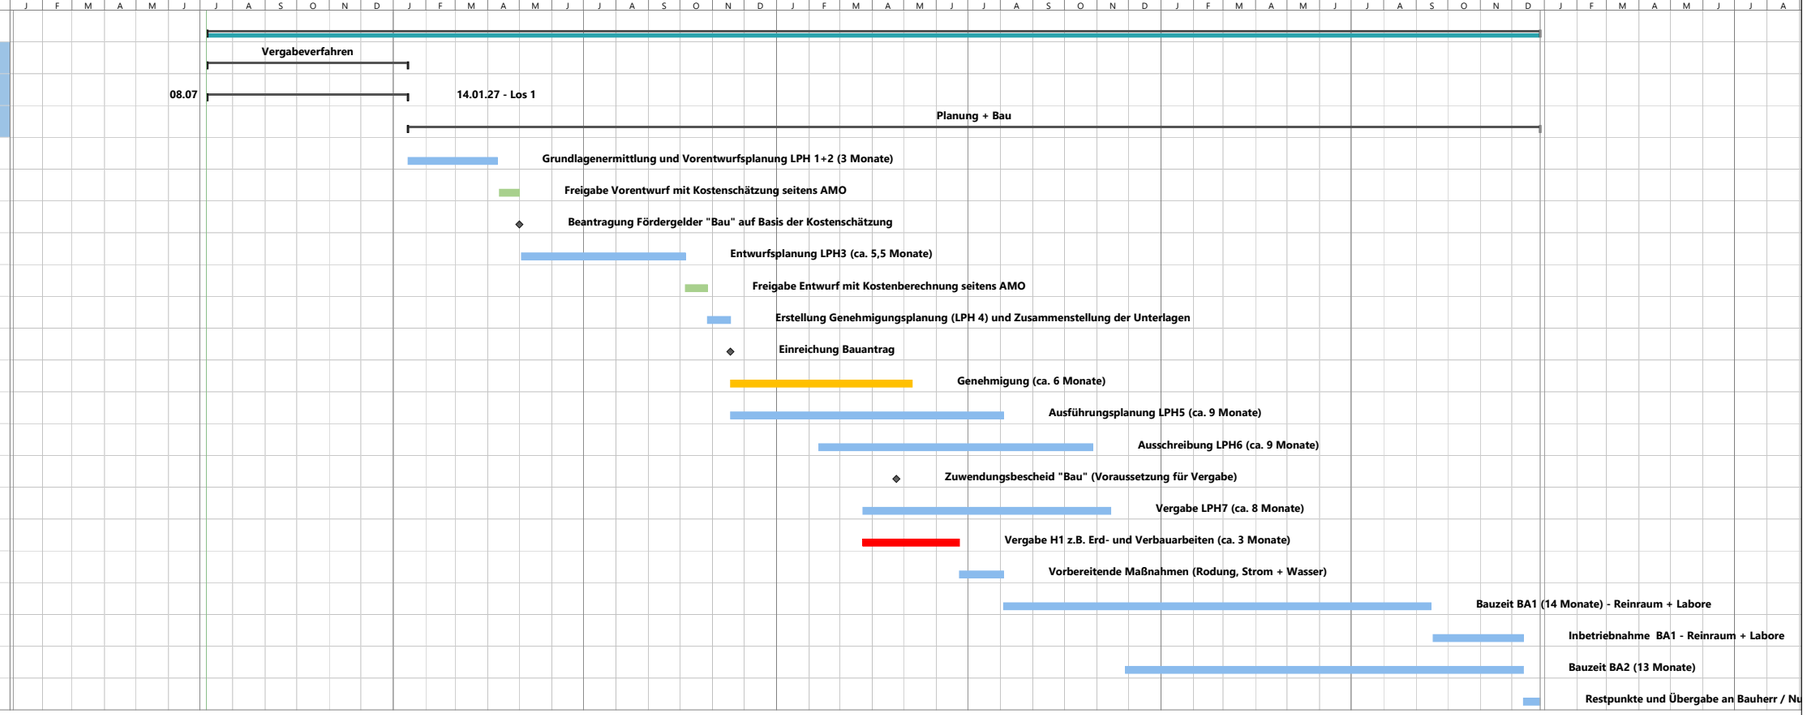

Projekt: DigiHub - Rahmenterm
Datum: Die 07.07.26

Vorgang, Unterbrechung, Meilenstein, Sammelvorgang, Projektsammelvorgang, Inaktiver Vorgang, Inaktiver Meilenstein, Inaktiver Sammelvorgang, Manueller Vorgang, Nur Dauer, Manueller Sammelrollup, Manueller Sammelvorgang, Nur Anfang, Nur Ende, Externe Vorgänge, Externer Meilenstein, Stichtag, In Arbeit, Manueller Fortschritt
