Kreis Segeberg | Der Landrat
Hamburger Straße 30
23795 Bad Segeberg

Rahmenterminplan 7 Containerklassen am FöZ Norderstedt

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende
0	**Erweiterung FöZ Norderstedt um 7 Containerklassen**	**Mon 12.01.26**	**Mon 10.05.27**
1	1 Erweiterung FöZ Norderstedt um 7 Klassencontainer	Don 15.01.26	Don 25.06.26
2	2 Genehmigung NA-Haushalt	Fre 26.06.26	Fre 28.08.26
3	**3 Konzeption**	Mon 12.01.26	Fre 09.10.26
4	3.1 Rahmenplanung	Mon 12.01.26	Mit 25.02.26
5	3.2 Beschluss	Don 26.02.26	Fre 13.03.26
6	3.3 Baufeld herrichten	Mon 16.03.26	Fre 09.10.26
7	**4 Ausschreibung**	Mon 31.08.26	Fre 09.10.26
8	4.1 Ausschreibung	Mon 31.08.26	Fre 09.10.26
9	**5 Realisierung**	Mon 12.10.26	Fre 09.04.27
10	5.1 LP 1 - 8	Mon 12.10.26	Fre 09.04.27
11	5.2 vorh.-bzg. Bauartgenehmigung	Mon 09.11.26	Fre 09.04.27
12	5.3 Herrichten	Mon 09.11.26	Fre 04.12.26
13	5.4 Vorfertigung (Werk)	Mon 09.11.26	Fre 05.02.27
14	5.5 Montage u. Ausbau inkl. TGA	Mon 08.02.27	Fre 30.04.27
15	5.6 Aussenanlagen	Don 04.03.27	Mon 03.05.27
16	**6 Übergabe**	Mon 12.04.27	Mon 10.05.27
17	6.1 Abnahme	Mon 26.04.27	Fre 30.04.27
18	6.2 Inbetriebnahme	Mon 12.04.27	Fre 07.05.27
19	6.3 Nutzungsaufnahme	Mon 10.05.27	Mon 10.05.27

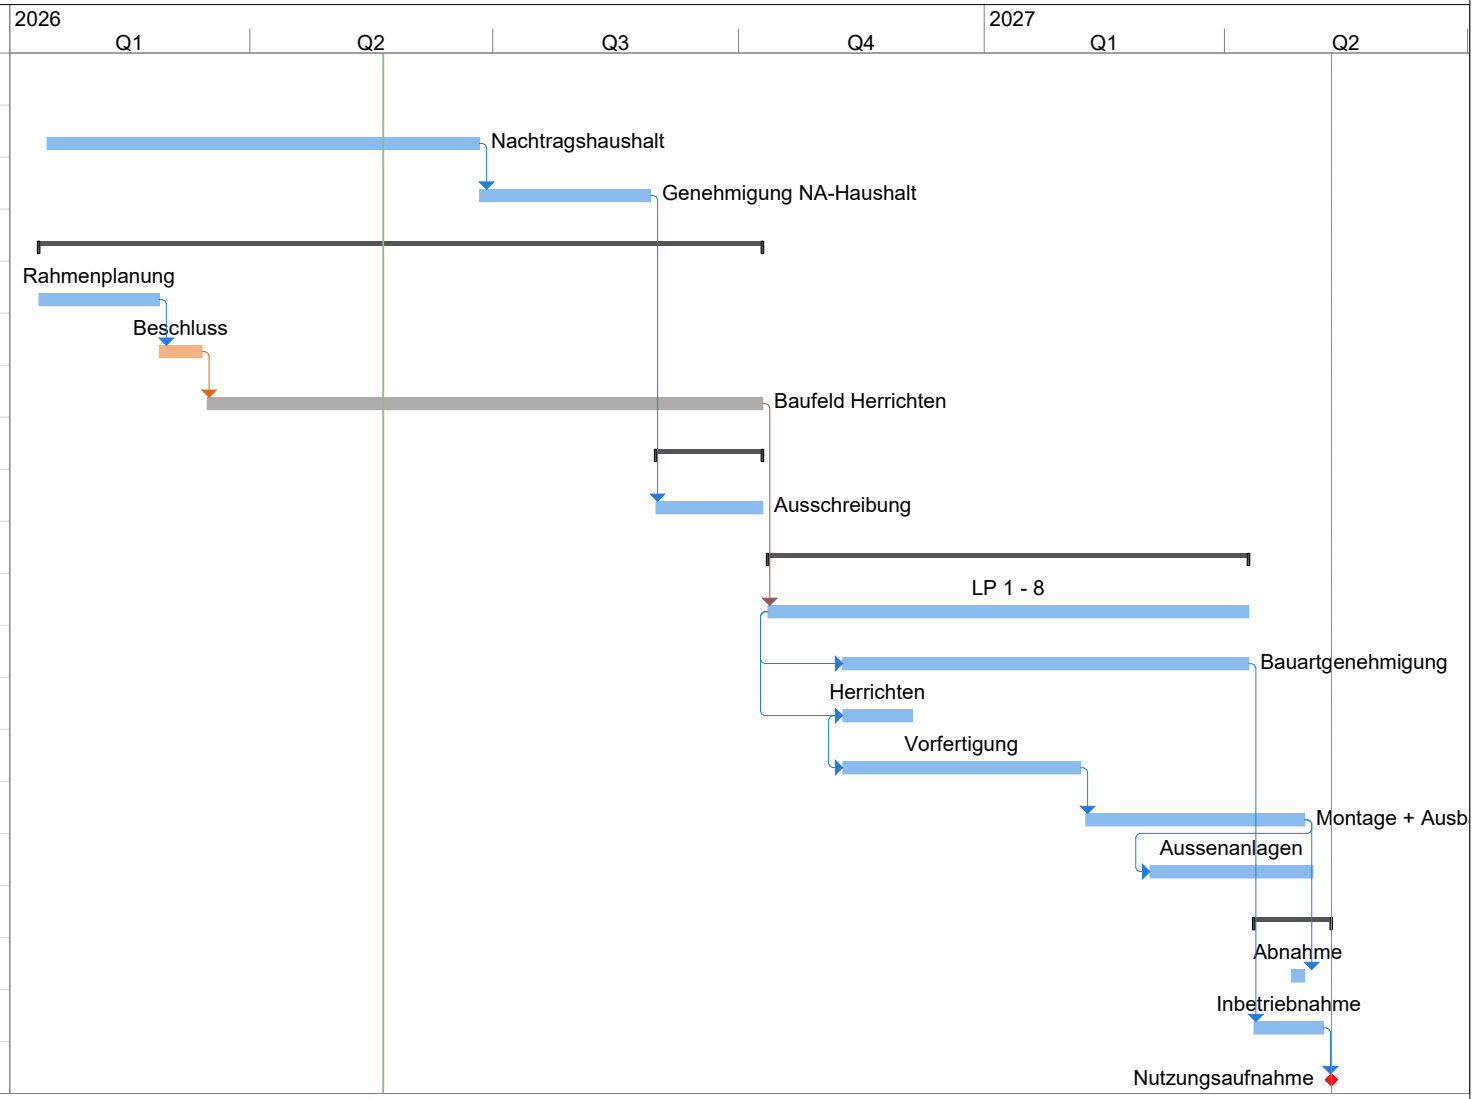

Don 21.05.26
