
Meilensteinplanung Druck: Weg zum Go-Live 01.07.2027

Vorschlag des KBA – Termine indikativ

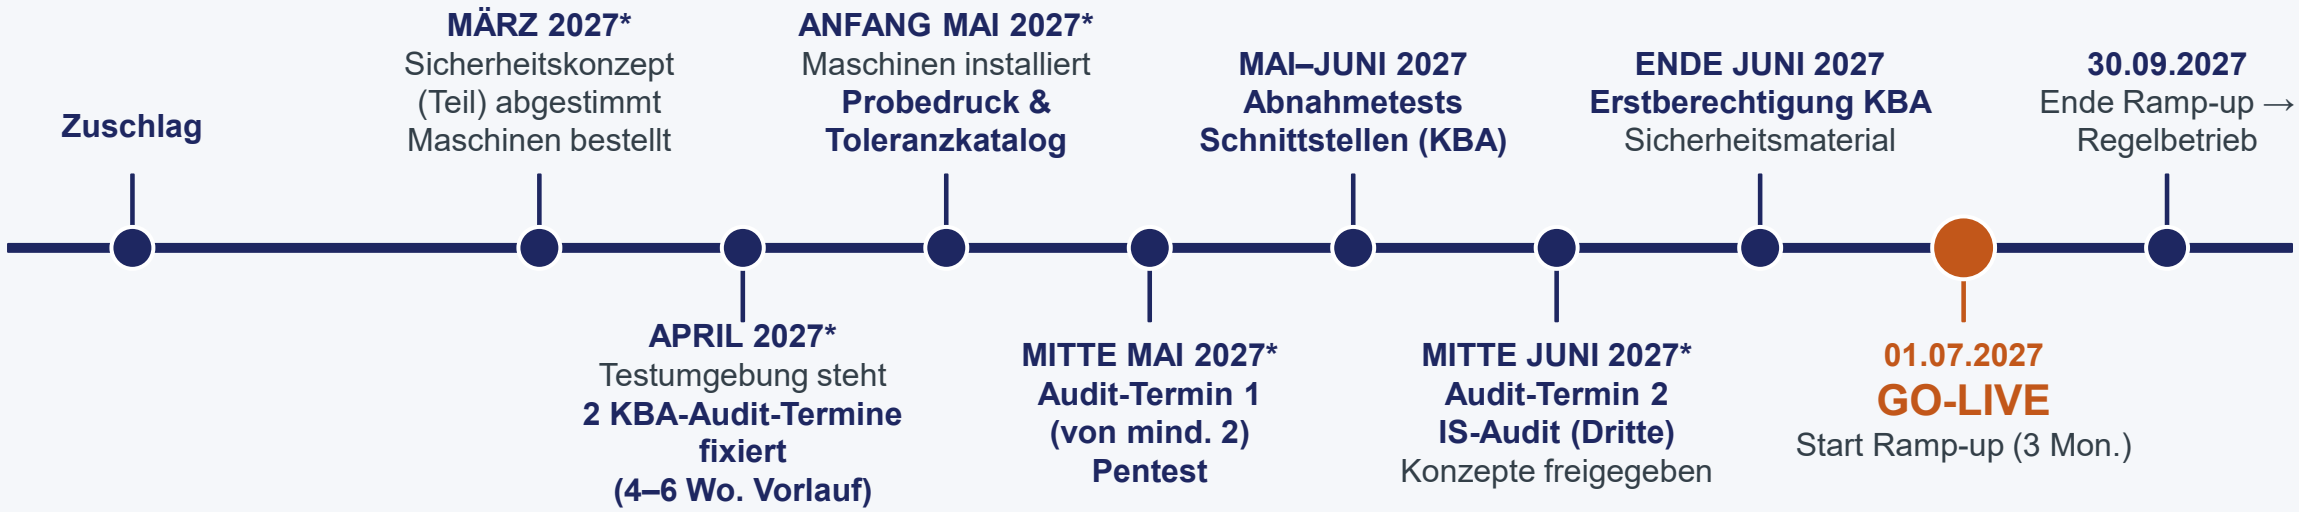

Nach Go-Live

Jährliche KBA-Audits ab ca. Mitte 2028
ISO 27001: bis 07/2029 bzw. 07/2030 (GS++)
Pentest & IS-Audit spätestens alle 3 Jahre
Vertragsende ca. Mitte 2032 (5 Jahre)

Hinweis zur Terminplanung

Die Termine sind ein Vorschlag des KBA. Verbindlich einzuhalten sind die Abstände zwischen den Meilensteinen, z. B.:

- Audit-Termine mit 4–6 Wochen Vorlauf fixieren (von Abteilung 4 des KBA durchgeführt)
- Audit 1 + Pentest ca. 4 Wochen vor Audit 2 / IS-Audit
- Abnahmetests, Freigaben vor Erstberechtigung
