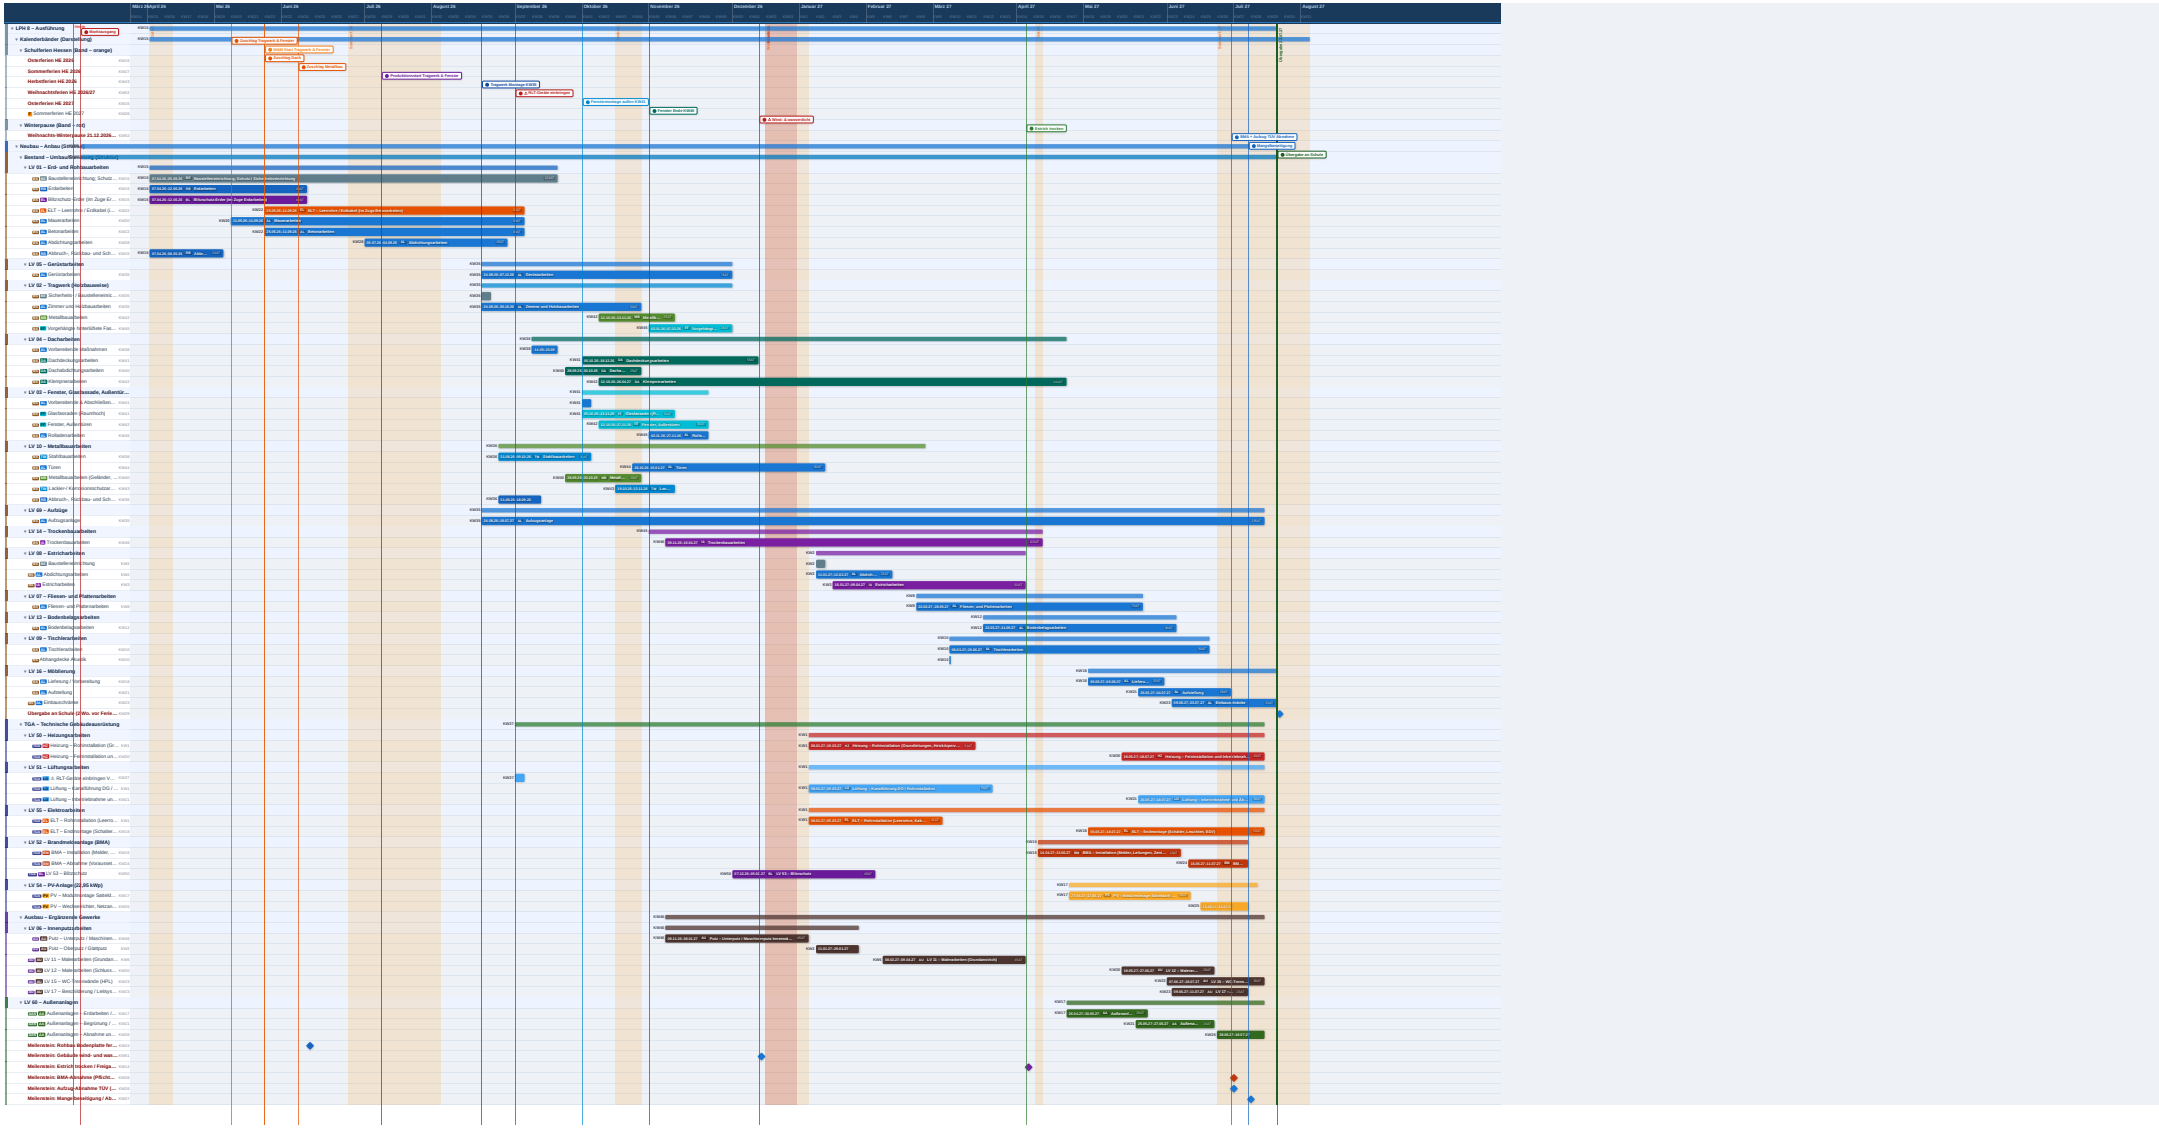
746-04 Hofburgschule Alten-Buseck – Bauzeitenplan LPH 8 Ausführung
Übergabe Schule Fr 23.07.2027
Format: DIN A4 Querformat
LPH 8 – Ausführung
Kalenderbänder (Darstellung)
Schulferien Hessen (Band – orange)
Osterferien HE 2026
Sommerferien HE 2026
Herbstferien HE 2026
Weihnachtsferien HE 2026/27
Osterferien HE 2027
Sommerferien HE 2027
Winterpause (Band – rot)
Weihnachts-Winterpause 23.12.2026 –
Neubau – Anbau (GF/OG)
Bestand – Umbau/Sanierung (GF/OG)
LV 01 – Erd- und Rohbauarbeiten
LV 05 – Gerüstarbeiten
LV 02 – Tragwerk (Holzbauweise)
LV 04 – Dacharbeiten
LV 03 – Fenster, Glasfassade, Außentür…
LV 10 – Metallbauarbeiten
LV 08 – Aufzüge
LV 14 – Trockenbauarbeiten
LV 06 – Estricharbeiten
LV 07 – Fliesen- und Plattenarbeiten
LV 13 – Bodenbelagarbeiten
LV 09 – Tischlerarbeiten
LV 16 – Möblierung
Übergabe an Schule (2 Wo. vor Ferie…
TGA – Technische Gebäudeausrüstung
LV 50 – Heizungsarbeiten
LV 51 – Lüftungsarbeiten
LV 55 – Elektroarbeiten
LV 52 – Brandmeldeanlage (BMA)
LV 54 – PV-Anlage (22,95 kWp)
Anbau – Ergänzende Gewerke
LV 06 – Innenputzarbeiten
LV 12 – Malerarbeiten
LV 60 – Außenanlagen
Meilenstein: Rohbau Hebergalette fer…
Meilenstein: Gebäude rind- und was…
Meilenstein: Estrich trocken / Freiga…
Meilenstein: BMA-Abnahme (Pflicht…
Meilenstein: Aufzug-Abnahme TÜV (…
Meilenstein: Mangelbeseitigung / Ab…
